

दिनांक 06.01.2023 को जिलाधिकारी महाराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 06.01.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल महाराजगंज, जिला विकास अधिकारी, जिला जनसूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता(वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.पी.) महाराजगंज, क्वालिटी इंजीनियर मेसर्स रिथविक कोया (जे.पी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA), DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर, आदि उपस्थित रहे।
बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

(1) खण्ड कार्यालय, जल निगम से सम्बन्धित कार्य:-

A.रेट्रोफिटिंग

Sr No.	Date Meeting	Of District	Phase	Schemes		FHTC		Remark
				Target	Achieved	Target	Achieved	
1	26.12.2022	महाराजगंज	रेट्रोफिटिंग	31	31	23315	23315	-
2	06.01.2023	महाराजगंज	रेट्रोफिटिंग	31	31	23376	23376	-

B.जल जीवन मिशन, निर्माणाधीन परियोजना :-

B.जल जीवन मिशन, निमाणधोन परियोजना :-																
क्र.सं०	बैठक का दिनांक	01.04.2022 को अधूरी परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2022-23 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल योग (3+4)	योजना में सम्मिलित बस्तियों की संख्या	वर्ष में पूर्ण की जाने वाली योजनाओं की संख्या	कुल योजनाओं में से अनुप्राप्ति/जमावर्तित संख्या	भौतिक प्रगति						वर्ष 2022-23 में से अनुप्राप्ति/जमावर्तित संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्रतिशत में (13/7)	
								अनारम्भ	50% तक	51-74% तक	75-99% तक	पूर्ण	विद्युत कनेक्शन सहित पूर्ण			संचालन प्रारम्भ
1	26.12.2022	34	0	34	179	25	0	0	1	6	5	22	14	14	0	88%
2	06.01.2023	34	0	34	179	25	0	0	1	4	5	24	19	19	0	96%


अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01.04.2022 को कुल 34 परियोजनाओं में 25 परियोजनाओं को वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। लक्ष्य के सापेक्ष 24 परियोजना पूर्ण कर ली गयी है जिसमें 19 योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन करते हुए 10 परियोजनाओं पर संचालन प्रारम्भ व 9 परियोजनाओं पर टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। शेष 01 नग लक्ष्मीपुर पेयजल योजना पर नलकूप से स्वतः जल श्राव होने के कारण कार्य प्रभावित है जिसे जल श्राव कम होने के उपरान्त पूर्ण कराया जाना सम्भव हो पायेगा। इसके अतिरिक्त 09 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 5 पेयजल योजनाओं को माह-जनवरी के अंत तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये साथ ही उक्त समस्त योजनाओं पर विद्युत संयोजन के कार्यों को सिविल कार्यों के साथ कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 25 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 19 योजनाओं पर वि०/याँ० कार्य कराये गये हैं। शेष 6 परियोजनाओं पर विद्युत सम्बन्धित समस्त कार्यों को विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये अग्रिम बैठक से पूर्व पूर्ण कराये जाने के निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये। साथ ही शेष योजनाओं के सिविल कार्यों में विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं समस्त कार्यों को निर्धारित की गयी समय सीमा में पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिशारी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में संचालित 31 नग रेट्रोफिटिंग योजनाओं के ग्रामों को संतृप्त करने हेतु 3000 नग FHTC का कार्य शेष है जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त समस्त ग्रामों को शुद्ध पेयजल से संतृप्त करने हेतु शेष FHTC को अग्रिम बैठक से पूर्व पूर्ण कराये जाने व निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के 4000 नग FHTC को माह के अन्त तक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

जिला विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26.12.2022 की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से रेट्रोफिटिंग योजनाओं का स्थलीय सत्यापन कराया गया जिसमें योजनाओं के संचालन में कमियाँ पायी गयी हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सत्यापन में पायी गयी समस्त कमियों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही संचालित योजनाओं का सत्यापन सहायक विकास अधिकारी/सचिव के माध्यम से फीड बैक लेना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-अधिशारी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण)

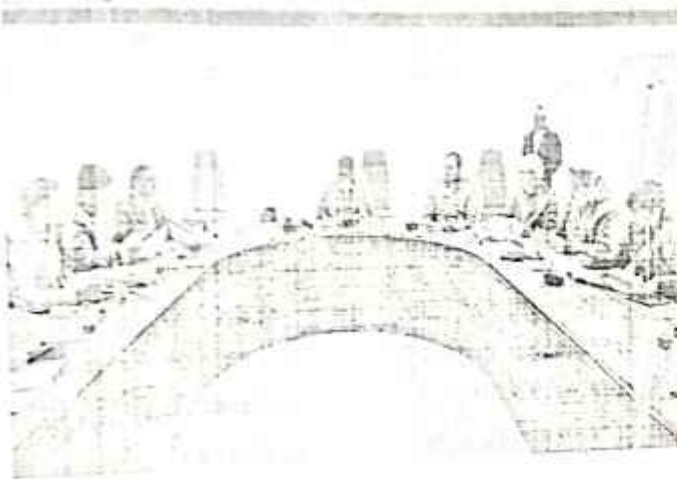

(2) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

S. N.	Date of Meeting	Phase	Agency	Land		DPR Status Villages (No. Of Scheme)				Tri Party Agreement (No. Of Scheme)	Cover Agreement (No. Of Scheme)	Work Started	FHTC		
				Target	Achieved	Target	Submitted	DWSM	SLSSC				Target	Achieved	%
1	26-12-2022	Phase -2	JMC Projects	446	446	446 (341)	445 (340)	437 (334)	366 (285)	366 (285)	249	182	123006	33924	27.58%
2	06-01-2022	Phase -2	JMC Projects	446	446	446 (341)	445 (340)	437 (334)	366 (285)	366 (285)	249	182	123006	38659	31.42%

अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 341 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 बनाये जाने का कार्य लक्षित था, जिसके सापेक्ष 446 राजस्व ग्राम की 341 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जा चुके हैं। वर्तमान तक DWSM के द्वारा 437 राजस्व ग्रामों की 334 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 तकनीकी स्वीकृति उपरान्त शासन को प्रेषित किये गये हैं। शेष 9 राजस्व ग्रामों के 7 नग डी0पी0आर0 DWSM से स्वीकृति हेतु इस बैठक में प्रस्तुत किये गये। अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 2 नग डी0पी0आर0 जिनकी प्रति व्ययित लागत ₹0 6400.00 से कम है की स्वीकृति प्रदान की गयी व शेष 5 नग डी0पी0आर0 जिनकी प्रति व्ययित लागत ₹0 6400.00 से अधिक है, का अवयववार स्पष्टीकरण के साथ जिला विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अधिशारी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिये गये कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये शेष योजनाओं की SLSSC से स्वीकृति प्राप्त करते हुये कवर एग्रीमेन्ट का कार्य सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

कवर एग्रीमेन्ट के सापेक्ष लक्ष्य/उपलब्धि(249पे0यो0)

Sl. No.	Description	Unit	CA-1				CA-2				CA-3			
			DOS: 10.12.21,				DOS: 09.02.22,				DOS: 05.09.22,			
			DOC: 09.12.22				DOC: 08.02.23				DOC: 04.09.23			
			Total Scope	Completed	Progress	Not Started	Total Scope	Completed	Progress	Not Started	Total Scope	Completed	Progress	Not Started
			(Target)				(Target)				(Target)			
1.	Tube well Works	Nos.	74	63	3	8	81	49	7	25	94	4		90
2.	Boundary wall	Nos.	74	11	8	55	81	8	3	70	94	1		93
3.	Pump House	Nos.	74	4	6	64	81	2	12	67	94	0	1	93
4.	Solar	Nos.	74	2	4	68	81	-	-	81	94	-		94
5.	Distribution Network	KM	561	328	-	233	686	396	-	290	973	102		871
6.	FHTC Connection	Nos.	40163	17787	-	22376	41064	18295	-	22769	54814	3073		51741
7.	OHT	Nos.	74	0	12	62	81	0	13	68	94	0	1	93

जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत चयनित फर्म मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट द्वारा कवर एग्रीमेन्ट प्रथम जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.12.2021 एवं कार्य समापन की तिथि 09.12.2022 है जिसके अन्तर्गत 74 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। वर्तमान तक 74 नग योजनाओं के सापेक्ष नलकूप निर्माण 63 नग, बाउन्ड्रीवाल निर्माण 74 नग, पम्प हाउस निर्माण 4 नग, शिरोपरि जलाशय निर्माण-शून्य, 561 किमी० के सापेक्ष 328 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है, इसी प्रकार द्वितीय कवर एग्रीमेन्ट जिसकी कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.02.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 08.02.2023 है जिसके अन्तर्गत 81 नग योजनाओं पर कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। वर्तमान तक 81 नग योजनाओं के सापेक्ष नलकूप निर्माण 49 नग, बाउन्ड्रीवाल निर्माण 8 नग, पम्प हाउस निर्माण 2 नग, शिरोपरि जलाशय निर्माण-शून्य, 686 किमी० के सापेक्ष 396 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य कराया गया है, कार्य की प्रगति अत्यन्त कम होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि भविष्य में होने वाले भुगतानों में नियमानुसार कटौती करते हुये ही बीजकों के भुगतान किये जाये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दिवस 500 नग FHTC प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा प्रथम व द्वितीय कवर एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत चयनित समस्त योजनाओं को माह-फरवरी 2023 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा फर्म के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर दी जायेगी।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे०एम०सी० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एस०(जे०वी०)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) (JJM फेज-3):-

Sr No.	Date of Meeting	Phase	Agency	Land		DPR Status Villages (No. Of Scheme)				Tri Party Agreement (No. Of Scheme)	Cover Agreement (No. Of Scheme)	Work Started
				Target	Achieved	Target	Submitted	DWSM	SLSSC			
1	26.12.2022	Phase-3	Ritvik_Ko ya (JV)	651	645	651 R.V	564 (332)	498 (299)	304 (174)	262 (154)	74	13
2	06.01.2023	Phase-3	Ritvik_Ko ya (JV)	651	651	651 R.V	547 (326)	510 (302)	304 (174)	304 (174)	74	13

अवगत कराया गया कि 651 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 448 परियोजनाओं के डीपीआर बनाये जाने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 547 राजस्व ग्राम की 326 परियोजनाओं के डीपीआर फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। वर्तमान तक DWSM के द्वारा 510 राजस्व ग्रामों की 302 परियोजनाओं के डीपीआर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त शासन को प्रेषित किये गये हैं। शेष 37 राजस्व ग्रामों के 24 नग डीपीआर DWSM से स्वीकृति हेतु इस बैठक में प्रस्तुत किये गये। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत रु० 6400.00 से कम है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा समस्त डीपीआर के परीक्षण उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये कि समस्त योजनाओं के डीपीआर को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में SLSSC हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही फर्म को निर्देश दिये गये कि शेष राजस्व ग्रामों की समस्त डीपीआर अग्रिम प्रस्तावित बैठक से पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।

फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक स्वीकृत 104 नग योजनाओं के सापेक्ष 13 नग योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है जिसमें जिसमें 5 नग नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया है व 38 किमी० वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य पूर्ण कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अग्रिम प्रस्तावित बैठक में कवर एग्रीमेन्टवार योजनाओं से सम्बन्धित विवरण पर्ट चार्ट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही प्रत्येक दिवस न्यूनतम 100 नग FHTC उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:- मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

(4) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० TPJA:- परियोजना के टीम लीडर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में 3942 विन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 2350 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPJA द्वारा किया जा रहा है एवं 1592 विन्दुओं की निस्तारण आख्या प्राप्त होना अवशेष है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यों में पायी गयी कमियों को तत्काल निस्तारित कराया जाये एवं बैठक में फोटोग्राफ सहित विवरण प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे०एम०सी० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एस०(जे०वी०)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/जिला विकास अधिकारी)

(5) इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA):- अवगत कराया गया कि समस्त ISA को रेट्रोफिटिंग/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं FHTC हेतु आधार कार्ड एकत्र करने हेतु दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष कार्य प्रगति पर है। निर्देशित किया गया कि फेज-2 एवं फेज-3 की प्रत्येक योजना हेतु ISA को रोस्टर जारी करते हुये आधार कार्ड कलेक्शन कार्य किया जाये एवं अगली बैठक से पूर्व रेट्रोफिटिंग व निर्माणाधीन योजनाओं के शतप्रतिशत आधार कार्ड प्राप्त कर लिये जाये जिससे FHTC की वांछित प्रगति प्राप्त की जा सके।

(कार्यवाही:- इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी /अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ DPMU)

(e) जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU) :- अवगत कराया गया कि DPMU द्वारा समस्त घटकों द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों का नियमित अनुश्रवण एवं सहयोग किया जा रहा है। DPMU के ISA क्वार्टिनेटर गति प्रदान करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये व आवंटित ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक ISA के द्वारा एकत्र कराते हुये आधार कार्ड की पोर्टल पर इन्ट्री की जाये।
(कार्यवाही:- जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU)/अधिसासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/(ISA)

(सत्येन्द्र कुमार)
आई०ए०ए०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: ३४ / कर्त्त - 114 / ०६ दिनांक: 13.01.2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), महाराजगंज।
3. जिला विकास अधिकारी, महाराजगंज।
4. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, महाराजगंज।
5. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थविक कोया (जे.वी.), महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेवनो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।


12/1/23
जिलाधिकारी
महाराजगंज।
