

**जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झौंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु  
जिलाधिकारी महोदय, झौंसी की अध्यक्षता में दिनांक 05.12.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्।**

दिनांक 05.12.2024 को जिलाधिकारी महोदय, झौंसी की अध्यक्षता में जनपद झौंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार रादस्य/अधिकारी उपस्थित रहे :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री योगेन्द्र कुमार	अपर जिलाधिकारी (न.ग.), झौंसी।
2	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी, झौंसी।
3	श्री रणविजय सिंह	अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्या, उ.प्र. जल निगम, झौंसी।
4	श्री मुकेश पाल सिंह	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झौंसी।
5	श्री रजनीश गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., झौंसी।
6	श्री संदीप शर्मा	सहा.अभि. प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., झौंसी।
7	श्री अर्जुन ठाकुर	टीम लीडर, पी.एम.सी., झौंसी।
8	श्री राजेश गुप्ता	टीम लीडर, टी.पी.आई., झौंसी।
9	श्री फैजल सलामत	डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई., झौंसी।
10	श्री आर.एल. रमेश	डी.जी.एम., मेसर्स एन.सी.सी., झौंसी।
11	श्री लक्ष्मीनारायण	डी.जी.सी.सी., झौंसी।
12	श्री वाई.एन. तिवारी	यूनिप्रो टेक्नो इन्फा, झौंसी।
13	श्री अक्षय जाट	डी.पी.एम., डारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा
14	श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति	ए.जी.एम., मेसर्स आई.एच.पी., झौंसी।
15	श्री बलवीर सिंह	प्रतिनिधि, मेसर्स एच.एम.एस. इन्फ्राटेक, आगरा।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

- **जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झौंसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।**

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झौंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झौंसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

**गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना** :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 42 ग्रामों में से 42 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सड़क पुर्नस्थापना के कार्य की समीक्षा करने पर अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम., श्री आर.एल. रमेश द्वारा अवगत कराया गया कि सत्यापन में अवशेष पायी गयी सड़कों को माह के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा रोष व्यक्त करते हुये सड़क पुर्नस्थापना के अवशेष कार्यों को 05 दिवस में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को आदेशित किया गया कि यदि अनुबन्धित फर्म द्वारा उक्त तिथि तक सड़क पुर्नस्थापना कार्य तक पूर्ण नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये प्रार्थमिकी दर्ज करायी जायें तथा योजना का पुनः Functionality Test दिनांक 15 दिसम्बर, 2024 से कराया जायें।

**बचावली ग्राम समूह पेयजल योजना** :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में से 25 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना के

कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अवशेष ग्रामों का "हर घर जल" सत्यापित एवं अवशेष सङ्क पुर्नस्थापना का कार्य आगामी 01 सप्ताह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

तिलैथा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 25 ग्रामों से 24 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी एक सप्ताह के अन्दर शेष ग्राम का भी "हर घर जल" प्रमाणीकरण करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त योजना का पुनः Functionality Test 15 दिसम्बर, 2024 से कराया जायें।

योजनाओं के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा आश्वस्त किया गया कि कि योजनान्तर्गत सम्मिलित समस्त ग्रामों में अवशेष सङ्क पुर्नस्थापना एवं ग्रामों शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करने का कार्य आगामी 10 दिनों में पूर्ण करा दिया जायेगा।



बुढपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों में से 35 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य किया जा चुका है। योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री आर.एल. रमेश द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है मात्र 20-25 ग्रामों में 80 प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, जिसे शत-प्रतिशत किये जाने हेतु ग्रामों के ऊचाई वाले भाग में बाल्व एवं बुस्टर पम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी 01 सप्ताह में पूर्ण कराते हुये योजना के शत-प्रतिशत ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना का पुनः Functionality Test कराने हेतु निर्देशित किया गया।

झमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त सिविल कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। 7600 नग गृह संयोजनों के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 87 ग्रामों में से 35 ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ की जा रही है। 24659 नग एथ.एस.सी. का कार्य पूर्ण किया जुका है तथा 05 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित ग्रामों में धीमी गति से कराये जा रहे सङ्क पुर्नस्थापना कार्य पर जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा रोष व्यक्त किया गया। योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के जी.एम. श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अवगत कराया गया कि माह के अन्त तक योजना में सम्मिलित समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

एवं सङ्कर पुनर्स्थापना का कार्य 15 जनवरी-2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा 20, दिसम्बर-2024 से योजना के प्रथम चरण (योजना के समस्त घटकों का पूर्ण क्षमता पर संचालन) का परीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

**टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना** :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टेक, 20 नग सी.डब्ल्यूआर., 5.12 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-95%, 27 नग ओवर हैड टेक-95%, 20 नग सी.डब्ल्यूआर.-95%, 5.57 किमी. रॉ-वाटर राईजिंग मेन, 271.37 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1381.50 किमी. वितरण प्रणाली, 48180 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 6300 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 19 नग एवं बरथरी ग्रा.स.पे.यो. में 4200 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 14 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। अनुबन्धित फर्म के पी.एम. श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अवगत कराया गया है कि टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना के समस्त कार्यों को फरवरी-2025 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के प्रथम चरण (योजना के समस्त घटकों का पूर्ण क्षमता पर संचालन) का परीक्षण 30 दिसम्बर-2024 से कराने हेतु निर्देशित किया गया।

**कुरैचा ग्राम समूह पेयजल योजना** :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 74 ग्रामों से 64 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत शेष 275 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करते हुये योजना के समस्त ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अनुबन्धित फर्म के ए.जी.एम. श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति को निर्देशित किया गया, जिस पर उनके द्वारा आस्वश्त किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार अवशेष सङ्कर पुनर्स्थापन के अवशेष कार्यों को आगामी 10 दिनों में पूर्ण करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय, झाँसी द्वारा अवशेष सङ्कर पुनर्स्थापना को शीघ्र पूर्ण कराते हुये 15, दिसम्बर-2024 से योजनान्तर्गत की जा रही जलापूर्ति का पुनः सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया गया।

**पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना** :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। मात्र 15 नग एच.एस.सी. संयोजनों को एफ.एच.टी.सी. में परिवर्तित करने का कार्य शेष है। वर्तमान में योजना में समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों में से 32 ग्रामों का 'हर घर जल' प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि श्री अक्षय जाट द्वारा अवगत कराया गया खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार अवशेष सङ्कर पुनर्स्थापन के कार्य को 15 दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण कराते हुये योजना के समस्त ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा Final Functionality Test दिनांक 15 दिसम्बर, 2024 से कराने हेतु निर्देशित किया गया।




**राष्ट्रीय ग्राम समूह पेयजल योजना** :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में समिलित 58 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति पाइप लाइन तोड़ दिये जाने के कारण वर्तमान में 03 ग्रामों की जलापूर्ति बन्द है, जिस पर अधिकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। शेष 03 ग्रामों के "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य कार्य आगामी 03 दिनों में उक्त क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का पूर्ण कराते हुये खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार अवशेष सढ़क पुनर्स्थापन के कार्य जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा अवशेष सढ़क पुनर्स्थापना को शीघ्र पूर्ण कराते हुये 15. दिसम्बर-2024 से योजनान्तर्गत की जा रही जलापूर्ति का पुनः सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया।

पैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजनाओं के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्मों के प्रतिनिधियों का निर्देशित किया गया कि योजनाओं में समिलित समस्त ग्रामों में अवगत करायी गयी तिथियों तक अनिवार्य रूप से जलापूर्ति एवं सड़क पुनर्स्थापना के अवशेष कार्यों पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा अधिकारी अभियन्ता, जल निगम (प्रान्तीय) को आदेशित किया गया कि योजनान्तर्गत शाइप लाइन विछाने हेतु खोदी/काटी गयी सड़कों के सापेक्ष पुनर्स्थापित किये गये मार्गों का विभागवार/योजनावार विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रिट्रोफ़ाइटिंग/पुनर्गठन/नई योजनाये) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिकारी अभियन्ता जल निगम (प्रान्तीय) द्वारा अवगत कराया गया, कि—

**पैकेज संख्या-01** में समिलित पेयजल योजनान्तर्गत प्रस्तावित 85.98 किमी, पाइप लाइन के सापेक्ष 59.58 किमी, पाइप लाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 55.197 किमी, पाइप लाइन विछाने तथा 6404 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 5422 नग गृह तंयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में समिलित ग्रामों की आंशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। पैकेज के अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर-2024 तक पूर्ण करा दिया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा निर्देशित किया गया योजना के कार्यों वजे उक्त तिथि तक पूर्ण कराते हुये पैकेज में समिलित योजनाओं के प्रथम चरण (योजना के समस्त घटकों का पूर्ण क्षमता पर संचालन) का परीक्षण जनवरी-25 में करा लिया जायें।

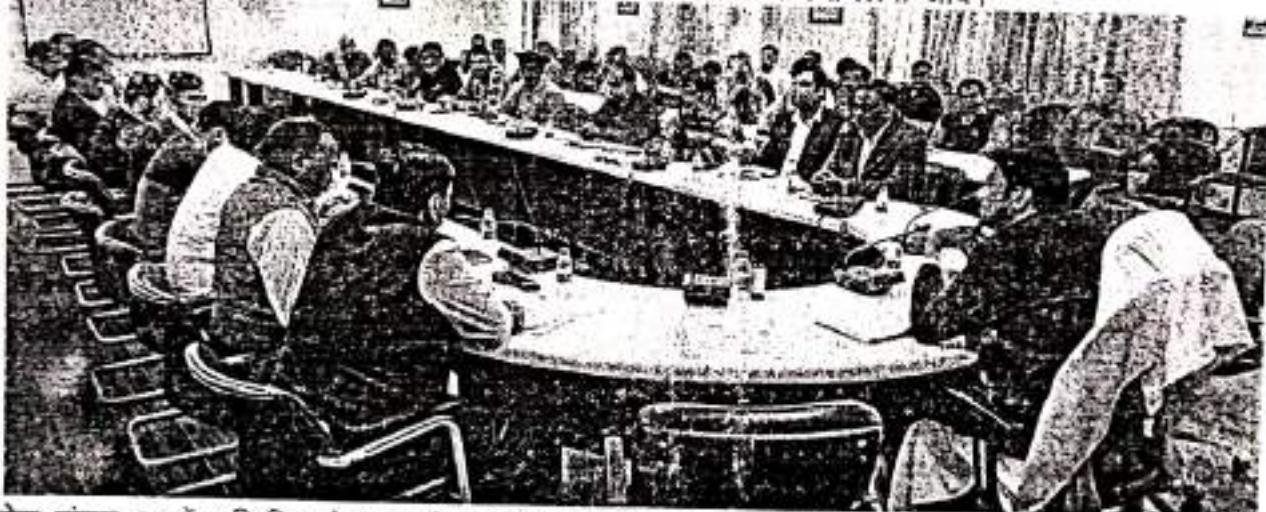

**पैकेज संख्या-02** में समिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 58.832 किमी, वितरण प्रणाली के सापेक्ष 48.195 किमी, पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 48.15 किमी, पाइप लाइन विछाने तथा 6724 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 4713 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में समिलित ग्रामों की आंशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। पैकेज के अवशेष कार्यों को माह दिसम्बर-2024 तक पूर्ण करा दिया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा निर्देशित किया गया योजना के कार्यों को उक्त तिथि तक पूर्ण कराते हुये पैकेज में समिलित योजनाओं के प्रथम चरण (योजना के समस्त घटकों का पूर्ण क्षमता पर संचालन) का परीक्षण 15. जनवरी-25 में करा लिया जायें।

**पैकेज संख्या-03** में समिलित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित 104.95 किमी, वितरण प्रणाली के सापेक्ष 91.246 किमी, पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 84.826 किमी, पाइप लाइन विछाने तथा 3515 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 2901 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण कराते हुये पैकेज में समिलित ग्रामों की आंशित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। पैकेज में

समिलित पेयजल योजनाओं बरीर ग्राम समूह पेयजल योजना में प्रस्तावित 300 किली. क्षमता के अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कार्यों को माह जनवरी-2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा निर्वैशित किया गया योजना के कार्यों को उक्त तिथि तक पूर्ण कराते हुये पैकेज में समिलित योजनाओं के प्रथम चरण (योजना के समस्त घटकों का पूर्ण क्षमता पर संचालन) का परीक्षण फरवरी-2025 के प्रथम सप्ताह में करा लिया जायें।

**पैकेज संख्या-04** में समिलित 02 नग योजनाओं में प्रस्तावित 02 नग ओवर हैड टैक के कार्य क्रमशः 90 एवं 95 प्रतिशत एवं 02 नग सी.डब्ल्यू.आर. के कार्य क्रमशः 95-95 प्रतिशत पूर्ण किये जा चुके हैं। पैकेज में प्रस्तावित वितरण प्रणाली विभाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैकेज के अवशेष कार्यों को दिसम्बर-2024 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद झौंसी में निर्माणाधीन जनरल विधिन रावत डिफेन्स कॉर्पोरेशन नोड की जलापूर्ति हेतु कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल के कार्य 90 प्रतिशत, 350 मिनी. व्यास की रों-वाटर राईजिंग में विभाने का कार्य 80 प्रतिशत, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य 65 प्रतिशत, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का कार्य 70 प्रतिशत तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की वाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक योजना के 78 प्रतिशत एवं द्वितीय चरण के 25 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। प्रथम चरण के कार्यों को दिसम्बर-2024 के अन्त तक पूर्ण कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद झौंसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झौंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि झौंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (प्रथम चरण) के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा झौंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना (द्वितीय चरण) के कार्यों के अन्तर्गत इन्टेक वेल पर एप्रोच व्रिज पम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित 21144 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 11490 नग गृह संयोजनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दिसम्बर-2024 तक योजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झौंसी द्वारा रोष व्यक्त करते हुये अगवत कराया गया है योजना के अवशेष कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराते हुये योजना के माध्यम से शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि गुरसराय-गरीठा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना के कार्यों को जनवरी-2025 तक पूर्ण कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), झौंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झौंसी के अन्य नगर जैसे- बरुआसागर, गुरसराय, मॉठ एवं समथर में पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी निर्माण कार्यों को कराया जा रहा है, जिन्हें निर्धारित समयावधि जुलाई-2025 तक पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अन्य नगरों में पेयजल योजनाओं के कार्यों की निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

5/11/2024  
(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0 जल निगम, झौंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अनुमोदित

जिलाधिकारी/

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
झौंसी।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झौंसी।**

पत्रांक-1502/एस0टी0/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2024 / 182 दिनांक: 10 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि— निर्माणकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1— मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शासन, लखनऊ।

2— अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

3— जिलाधिकारी महोदय, झौंसी।

5— समस्त सम्बंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5/11/2024  
(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0 जल निगम, झौंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
