


दिनांक 13.01.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति हमीरपुर की जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पत्थौरा डांडा एवं हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण कार्य एवं पुर्नगठन के 24 ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डीपीआर के सम्बन्ध बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 13.01.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में अपरान्ह 05:00 बजे जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति हमीरपुर की जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पत्थौरा डांडा एवं हरीलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा 24 ग्रामों की डीपीआर पर चर्चा एवं जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय, लखनऊ भेजने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुयी जिसमे जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 17.01.2023 को अनुमोदन किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-

1. डा० राम औतार, मुख्य चिकित्साधिकारी, हमीरपुर।
2. श्री राजेश कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (गामांगि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) हमीरपुर।
3. श्री विकास, जिला विकास अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्रीमती कल्पना जायसवाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर।
5. ई० संदेश सिंह तोमर, अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) महोदा।
6. ई० सुमित कुमार, अधिशारी अभियन्ता (वि०/या०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
7. श्री राम बरन सिंह, ए०डी०ओ० (पंचायती राज), हमीरपुर।
8. श्री रवि पाल, एडिशनल डी०ए०ओ०, हमीरपुर।
9. श्री अमित कुमार, फॉरेस्टर, वन विभाग, हमीरपुर।
10. ई० श्री रामफल, सहायक अभियन्ता, मोदवा बांध निर्माण खण्ड, हमीरपुर।
11. श्री कुलदीप कुमार, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, हमीरपुर।
12. श्री आशीष काजपाई, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, हमीरपुर।
13. श्री पवन कुमार प्रजापति, डी०टी०एल० (टी०पी०आई०) हमीरपुर।
14. श्री रामा कृष्ण शुक्ल, सुपरविजन इंजीनियर, (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
15. श्री मृत्युन्जय सिंह, क्यू०ए०/क्यू०सी० इंजीनियर (पी०एम०सी०), हमीरपुर।
16. श्री अभिषेक कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर (पी०एम०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०), हमीरपुर।
17. श्री सुनील कुमार भारद्वाज, जनरल मैनेजर (जे०डब्ल्यू०आई०एल०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०), हमीरपुर।

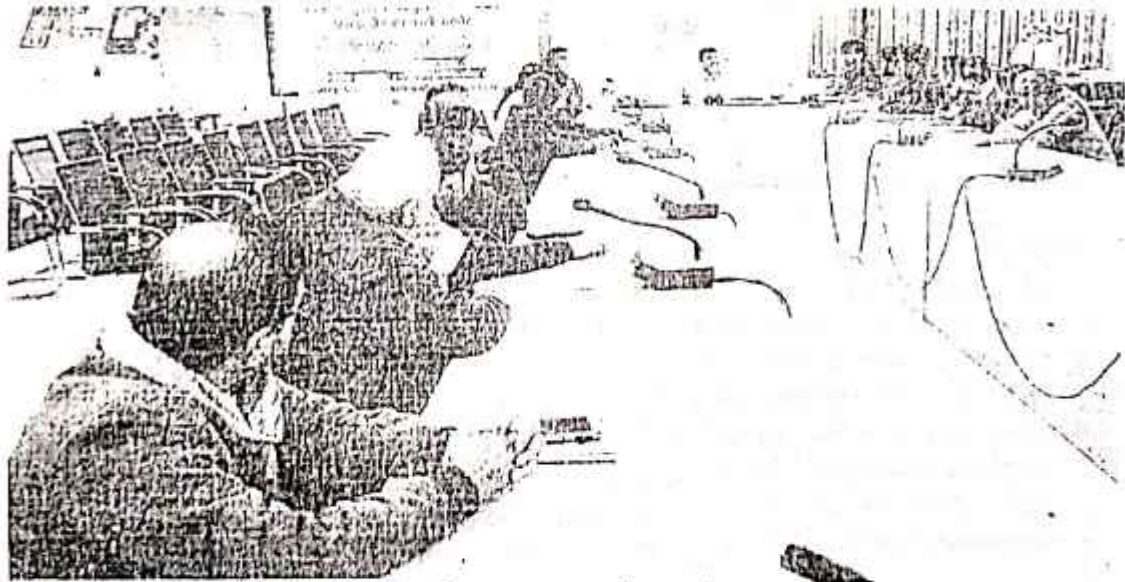

पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत आच्छादित 148 ग्रामों में से 3 ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं अन्य ग्रामों में भी कार्य प्रगति पर है।

Seen

ADMLM

20/01/2022

4

Page 1 of 6

Scanned by CamScanner

इन्टेकवेल:- इस योजना के अन्तर्गत यमुना नदी पर 45 एमएलडी इन्टेकवेल का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी भौतिक प्रगति 30 प्रतिशत है, एवं वॉल के रि-इन्फोर्समेंट का कार्य प्रगति पर है जिसमें 38 मी० ऊँचाई के सापेक्ष 18.06 मीटर ऊँचाई पूर्ण किया जा चुका है।

डब्लू०टी०पी०:- (45 एम.एल.डी.)

1. फिल्टर हाउस के अन्तर्गत सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इलेक्ट्रो-मेकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
2. केमिकल हाउस के अन्तर्गत सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इलेक्ट्रो-मेकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
3. पम्प हाउस के अन्तर्गत सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इलेक्ट्रो-मेकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
4. मेकेनिकल वर्क -80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
5. इलेक्ट्रो मेकेनिकल वर्क- 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

सी०डब्लू०आर०:-10 सी०डब्लू०आर० के सापेक्ष 5 नग सी०डब्लू०आर० पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 5 नग सी०डब्लू०आर० पर कार्य प्रगति पर है। 80 प्रतिशत निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है।

ओवर हैड टैंक:-46 ओ०एच०टी० में से 9 पर कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 22 पर कार्य प्रगति पर है, शेष पर पर्याप्त गैन पावर न होने के कारण कार्य रूका हुआ है। 72 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

रॉ-वाटर राईजिंगमेन:-रॉ-वाटर राईजिंगमेन के अन्तर्गत कुल 0.27 कि०मी० पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से 0.27 कि०मी० की पाइप की सप्लाय प्राप्त की जा चुकी है एवं रॉ-वाटर राईजिंगमेन बिछाये जाने का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

विलयर वाटर राईजिंगमेन:-विलयर वाटर राईजिंगमेन के अन्तर्गत कुल 306.36 कि०मी० पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 306.36 कि०मी० की पाइप की सप्लाय प्राप्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 260 कि०मी० पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है। वितरण प्रणाली:-वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल 908.886 कि०मी० पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 908.886 कि०मी० की पाइप की सप्लाय प्राप्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 741.30 कि०मी० पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है। कार्य की गति धीमी है।

नल संयोजन:-47940 नल संयोजन में से 28657 नल संयोजन किये गये हैं, कार्य की गति धीमी है 03 नग गाँव में कमिशनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा दिए गए नल संयोजन का साप्ताहिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जो कि निराशाजनक है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी फर्म के जनरल मैनेजर श्री सुनील भारद्वाज को निर्दिष्ट किया गया कि कार्यस्थलों पर पर्याप्त मानवश्रम उपलब्ध न होने के कारण योजना के सभी घटकों पर कार्य की प्रगति धीमी है तथा कार्यदायी एजेंसी निर्धारित दैनिक लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पा रही है, कार्यस्थलों पर पर्याप्त मानवश्रम व मशीनरी लगाते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व मानकों के अनुसार योजना के सभी घटकों पर समान्तर रूप से कार्य कराये तथा निर्धारित दैनिक लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करें, जिससे योजना को समयान्तर्गत पूर्ण किया जा सके।

हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पाइप पेयजल योजना

उपरोक्त योजना की घटकवार प्रगति अधोहरताक्षरी द्वारा निम्नानुसार अवगत करायी गयी :-

इन्टेकवेल:- इस योजना के अन्तर्गत यमुना नदी पर 9 एमएलडी इन्टेकवेल का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत है, एवं पम्प हाउस के अन्तर्गत राइट एवं प्लारटर का कार्य पूर्ण एवं पेन्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

डब्लू०टी०पी०:- (8 एम.एल.डी.)

1. प्लेट एरीएटर का सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं इलेक्ट्रो-मेकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
2. पलेश मिक्चर के अन्तर्गत सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
3. सी.एल.एफ. के अन्तर्गत सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
4. फिल्टर हाउस के अन्तर्गत सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं इलेक्ट्रो-मेकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
5. केमिकल हाउस के अन्तर्गत सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं इलेक्ट्रो-मेकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
6. मेकेनिकल वर्क -80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
7. इलेक्ट्रो मेकेनिकल वर्क- 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

सी०डब्लू०आर०:-5 सी०डब्लू०आर० में से 5 सी०डब्लू०आर० में सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है। 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

ओवर हैड टैंक:-12 ओ०एच०टी० में से 11 ओ०एच०टी० का सिविल कार्य पूर्ण है एवं 1 नग ओ०एच०टी० पर कार्य प्रगति पर है। रॉ-वाटर राईजिंगमेन:-रॉ-वाटर राईजिंगमेन के अन्तर्गत कुल 0.91 कि०मी० पाइप बिछाई जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 0.91 कि०मी० की पाइप की सप्लाय प्राप्त की जा चुकी है एवं 0.91 कि०मी० पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है।

13

विलयर वाटर राईजिंगमेन:—विलयर वाटर राईजिंगमेन के अन्तर्गत कुल 83.037 कि०मी० पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 80.842 कि०मी० की पाइप की सप्लाय प्राप्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 76.88 कि०मी० पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है। कार्य की प्रगति धीमी है।

वितरण प्रणाली:—वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल 184.372 कि०मी० पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 184.372 कि०मी० की पाइप की सप्लाय प्राप्त की जा चुकी है एवं 179.36 कि०मी० पाइप बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य की प्रगति धीमी है।

नल संयोजन:—9636 नल संयोजन में से 6335 नल संयोजन किये गये हैं।

हरीलीपुर ग्राम समूह भूजल पाइप पेयजल योजना

उपरोक्त परियोजना की घटकवार प्रगति अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नानुसार अवगत करायी गयी

सी०डब्ल्यू०आर०:—1 सी०डब्ल्यू०आर० लक्ष्य के सापेक्ष सी०डब्ल्यू०आर० पर पर्याप्त मैन पावर न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

ओवर हैड टैंक:—कुल 118 ओ०एच०टी० में से 42 पर टॉप डोम का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 38 ओ०एच०टी० पर कार्य धीमी गति से चल रहा है एवं शेष पर पर्याप्त मैन-पावर न होने के कारण कार्य रुका हुआ है। कुल 62 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है।

रॉ-वाटर राईजिंगमेन:—रॉ-वाटर राईजिंगमेन के अन्तर्गत कुल 7.302 कि०मी० पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 7.302 कि०मी० पाइप की सप्लाय प्राप्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 0.00 कि०मी० पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है।

वितरण प्रणाली:—विलयर वाटर राईजिंगमेन के अन्तर्गत कुल 975.28 कि०मी० पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 975.28 कि०मी० पाइप की सप्लाय प्राप्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 918.31 कि०मी० पाइप बिछायी जा चुकी है।

नल संयोजन:—53504 नल संयोजन में से 49341 नल संयोजन किये गये हैं, 52 नग गाँव में कमिशनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

उपरोक्त 02 नग ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त यह निर्देश दिये गये:—

- 1- उपरोक्त 02 नग परियोजनाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निर्देशित किया गया कि अनुबंध अन्तर्गत योजना के कार्यों को किस तरह एवं कब तक पूर्ण किया जाना है इस सम्बंध में बार-बार तत्काल अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) महोबा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2- उपरोक्त 02 नग परियोजनाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को यह भी निर्देशित किया गया कि ग्रामवार शत प्रतिशत गृह जल संयोजन करते हुये पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने में ग्रामीण क्षेत्र में जो री.सी. रोड, सम्पर्क मार्ग, मुख्य रोड आदि को तोड़ा गया है उनका तत्काल प्रभाव से रेस्टोरेशन का कार्य तीव्र गति से कराना सुनिश्चित करें।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) महोबा को निर्देशित किया गया कि रेट्रोफिटिंग के 24 नग डी.पी.आर. को एस.एल. एस.एस.सी. की बैठक में स्वीकृत हेतु जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय को प्रेषित करायें।
- 4- उपरोक्त 02 नग परियोजनाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को यह भी निर्देशित किया गया कि रोड रेस्टोरेशन का कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करायें एवं जिन ग्रामों में शत प्रतिशत गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा चुका है उन्हें हर घर नल जल घोषित कराना सुनिश्चित करें।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) महोबा एवं डी०टी०एल०, टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का जाँच करते हुए साइटों पर भ्रमण कर कार्य को तेजी से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

आई०एस०ए०:—माह दिसम्बर में आई०एस०ए० संस्थाओं द्वारा विकास खण्ड कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्कुरा, गोहाण्ड, सरीला, राठ में महिला पुरुषों की बैठक, प्रगात फेरी, हैण्डवाश, डोर-टू-डोर जाकर सम्पर्क, रैली आदि जनजागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। एफ०टी०के० फिट के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं से पानी की जाँच कार्यक्रम भी आई०एस०ए० द्वारा कराया गया। आई०एस०ए० चेतना द्वारा 38 ग्राम पंचायतों में 25 महिला बैठक, 15 पुरुष बैठक, 19 हैण्डवाश कार्यक्रम, 19 प्रगात फेरी, 12 बीडब्ल्यूएससी तथा जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। आई०एस०ए० में चित्रकूट सेवा आश्रम 35 ग्राम पंचायतों में 28 महिला बैठक, 16 पुरुष बैठक, 18 हैण्डवाश कार्यक्रम, 18 प्रगात फेरी, 17 बीडब्ल्यूएससी एवं जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। आई०एस०ए० जीवन ज्योति एवं जन कल्याण समिति द्वारा 53 ग्राम पंचायतों में 20 महिला बैठक, 18 पुरुष बैठक, 20 हैण्डवाश कार्यक्रम, 20 प्रगात फेरी, 15 बीडब्ल्यूएससी एवं जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। आई०एस०ए० सोशल एक्शन एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट एवं एडवांसमेन्ट द्वारा 80 ग्राम पंचायतों में 20 महिला बैठक, 18 पुरुष बैठक, 20 हैण्डवाश कार्यक्रम, 20 प्रगात फेरी, 15 बीडब्ल्यूएससी एवं जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि आई०एस०ए० द्वारा जे०जे०एम० पोर्टल पर नियमित रूप से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किये जा रहे जनजागरुकता कार्यक्रमों को अपलोड किया जाय तथा प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज की गतिविधियों शीघ्र पूर्ण करायें।

विद्युत संयोजन:—सहायक अभियन्ता, जल निगम, वि०/या० (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि—

1. पत्थौरा डांडा ग्राम समूह सतही योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 10 नग विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष डब्लू0टी0पी0, नैसमरी, मिहुना, भमनी, कलौलीजार, चोंदीकलां, मकरांव, चन्द्रपुरवा बुजुर्ग पर पोल अधिष्ठापन तथा विद्युत तार लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है।
2. छिरका में 1.20 किमी छोड़कर शेष पोल अधिष्ठापन तथा विद्युत तार लगाने का कार्य हो चुका है।
3. कासिंग छोड़कर शेष पोल अधिष्ठापन तथा विद्युत तार लगाने का कार्य हो चुका है।
4. हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 68 नग विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 48 कार्यस्थलों अमगांव, बरोलीखरका, चिल्ली, विरा, धनौरी, इटायल, कुमरिया, रिहुटा, टिकुर (लिंगा), कुरा, पथखुरी, कुल्हेन्दा, टिकरीया, जमखुरी, जिगनी, रहंक सरसई, चुरहा, बरायल, बरदा एवं दादरी, धमना, इकठौर एवं विलरख, नौहाई, उडेरा, टोलारावत, विलगांव, इस्तामपुर, बरहरा, झिटकरी डांडा, करियारी, कुपारा, गहरौली, कन्धौली, मसगांव, नहदौरा, झिटकरी, न्यूरिया एवं नीम का डेरा, धगवां, इटौरा राठ, कैंथा एवं चन्दौरा में विद्युत संयोजन किया जा चुका है तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है।
5. हरौलीपुर ग्राम समूह सतही योजना के अन्तर्गत 6 नग विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 5 नग हेतु विद्युत पोल अधिष्ठापन तथा विद्युत तार लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। पचखुरा में विद्युत पोल अधिष्ठापित किये जा चुके हैं विद्युत तार लगाने का कार्य प्रगति पर है।
6. पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 10 नग मीटर रूम के सापेक्ष 06 नग मीटर रूम का कार्य पूर्ण तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है।
7. हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजनान्तर्गत 06 नग मीटर रूम के सापेक्ष सभी पर सिविल कार्य पूर्ण।
8. पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 10 नग पंप हाउस के सापेक्ष 04 नग का कार्य पूर्ण तथा 01 पर कार्य प्रगति पर है।
9. हरौलीपुर ग्राम समूह सतही पेयजल योजनान्तर्गत 05 नग पंप हाउस के सापेक्ष 04 नग का सिविल कार्य पूर्ण।
10. हरौलीपुर ग्राम समूह भूजल पेयजल योजनान्तर्गत 118 नग पंप हाउस के सापेक्ष 29 नग का सिविल कार्य पूर्ण तथा 42 कार्यस्थलों पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

अधिसासी अभियन्ता (वि०/या०), जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (सतही एवं नलकूप) के अन्तर्गत 53 विद्युत संयोजन तथा पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 10 विद्युत संयोजनों का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिन्हें विद्युत सुरक्षा निदेशालय की लिखित अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ऊर्जीकृत किया जाना है। जनरल मैनेजर, जे०डब्लू०आई०एल० द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय से सभी 10 नग विद्युत संयोजनों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनरल मैनेजर, जे०डब्लू०आई०एल० तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी० को निर्देशित किया गया कि किये गये सभी विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर अधिसासी अभियन्ता वि०/या०, जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एन०ओ०सी०:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह सतही/भूजल योजना वन विभाग-प्रपोजल फाइल नोडल लखनऊ स्तर से अप्रूवल हो गया है तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक धनराशि एडॉक कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करने के लिए कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया जा चुका है। पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु हमीरपुर के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र हेतु 10111242/- कार्यदायी फर्म के द्वारा एडॉक कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में 09.01.2023 को जमा किया जा चुका है, महोवा क्षेत्र के अन्तर्गत 2428180/- रु० एडॉक कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे-कार्यदायी संस्था को यूपीडा लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लाइसेन्स फीस 291083 रु० एवं परफार्मेन्स रिक्वायरीटी 1981122 रु० जमा किया जा चुका है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे-फाइल सी०ई०ओ० यूपीडा लखनऊ के स्तर पर लाइसेन्स फीस एवं परफार्मेन्स रिक्वायरीटी मूल्यांकन हेतु पहुँच गया है। पी०एन०सी०, हमीरपुर को निर्देशित किया कि सम्बन्धित विभागों से सम्बन्ध स्थापित करते हुए यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र तथा शासकीय भवनों जो पूर्व में किसी अन्य योजना, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशन लि० (यू०पी०पी०सी०एल०) अथवा जल जीवन मिशन से आच्छादित नहीं हुए हैं, उनका विवरण प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें। उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्यन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, हमीरपुर, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी तथा ए०डी०ओ० (पंचायती राज) को आवश्यक निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0(जेवी), जनरल मैनेजर, जे0डब्लू0आई0एल0-एस0पी0एम0एल0(जेवी) तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महोदय को निर्देशित किया गया कि सभी नल संयोजन घरों के अन्दर कराया जाय। प्रयास किया जाय कि जिस गाँव में कार्य प्रारम्भ किया जाय, उस गाँव में शत-प्रतिशत कनेक्शन देते हुए हर घर जल करने के उपरान्त ही टीम उस गाँव को छोड़ें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य सम्पादन में जो सड़क/सी.सी. रोड/गलियाँ छतिग्रस्त हो गयी हों, उनके पुर्ननिर्माण का कार्य पूर्व की स्थिति के अनुसार सम्पन्न हो गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला विकास अधिकारी, हमीरपुर/अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, हमीरपुर को निर्देश दिये गये कि जिन राजस्व ग्रामों FHTC का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, सत्यापन करा लिया जाय कि राजस्व ग्राम के सभी परिवारों में गृह नल संयोजन दिये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कोई भी परिवार छूटा नहीं है तथा राजस्व ग्राम के सभी मोहल्ला/गली/वार्ड रोड-रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा यदि कोई ग्राम छूटा हो तो उसकी सूची उपलब्ध करायें।

पुनर्गठन के 24 ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0-उपरोक्त 02 नग परियोजनाओं के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया पूर्व में निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं में शतप्रतिशत गृह जल संयोजन दिये जाने हेतु पुनर्गठन के अन्तर्गत 24 नग डी.पी.आर. विरचित किये गये जो निम्नवत् है-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	संचालन एवं अनुरक्षण की लागत (दस वर्षों के लिये) (रु. लाख में)
1	सुमेरपुर	छानीखुर्द ग्राम पेयजल योजना	452.88	102.23
2	राठ	गिरवर ग्राम पेयजल योजना	291.00	65.69
3	मौदहा	अरतरा ग्राम पेयजल योजना	358.36	80.89
4	मौदहा	सिसोलर ग्राम पेयजल योजना	546.78	123.43
5	सरीला	बोलपुर ग्राम पेयजल योजना	275.12	62.10
6	सरीला	पचखुरा ग्राम पेयजल योजना	208.43	47.05
7	सुमेरपुर	पचखुरा बुजुर्ग ग्राम पेयजल योजना	354.17	79.95
8	कुरारा	कुरुमरा ग्राम पेयजल योजना	483.61	109.16
9	मुस्करा	गुंदेला ग्राम पेयजल योजना	313.25	70.71
10	सरीला	मामना ग्राम पेयजल योजना	531.93	120.00
11	मौदहा	करहिया ग्राम पेयजल योजना	411.63	92.91
12	सरीला	जलालपुर ग्राम पेयजल योजना	201.49	45.48
13	कुरारा	पतारा डांडा ग्राम पेयजल योजना	658.90	148.74
14	सुमेरपुर	छानीबुजुर्ग ग्राम पेयजल योजना	482.79	108.98
15	राठ	ढूका ग्राम पेयजल योजना	192.63	43.48
16	मौदहा	कुनैहटा ग्राम पेयजल योजना	181.40	40.95
17	गोहाण्ड	इटैलिया बाजा ग्राम पेयजल योजना	383.28	86.52
18	सरीला	जरिया ग्राम पेयजल योजना	415.59	93.81
19	सरीला	बहेडी ग्राम पेयजल योजना	562.87	127.06
20	राठ	सरगांव ग्राम पेयजल योजना	152.99	34.54
21	सरीला	खण्डीत ग्राम पेयजल योजना	281.41	63.52
22	सरीला	मनकहरी ग्राम पेयजल योजना	204.72	46.21
23	राठ	लिघौरा ग्राम पेयजल योजना	152.67	34.46
24	मुस्करा	छानी ग्राम पेयजल योजना	160.13	36.14

उक्त 24 नग डी.पी.आर. को स्वीकृत कर जल निगम(ग्रामीण) मुख्यालय प्रेषित किया जाना है, जिस पर निर्णय लिया गया कि 24 नग डी.पी.आर. को जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय प्रेषित किया जाये। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महोबा को निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता पर शेष बचे हुए ग्रामों की डी0पी0आर0 को विरचित कराकर एक सप्ताह के अन्दर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को भेजना सुनिश्चित करें।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुये जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(सन्देश सिंह तामर)

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
हमीरपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महोबा

पत्र संख्या- 59 /

M-13

104

दिनांक- 18-01-2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबंध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ। (ई-मेल)
2. अधिशासी निदेशक महोदय, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल)
3. जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, हमीरपुर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर।
6. मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), हमीरपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ। (ई-मेल)
9. मुख्य अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर।
11. जिला पंचायत राज अधिकारी, हमीरपुर।
12. अधीक्षण अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
13. अधिशासी अभियन्ता वि0/यौ0, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), चित्रकूट।
14. सुपरविजन इंजीनियर पी0एम0सी0(आर0वी0 एसोसिएट्स)/टीग लीडर, टी0पी0आई0(सेन्सिस टेक लि0) हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि योजना का सतत पर्यवेक्षण करते हुए स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन व गुणवत्ता मानकों को लागू कराना सुनिश्चित करें।
15. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0(जेवी), हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
16. जनरल मैनेजर, जे0डब्लू0आई0एल0-पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0(जेवी), हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
17. स्टेट हेड, पी0एन0सी0/जे0डब्लू0आई0एल0। (ई-मेल द्वारा)

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
हमीरपुर।
