

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(DWSM)समिति दिनांक 26.02.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त


अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 26.02.2024 को जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1-मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर	(सदस्य)
2-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
3-प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।	(सदस्य)
4-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
5-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
7-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
8-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर।	(सदस्य)
9-अधिशाली अभियन्ता,वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई सहारनपुर।	(सदस्य)
10-अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, सहारनपुर।	सदस्य सचिव
11-श्री प्रदीप चौधरी, मा० सांसद, लोक सभा क्षेत्र कैराना।	मा० सांसद
12-श्री अशोक शर्मा, मै० एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०)	फर्म प्रतिनिधि
12-श्री सचिन कुमार, वुडहिल इन्फ्रा० लि० (गायत्री रैमकी जे०वी०), सहारनपुर	फर्म प्रतिनिधि
13-श्री, चन्द्र शेखर, मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा० सहारनपुर	फर्म प्रतिनिधि
14-श्री दीपक कुमार, मै० आरवी एसोसिएट्स	टी०पी०आई०

अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फेज-2 हेतु मैसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०) को चयनित किया गया है तथा फेज-3 हेतु फर्म मैसर्स एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०) व फर्म मैसर्स बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) को चयनित किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत कुल 1105 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये जा चुके हैं जिनमें फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०) को 184 नग राजस्व ग्राम एवं फर्म मैसर्स एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०) को 534 नग राजस्व ग्राम व फर्म मैसर्स बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) को 387 राजस्व ग्राम आवंटित हैं। वर्तमान तक 1105 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 706 नग डी०पी०आर० विरचित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति/स्वीकृति उपरांत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 706 नग डी०पी०आर० की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC)से स्वीकृत की जा चुकी है। 706 नग योजनाओं के सापेक्ष 703 नग (1103 राजस्व ग्राम) योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये 703 नग (1103 राजस्व ग्राम) कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष 03 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने के फलस्वरूप लम्बित है, जिसके सम्बन्ध में पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त 03 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।


EE



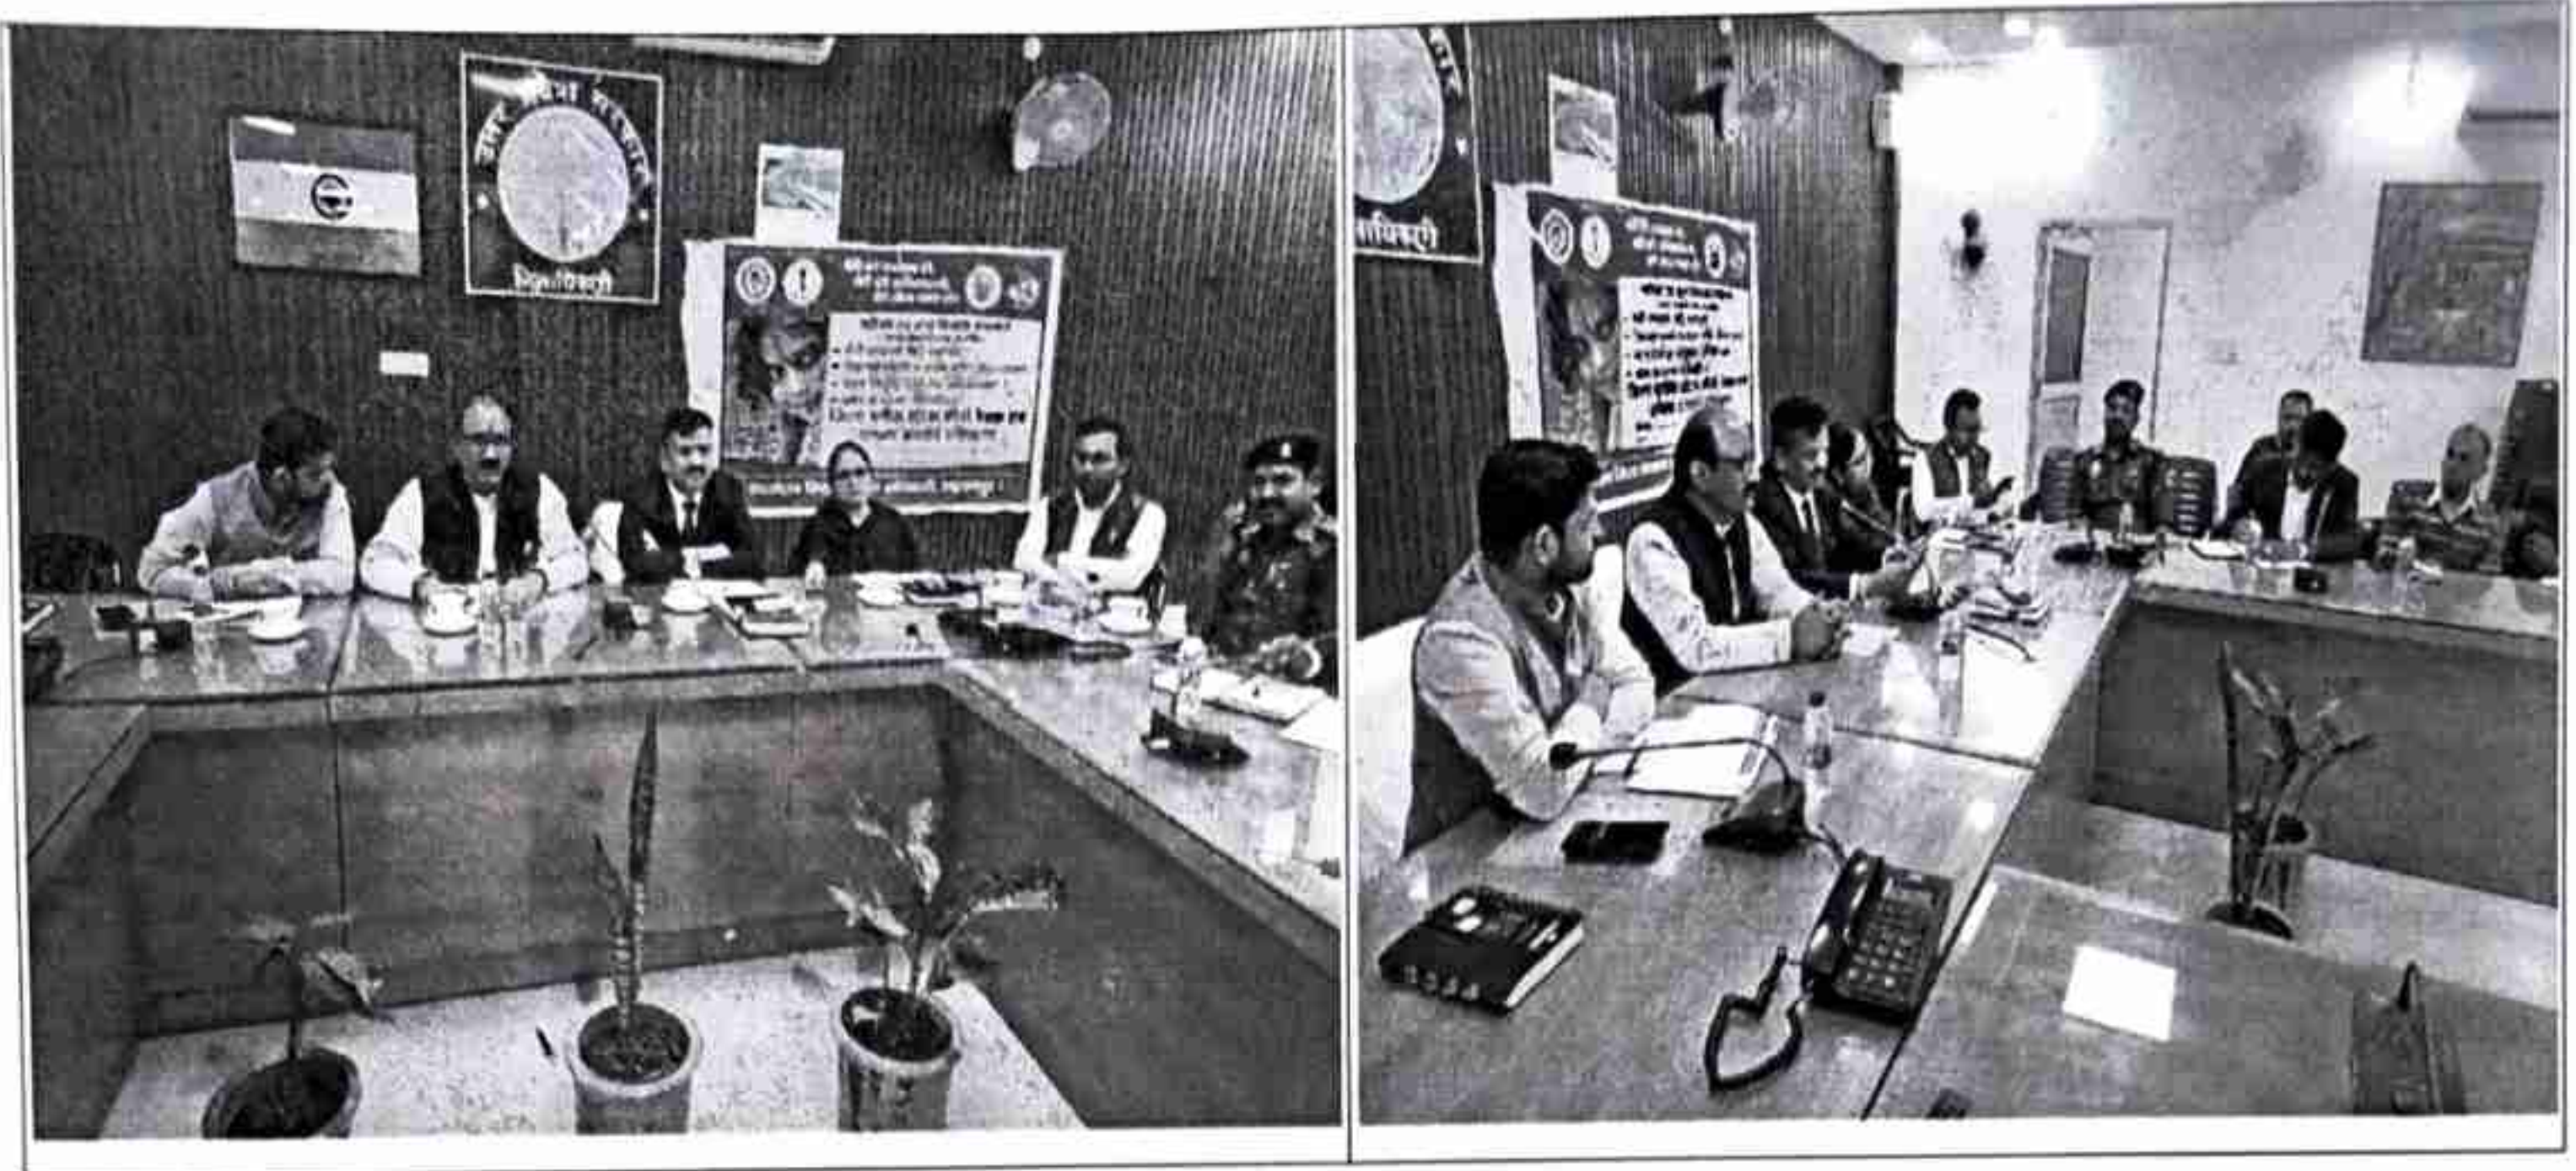

703 नग योजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन के सापेक्ष 628 योजनाओं में नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण करते हुये अन्य कार्य यथा गृह संयोजन, वितरण प्रणाली बिछाना, पम्प हाउस बाउन्ड्रीवॉल के कार्य, अवर जलाशय एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्य कराये जा रहे हैं जिसकी प्रगति का विवरण फर्मवार निम्नानुसार है :-

मैसर्स वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0

फेज-2 के अन्तर्गत मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को आवंटित 127 नग (184 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 127 नग (184 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म की सबलेट एजेन्सी मैसर्स वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा 118 नग (157 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 114 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 1016 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 740 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 113 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 113 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 103 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 16 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 04 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 02 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 17 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 02 योजना में Bottom Dome का कार्य तथा 78 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 83 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 75 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 01 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य प्रगति में है। 21 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 54 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है, 21 नग पेयजल योजनाओं में सोलर के माध्यम से प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। 98 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर 15 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 98 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 15 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 71255 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 61122 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

अवगत कराया गया कि कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर स्तर पर निरन्तर फर्म को पत्राचार किया जा रहा है परन्तु अभी भी अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 127 नग योजनाओं में से वर्तमान में 13 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही करायी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 118 नग योजनाये जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 114 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 114 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है एवं 13 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 14 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 30 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिसमें मुख्यतः 18 नग (सूची संलग्न) अवर जलाशयों का निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करना, 12 नग (सूची संलग्न) योजनाओं की सडक पुर्नस्थापना का कार्य दिनांक 05.03.2024 तक पूर्ण करना, 16 नग (सूची संलग्न) योजनाओं में वितरण प्रणाली व गृह संयोजन का कार्य, 12 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना का कार्य दिनांक 10.03.2024 तक पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रतिदिन 400 नग गृह संयोजन करने का लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति के प्रति असंतोष प्रकट करते हुये शासन को पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त योजनाओं के निर्माण कार्यों की दैनिक प्रगति और कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की स्थिति से प्रतिदिन पत्र के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लि0)

[Signature]
EE

[Signature]

[Signature]

मैसर्स बाबा-जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0)

फेज-2 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा Descope करने के उपरांत 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनायें मैसर्स बाबा जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0) को आवंटित की गयी है। आवंटित 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 227 नग योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 227 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2289 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 1571 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 197 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 183 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 186 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 04 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 31 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 27 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 57 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 14 योजना में Bottom Dome 03 योजना में Top Dome का कार्य तथा 28 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 142 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 50 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 10 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 42 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है। 10 नग योजनाओं में प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। 123 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर तथा 76 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 104 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य तथा 117 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 138877 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 59365 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

फर्म द्वारा 123 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 50 नग योजनाओं में टेस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 251 नग योजनाओं में से वर्तमान में 14 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 227 नग योजनायें जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 123 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 76 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है एवं 54 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 54 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 41 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 55 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिसमें मुख्यतः 57 नग (सूची संलग्न) अवर जलाशयों का निर्माण कार्य, 76 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य, 76 नग योजनाओं में गृह संयोजन दिये जाने का कार्य व 49 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करना, 16 नग (सूची संलग्न) योजनाओं की सडक पुर्नस्थापना का कार्य दिनांक 05.03.2024 तक पूर्ण करना, 16 नग (सूची संलग्न) योजनाओं में वितरण प्रणाली व गृह संयोजन का कार्य दिनांक 10.03.2024 तक पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रतिदिन 1500 नग गृह संयोजन करने का लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति के प्रति असंतोष प्रकट करते हुये शासन को पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त योजनाओं के निर्माण कार्यों की दैनिक प्रगति और कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की स्थिति से प्रतिदिन पत्र के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 बाबा-जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

मैसर्स एन0के0जी0-प्राईमस (जे0वी0)

फेज-3 के अन्तर्गत मैसर्स एन0के0जी0 प्राईमस (जे0वी0) को आवंटित 328 नग योजनाओं के सापेक्ष 325 नग योजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 287 नग योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 287 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2672 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 1555 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 231 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 220 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 222 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 07 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, 55 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 02 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 21 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 07 योजना में Bottom Dome का कार्य, 02 योजना में Top Dome का कार्य तथा 134 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 120 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 86 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 30 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 55 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है 30 नग पेयजल योजनाओं में सोलर के माध्यम प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। 137 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य 112 नग योजनाओं में गृह संयोजन पूर्ण कर तथा 105 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य 103 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 161875 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 132129 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

फर्म द्वारा 137 नग योजनाओं में पाईप लाईन तथा 112 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 86 नग योजनाओं में टेस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। पाईप

EE

4

00

लाईन, गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 328 नग योजनाओं में से वर्तमान में 38 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 03 नग योजनाओं में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 70 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 65 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 32 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिसमें मुख्यतः 21 नग (सूची संलग्न) अवर जलाशयों का निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करना, 107 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य, 110 नग योजनाओं में गृह संयोजन दिये जाने का कार्य व 20 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करना, 20 नग (सूची संलग्न) योजनाओं की सडक पुर्नस्थापना का कार्य दिनांक 05.03.2024 तक पूर्ण, 15 नग (सूची संलग्न) योजनाओं में वितरण प्रणाली व गृह संयोजन का कार्य दिनांक 10.03.2024 तक पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रतिदिन 1500 नग गृह संयोजन करने का लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति के प्रति असंतोष प्रकट करते हुये शासन को पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त योजनाओं के निर्माण कार्यों की दैनिक प्रगति और कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिकों की स्थिति से प्रतिदिन पत्र के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एन0के0जी0-प्राइमस जे0वी0।)

मा0 सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी द्वारा निर्देशित किया गया कि जेहरा पेयजल योजना विकास खण्ड गंगोह के निर्माण कार्य दिनांक 05.03.2024 तक, वजीरपुर पेयजल योजना विकास खण्ड गंगोह के निर्माण कार्य दिनांक 05.03.2024 तक व तिरपडी पेयजल योजना विकास खण्ड नकुड के निर्माण कार्य दिनांक 05.03.2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और जनपद में निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर योजनाओं को जनउपयोगी करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एन0के0जी0-प्राइमस जे0वी0/
मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0/ मै0 बाबा-जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

क्र0सं0	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिशासी अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिंचाई विभाग, सहारनपुर	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	
9	अधिशासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर	
10	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर	

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
सहारनपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

- 4-मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 5-मुख्य अभियन्ता (मे०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 6-मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
- 8-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 9-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
- 10-प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
- 11-अधिकासी अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिंचाई विभाग, सहारनपुर।
- 12-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।
- 13-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।
- 14-जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।
- 15-अधिकासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर।
- 16-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर।
- 17-समस्त उपजिलाधिकारी।
- 18-टी०पी०आई०/डी०पी०एम०यू० सहारनपुर।
- 19-मै० बुडहिल इन्फ्रा० लि०/मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०/मै० बाबा जी०ए० इन्फ्रा० जे०वी०।

27.2.24
अधिकासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर।
