


जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति” दिनांक 18.10.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा0सं0 95/छिह्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी0सी0-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति की बैठक दिनांक 18.10.2023 को जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1—मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर	(सदस्य)
2—जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
3—प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग, सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।	(सदस्य)
4—जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
5—जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
6—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
7—जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
8—अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर।	(सदस्य)
9—अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेज / सिंचाई सहारनपुर।	(सदस्य)
10—अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।	सदस्य सचिव
11—श्री देवेन्द्र निम, माननीय विधायक, विधानसभा—रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।	जन प्रतिनिधि
12—श्री मुकेश चौधरी, माननीय विधायक, विधानसभा—नकुड़, सहारनपुर।	जन प्रतिनिधि
13—श्री अशोक शर्मा, एस0पी0एम0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)	फर्म प्रतिनिधि
14—श्री भंवर सिंह, पी0एम0, मै0 गायत्री, रैमकी जे0वी0, सहारनपुर	फर्म प्रतिनिधि
15—श्री चन्द्र शेखर, जी0एम0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0, सहारनपुर	फर्म प्रतिनिधि

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फेज-2 हेतु मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को चयनित किया गया है तथा फेज-3 हेतु फर्म मैसर्स एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0) को चयनित किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत कुल 1105 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये जा चुके हैं जिनमें फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को 571 नग राजस्व ग्राम एवं फर्म मैसर्स एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0) को 534 नग राजस्व ग्राम आवंटित है। वर्तमान तक 1105 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 706 नग डी0पी0आर0 विरचित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति/स्वीकृति उपरांत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 706 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) से स्वीकृत की जा चुकी है। 706 नग योजनाओं के सापेक्ष 700 नग (1099 राजस्व ग्राम) योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये 699 नग कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष 06 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने के फलस्वरूप लम्बित है, जिसके सम्बन्ध में पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त 06 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

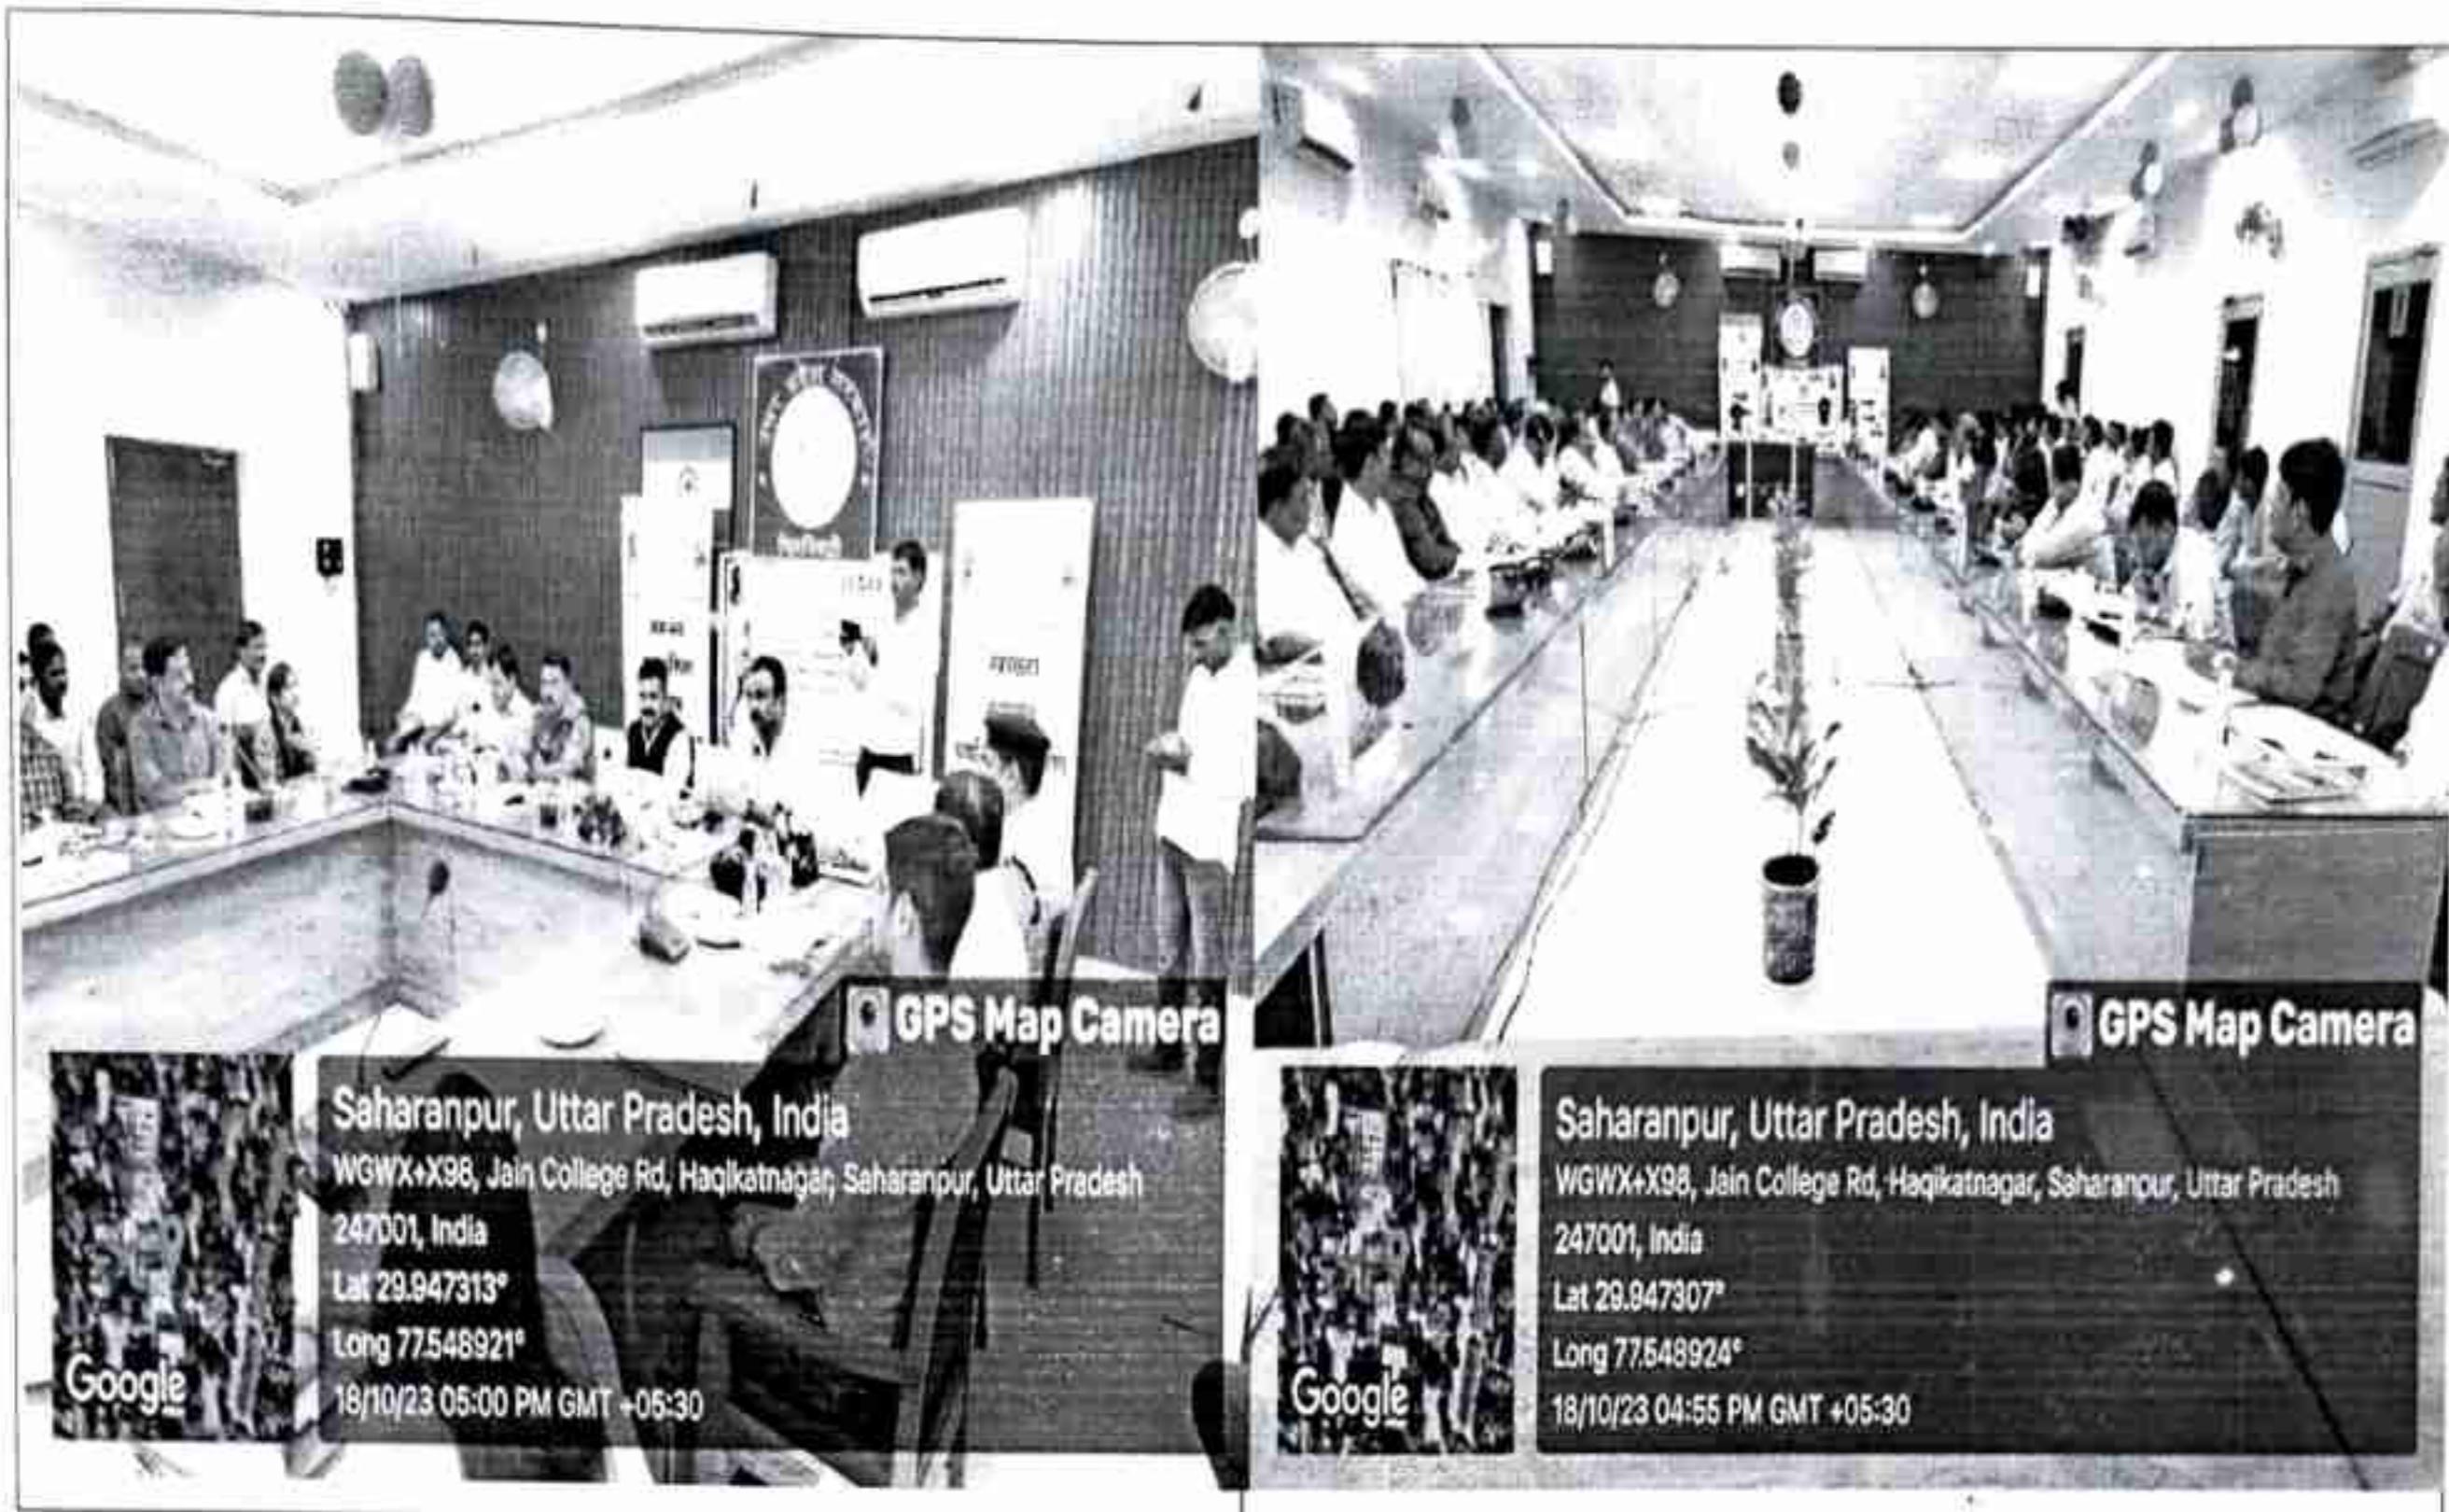

699 नग योजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन के सापेक्ष 557 योजनाओं में नलकूप बोरिंग का कार्य प्रारम्भ करते हुये अन्य कार्य यथा गृह संयोजन, वितरण प्रणाली बिछाना, पम्प हाउस बाउन्ड्रीवॉल के कार्य, अवर जलाशय एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्य कराये जा रहे हैं जिसकी प्रगति का विवरण फर्मवार निम्नानुसार है :-

मैसर्स वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंग

फेज-2 के अन्तर्गत मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को आवंटित 127 नग (184 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 127 नग (184 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म की सबलेट एजेन्सी मैसर्स वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंग द्वारा 118 नग (157 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 112 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 1016 किमी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 639 किमी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 93 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 96 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 115 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 08 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 06 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 03 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 10 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 04 योजना में Bottom Dome का कार्य तथा 85 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 110 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 47 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 04 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य प्रगति में है। 14 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 34 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है परन्तु प्रतिदिन जलापूर्ति नहीं की जा रही है। 76 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर 34 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 74 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 35 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 70000 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 53256 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

अवगत कराया गया कि कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर स्तर पर निरन्तर फर्म को पत्राचार किया जा रहा है परन्तु अभी भी अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 127 नग योजनाओं में से वर्तमान में 03 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही करायी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 118 नग योजनाये जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 110 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 109 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है एवं 08 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 09 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 70 नग योजनाओं में सोलर, 03 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 58 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। फर्म द्वारा फेज-2 के कार्यों को लगभग 01 वर्ष 6 माह हो चुके हैं परन्तु फर्म द्वारा अभी तक योजनाओं को पूर्ण करने की गति अत्यन्त धीमी एवं असंतोषजनक है जिसके लिये जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा रोष प्रकट करते हुये शासन को पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त शेष 08 नग योजनाओं जिनमें विवाद का निस्तारण किया जा चुका है उनमें शीघ्र अतिशीघ्र बोरिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम / मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लिंग)

[Signature]

[Signature]

मैसर्स बाबा-जी०ए० इन्फा (जे०वी०)

फेज-2 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता निशान लखनऊ द्वारा Descope करने के उपरांत 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनायें मैसर्स बाबा जी०ए० इन्फा (जे०वी०) को आवंटित की गयी है। आवंटित 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 247 नग (383 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 207 नग योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 190 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2289 कि०मी० पाईप लाईन के सापेक्ष 1061 कि०मी० पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 125 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 113 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 130 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से शून्य नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 36 योजनाओं में पी०सी०सी० का कार्य, 33 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 30 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, शून्य योजना में Bottom Dome का कार्य तथा 36 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 175 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 18 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 09 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 15 नग योजनाओं में डी०जी० के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है परन्तु प्रतिदिन जलापूर्ति नहीं की जा रही है। 78 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का पूर्ण कर 110 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 37 नग योजनाओं गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 122 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 139000 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 20925 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

फर्म द्वारा 78 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 37 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 251 नग योजनाओं में से वर्तमान में 18 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से स्वच्छता समिति द्वारा जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 188 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 159 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है एवं 19 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार 48 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 170 नग योजनाओं में सोलर, 77 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 152 नग योजनाओं में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा असंतोष प्रकट करते हुये शासन को पत्र भेजने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त शेष 36 नग योजनाओं जिनमें विवाद का निस्तारण किया जा चुका है उनमें शीघ्र अतिशीघ्र बोरिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिकारी अभियन्ता, जल निगम / मै० बाबा-जी०ए० इन्फा० जे०वी०)

मैसर्स एन०के०जी०-प्राईमस (जे०वी०)

फेज-3 के अन्तर्गत मैसर्स एन०के०जी० प्राईमस (जे०वी०) को आवंटित 328 नग योजनाओं के सापेक्ष 324 नग योजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 274 नग योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 255 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2672 कि०मी० पाईप लाईन के सापेक्ष 1052 कि०मी० पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 162 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 170 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। फर्म द्वारा 194 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसमें से 02 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, 50 योजनाओं में पी०सी०सी० का कार्य, 03 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 15 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 04 योजना में Bottom Dome का कार्य, 02 योजना में Top Dome का कार्य तथा 118 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 253 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 60 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 16 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम से तथा 52 नग योजनाओं में डी०जी० के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है परन्तु प्रतिदिन जलापूर्ति नहीं की जा रही है। 94 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का पूर्ण कर 102 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 84 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 86 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 160761 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 98821 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये हैं।

फर्म द्वारा 94 नग योजनाओं में पाईप लाईन तथा 84 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 60 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। पाईप लाईन, गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों में प्रगति बढ़ाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 328 नग योजनाओं में से वर्तमान में 12 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 274 नग योजनाये जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 196 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 170 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है एवं 78 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इसी प्रकार

104 नग योजनाओंमें गृह संयोजन, 191 नग योजनाओं में सोलर, 80 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 118 नग योजनाओं में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट करते हुये शासन को पत्र शीघ्र अतिशीघ्र बोरिंग एवं योजना निर्माण का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम / मै0 एन0के0जी0-प्राइमस जे0वी0)

S.No.	Vidhan Sabha	No. of Schemes	No. of Schemes where work started	Boring		Pipeline		FHTC		OHT		Solar		Road Reinstatement		Water Supply Tested	Land Disputed		Other Disputed	
				Completed	Inprogress	Completed	Inprogress	Completed	Inprogress	WIP	Completed	WIP	Completed	Compl eted	Inprog ress		Pending	Inprogr ess		
1	Gangoh	122	115	114	1	66	40	57	44	91	3	33	13	14	44	48	2	1	11	
2	Rampur Manihar	92	82	78	4	45	24	31	33	60	3	25	4	14	25	25	3	5	16	
3	Deoband	101	87	84	3	31	38	24	30	56	0	11	0	3	16	16	0	5	15	
4	Nakur	145	121	111	8	58	40	48	42	88	2	29	18	14	48	37	8	5	17	
5	Saharanpur Dehat	114	92	91	1	31	35	23	40	70	2	22	2	2	37	17	3	6	19	
6	Behat	132	96	80	16	17	59	12	48	50	0	7	2	0	10	10	2	0	12	
	Total		706	593	558	33	248	236	195	237	415	10	127	39	47	180	153	18	22	90

समिति द्वारा विधानसभावार समीक्षा की गयी जिसमें शेष बोरिंग के कार्यों को माह अक्टूबर अंत तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि 149 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य किया जाना शेष है जिसमें से 43 नग योजनाओं (22+21) में भूमि की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय विधायक, विधानसभा नकुड़, सहारनपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि विधानसभा नकुड़ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सांपला एवं अन्य 11 योजनान्तर्गत जहाँ पर सड़क पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनकी सूची उपलब्ध कराने एवं सड़क पुर्नस्थापना व प्रयोग की जाने पाईप की गुणवत्ता की जांच जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर जांच करायी जाए। साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया कि योजना निर्माण के कार्यों को सही क्रम में पूर्ण कराया जाए एवं जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया हो उनके उदघाटन की तिथि निर्धारित कर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर/ अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/ मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0जे0वी)

माननीय विधायक, विधानसभा रामपुर मनिहारन, सहारनपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि विधानसभा रामपुर मनिहारन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार योजनाओं की प्रगति आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया कि योजना निर्माण के कार्यों को सही क्रम में पूर्ण कराया जाए एवं जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया हो उनके उदघाटन की तिथि निर्धारित कर अवगत कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत जन्धेड़ा समसपुर, सढ़ौली हरिया, शीतलाखेड़ा एवं घाटहेड़ा की योजनाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए तथा कपासी ग्राम की योजना का मोटर खराब है जिसको सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर/ अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/ मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0जे0वी)

टीम लीडर, टी0पी0आई0 को समय-समय पर मेटेरियल जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/ टीम लीडर, टी0पी0आई0 / मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0 जे0वी)

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन 10 योजनाओं के अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनका हर घर जल प्रमाण पत्र सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं के अवर जलाशय का कार्य पूर्ण हो मात्र उन्हीं योजनाओं के हर घर जल प्रमाण पत्र को सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0)/ मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0 जे0वी)

पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु योजनाओं के बैंक खाता (Capex/Opex) खुलवाने एवं यूजर चार्ज जमा कराने हेतु जनपद में कार्यरत समस्त आई0एस0ए0 संस्थाओं को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0) / समस्त आई0एस0ए0)

तहसील सदर में 11, नकुड़ में 05, रामपुर मनिहारन में 01 एवं बेहट में 04 लम्बित भूमि विवादों को अतिशीघ्र निस्तारित कराये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। निस्तारित कराये जा चुके भूमि विवादों को सम्बन्धित पोर्टल पर अपडेट कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

(समस्त उपजिलाधिकारी, सहारनपुर / अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0) / मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0जे0वी)

जिन योजनाओं में बोरिंग, गृह संयोजन, पाईप लाईन बिछाने, एवं पम्प अधिष्ठापन इत्यादि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जनपद की ऐसी 50 योजनाओं का कार्य मानकानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण 20 नवम्बर तक पूर्ण कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0) / मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0 जे0वी)

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत समस्त फर्मों को मैनपावर बढाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि समयानुसार कार्यों को पूर्ण कराया जा सकें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रा0) / मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0 जे0वी)

जिन पेयजल योजनाओं में बोरिंग, गृह संयोजन, पाईप लाईन बिछाने, एवं पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनमें सोलर अधिष्ठापित कर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम / मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0 जे0वी)

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

क्र0सं0	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिशासी अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिचाई विभाग, सहारनपुर	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	
9	अधिशासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर	
10	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर	

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
सहारनपुर।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर।

21/11/2023

01/11/2023

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1—प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2—अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता भिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3—संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4—मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 5—मुख्य अभियन्ता (म०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 6—मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 7—अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
- 8—जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 9—जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
- 10—प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
- 11—अधिशासी अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिंचाई विभाग, सहारनपुर।
- 12—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।
- 13—जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।
- 14—जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।
- 15—अधिशासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर।
- 16—सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर।
- 17—समस्त उपजिलाधिकारी।
- 18—समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
- 19—टी०पी०आई० / डी०पी०एम०य० सहारनपुर।
- 20—मै० वुडहिल इन्फा० लि�० / मै० एन०क०जी० प्राइमस जे०वी० / मै० बाबा जी०ए० इन्फा० जे०वी।

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर।

21/11/2023
