

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 04.09.2025 को जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर
की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त -**


जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 04.09.2025 को जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री प्रणय कृष्ण, प्रतिनिधि मुख्य विकास अधिकारी/पीओडी, डीओआरडीओए, सहारनपुर।
2. मो० हाशिम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
3. श्री योगेश कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
4. श्री राम दत्त, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
5. श्री शैकी देव, सहायक अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर।
6. श्री दुष्यन्त कुमार, अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
7. श्री सौरभ कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
8. श्री पंकज चावला, अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
9. श्री अमित कुमार, अवर अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर।
10. श्री शरद अग्रहारी, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर डिवीजन सहारनपुर मै० आरवी एसोसिएटस् (TPI), सहारनपुर।
11. श्री एच०पी० सिंह, महाप्रबन्धक, मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०, सहारनपुर।
12. श्री सचिन कुमार, परियोजना प्रबन्धक, मै० वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सहारनपुर।
13. श्री सुभम लाम्बा, परियोजना प्रबन्धक, मै० जी०ए० बाबा इन्फ्रा (जे०वी०), सहारनपुर।
14. मै० आकिश खान, परियोजना प्रबन्धक, मै० जी०ए० बाबा इन्फ्रा (जे०वी०), सहारनपुर।

उक्त बैठक में अधिशासी अभियन्ता, द्वारा एजेन्सी वार जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया। बैठक में अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्तमान तक जनपद की कुल 706 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 678 नग पेयजल योजनाओं में भूमि उपलब्ध होने एवं 28 नग पेयजल योजनाओं के ग्रामों में भूमि विवाद/भूमि अनुपलब्धता की स्थिति से जिलाधिकारी महोदय अवगत कराया।

Land Issue Status								
S. No	Component	Name of Firm	Scope	Land Acquired as on date				Land Dispute/ Not Available
				11.06.25	25.07.25	12.08.25	04.09.25	No.
1	Land Status	Woodhill	127	120	120	125	125	2
2		NKG	328	292	292	308	310	18
3		G.A	177	166	166	169	169	8
4		BABA	74	74	74	74	74	0
	Total		706	652	652	676	678	28

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/मै० वुडहिल इन्फ्रा० लि०,
मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०, मै० बाबा जी०ए० इन्फ्रा० जे०वी०।)

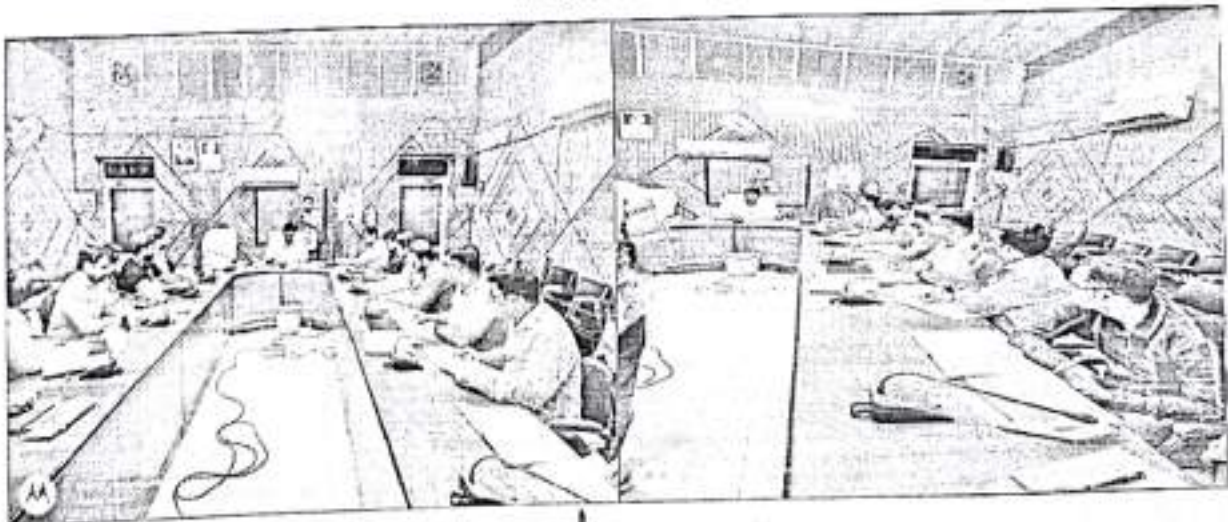

MLD USE OF Wd A-11/0M M-13

[Handwritten signatures and initials]

भूमि उपलब्धता के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ (नलकूप छिद्रण)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों के 678 नग पेयजल योजनाओं में भूमि उपलब्धता के उपरांत कार्य प्रारम्भ/नलकूप छिद्रण के कार्यों की समीक्षा की गयी। जिसमें दिगत 15 दिवस के सापेक्ष फर्म बुडहिल इन्फ्रा के परियोजना प्रबन्धक श्री सधिन कुमार द्वारा 01 नग, फर्म एन0के0जी0 के परियोजना प्रबन्धक श्री प्रमोद कुमार मौर्य द्वारा 06, नग फर्म जी0ए0 बाबा के परियोजना प्रबन्ध मौ0 आशिय खान व श्री सुमम लाम्बा द्वारा 00 नग पेयजल योजनाओं पर नलकूप छिद्रण के कार्य पूर्ण होने एवं क्रमशः 01, 03 नग एवं 01 नग पेयजल योजनाओं पर नलकूप छिद्रण के कार्यों का प्रगति में होने की स्थिति से अवगत कराया गया।

Tubewell Status									
S.N o.	Component	Name of Firm	Scope	Tubewell bored as on date				WIP	Work not started by Agency
				11.06.25	25.07.25	12.08.25	04.09.25	No.	No.
1	Tubewell (according to land status)	Woodhill	125	120	120	120	121	1	3
2		NKG	310	293	293	293	299	3	8
3		G.A	169	167	167	167	167	1	1
4		BABA	74	74	74	74	74	0	0
	Total		676	654	654	654	661	5	12

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मौ0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मौ0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मौ0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा 678 पेयजल योजनाओं के ग्रामों में भूमि उपलब्धता उपरांत वर्तमान तक 661 नग पेयजल योजनाओं पर ही नलकूप छिद्रण के कार्य पूर्ण होने की स्थिति रोष व्यक्त किया एवं समस्त फर्मों को 12 नग परियोजनायें जिन पर नलकूप छिद्रण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उन पर आगामी बैठक तक नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।

पम्प हाउस :- जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म जी0ए0 इन्फ्रा द्वारा कराये जा रहे पम्प हाउस के निर्माण कार्यों की प्रगति व पिछले 15 दिनों में एक भी पम्प हाउस पूर्ण न हाने के सम्बन्ध में नाराजगी व्यक्त की गयी।

Pump House Status										
S. No.	Component	Name of Firm	Scope	Completed as on date				WIP Today	Started but currently stopped	Not Started
				11.06.25	25.07.25	12.08.25	04.09.25			
1	Pump House (टपुबरेल के अनुसार)	Woodhill	125	114	114	114	115	1	0	5
2		NKG	310	169	169	169	178	12	84	36
3		G.A	169	150	150	150	150	12	0	7
4		BABA	74	73	73	73	73	0	0	1
	Total		678	506	506	506	516	25	84	49

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मौ0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मौ0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मौ0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

फर्म मौ0 एन0के0जी0 - फर्म के परियोजना प्रबन्धक श्री प्रमोद कुमार मौर्य द्वारा पूर्ववर्ती बैठक की तुलना में 09 नग पेयजल योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण होने एवं 12 नग पेयजल योजनाओं पर पम्प हाउस के निर्माण कार्य प्रगति में होने व 36 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ न होने के विषय में अवगत कराया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मौ0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0,

MS/01/SRE OF. Wa./La.23/OM.M/12

Sachin Woodhill

Pradeep

मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा वर्तमान में 12 पेयजल योजनाओं पर निर्माणाधीन पम्प हाउस के निर्माण कार्य को अगले बैठक तक पूर्ण करने हेतु एवं लेबर व मैनपावर बढ़ाते हुये 01 सप्ताह में 36 नग पेयजल योजनाये के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं आगामी 15 दिवस में 100 टीमे लगाते हुये कार्य प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0

फर्म के परियोजना प्रबन्धक श्री सचिन कुमार द्वारा 01 नग पम्प हाउस के निर्माण कार्य की प्रगति एवं 05 नग पेयजल योजनाओं में कार्य प्रारम्भ न होने के विषय में अवगत कराया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कठोर शब्दों में 01 सप्ताह में कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

बाउन्ड्रीवॉल :- अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा बाउन्ड्रीवॉल की प्रगति से अवगत कराते हुये 15 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य की प्रगति एवं 54 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति से अवगत कराया गया।

S. No.	Component	Name of Firm	Scope	Boundary Wall Status Completed as on date				WIP Today	Started but currently stopped	Not Started
				11.06.25	25.07.25	12.08.25	04.09.25			
1	Boundary wall (ट्यूबवेल के अनुसार)	Woodhill	125	114	114	114	114	2	1	8
2		NKG	310	221	221	221	221	5	47	37
3		G.A	169	147	147	147	149	8	4	8
4		BABA	74	62	62	65	65	0	8	1
	Total		678	544	544	547	549	15	60	54

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को 03 सप्ताह में एक भी बाउन्ड्रीवॉल पूर्ण न होने व फर्म बाबा-जी0ए0 को 08 नग पेयजल योजनाओं पर चल रहे बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य को सापेक्ष किसी भी योजना पर बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर गहन नाराजगी व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म एन0के0जी0 को 05 निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण करने व 37 नग पेयजल योजनाओं में कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

पाईप लाईन :- अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिगत बैठक की तुलना में फर्म मै0 एन0के0जी0 द्वारा कराये जा रहे पाईप लाईन बिछाने के कार्यों में 01 नग पेयजल योजना की प्रगति, फर्म जी0ए0 बाबा की 01 नग योजना की प्रगति एवं फर्म बुडहिल इन्फ्रा शून्य प्रगति से अवगत कराया गया।

S. No.	Component	Name of Firm	Scope	Pipe Line Status Completed as on date				WIP Today	Started but currently stopped	Not Started
				11.06.25	25.07.25	12.08.25	04.09.25			
1	Pipe line (ट्यूबवेल के अनुसार)	Woodhill	125	113	113	113	113	1	5	2
2		NKG	310	181	181	183	184	19	76	31
3		G.A	169	93	97	121	121	4	41	3
4		BABA	74	61	61	61	62	0	12	0
	Total		678	448	452	478	480	24	134	36

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 एन0के0जी0 व जी0ए0 बाबा एवं बुडहिल इन्फ्रा द्वारा पाईप लाईन बिछाने की प्रगति वाली योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

MS/01/08/01 of No./14-23/084.M/1

[Signature]

[Signature]

गृह संयोजन :- अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा पूर्व की बैठक के सापेक्ष वर्तमान तक दिनांक 04.02.2025 तक कुल 400 नग पेयजल योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण होने, 36 नग पेयजल योजनाओं में कार्य प्रगति में होने व 43 नग पेयजल योजनाओं में कार्य न होने की स्थिति से अवगत कराया गया।

FIITC Status											
S. No.	Component	Name of Firm	Scope (no.s wise)		Scope Scheme wise)	Complete as on date				WIP Today	Not Started
			Overall	04.09.25		11.06.25	25.07.25	12.08.25	04.09.25		
1	FIITC (टयूरपेल के अनुसार)	Woodhill	70907	62378	125	113	113	113	113	1	2
2		NKG	148417	122464	310	154	154	154	154	20	25
3		G.A	77564	68514	169	64	64	64	74	11	16
4		BABA	49268	42464	74	57	57	59	59	4	0
Total			346156	295820	678	388	388	390	400	36	43

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0 जे0वी0।)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 एन0के0जी0 व जी0ए0 बाबा द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त करते हुये गृह संयोजन प्रगति वाली पेयजल योजनाओं को आगामी बैठक तक पूर्ण करने व कार्य प्रारम्भ न होने वाले पेयजल योजनाओं के ग्रामों में 01 सप्ताह में मैनपावर बढ़ाते हुये गृह संयोजन प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अवर जलाशय :- अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 04.09.2025 तक कुल 99 अवर जलाशयों के निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं 88 अवर जलाशयों के निर्माण कार्य प्रगति में होने तथा 322 नग पेयजल योजनाओं पर अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति से अवगत कराते हुये पिछले 15 दिवस में 05 अवर जलाशयों के निर्माण कार्यों को प्रगति से अवगत कराया।

Over Head Tank (OHT) Status										
S. No.	Component	Name of Firm	Scope	Complete as on date				WIP Today	Started but currently stopped	Not Started
				11.06.25	25.07.25	12.08.25	04.09.25			
1	OHT (टयूरपेल के अनुसार)	Woodhill	125	28	28	28	28	6	31	56
2		NKG	310	11	11	11	11	6	56	237
3		G.A	169	29	29	29	33	69	23	29
4		BABA	74	26	26	26	27	7	40	0
	Total		678	94	94	94	99	88	150	322

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 एन0के0जी0 व बुडहिल द्वारा कराये जा रहे अवर जलाशय के निर्माणधीन कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये शीघ्र-अतिशीघ्र स्थानीय लेबर लगाते हुये निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 बुडहिल इन्फा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0 जे0वी0।)

सड़क पुर्नस्थापना :- अधिशासी अभियन्ता द्वारा फर्मों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की स्थिति से अवगत कराया गया जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा फर्म बुडहिल को 08 नग फर्म मै0 एन0के0जी0 को 06 नग फर्म मै0 जी0ए0 बाबा को 08 नग पेयजल योजनाओं के ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य पूर्ण होने एवं क्रमशः 08

[Signature]

[Signature]

नग, 20 नग एवं 11 नग पेयजल योजनाओं के ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों के प्रगति में होने की स्थिति से अवगत कराया गया ।

Road Restoration Work Status										
S. No.	Component	Name of Firm	Scope	Complete as on date				WIP Today	Started but currently stopped	Not Started
				11.06.25	25.07.25	12.08.25	04.09.25			
1	Road Restoration (पाईप लाईन के अनुसार)	Woodhill	113	64	64	64	72	8	9	24
2		NKG	184	91	91	91	97	20	15	52
3		G.A	121	72	75	78	85	6	0	30
4		BABA	62	41	48	50	51	5	6	0
Total			480	268	278	283	305	39	30	106

जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी फर्मों के 106 ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ न होने एवं 30 नग पेयजल योजनाओं के ग्रामों में पुर्नस्थापना में कार्य प्रारम्भ होने के उपरांत रुके होने की स्थिति पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुये समस्त फर्मों के अधिकारियों व समस्त सहायक अभियन्ताओं एवं जूनियर इंजीनियर को कठोर शब्दों में कार्य प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के उपरांत सूची साझा करते हुये लोक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे पाईप लाईन बिछाने सम्बन्धी अनुमति लेने उपरांत शीघ्र अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 बुडहिल इन्फ्रा लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा जे0वी0।)

(सचिन कुमार)
मै0 बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0
सहारनपुर

(शरद अग्रहारी)
डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर,(TPI),
सहारनपुर

(योगेश कुमार)
सहायक अभियन्ता,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर

(प्रणय कृष्ण)
प्रतिनिधि मुख्य विकास अधिकारी/
पी0डी0, डी0आर0डी0ए0

(एच0पी0 सिंह)
मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0
सहारनपुर

(सुगम लाम्बा)
मै0 बाबा-जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0)
सहारनपुर

(मो0 हाशिम)
अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर
