

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) के तहत दिनांक 26.12.2025 को जल जीवन मिशन टीम के साथ बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही -

1. श्री कुमुदेन्द्र कलाकर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, जालौन।
2. श्री राम अयोध्या प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
3. श्री धर्म घोष, अधिशासी अभियन्ता, बेतवा नहर प्रखण्ड-1, उरई।
4. श्री सी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, बेतवा नहर प्रखण्ड-2, उरई।
5. श्री अंचल कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
6. श्री पंकज तिवारी, जिला सूचना अधिकारी, जालौन।
7. श्री मुक्तेश गुप्ता, बी0ई0ओ0, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन।
8. श्री अंचल कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
9. श्री महेन्द्र नाथ भारती, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, जालौन।
10. श्री जीतेन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जालौन।
11. श्री ए0के0 सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जालौन।
12. श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
13. श्री सौरभ सिंह, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
14. श्री धर्मेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, जल निगम।
15. श्री महेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
16. श्री विवेक कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
17. श्री कृष्णा राजपूत, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, बी0एल0जी0, जालौन।
18. श्री के0वी0 सत्यनारायण, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि0, जालौन।
19. श्री आजाद चोपड़ा, डी0पी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
20. श्री प्रमोद बड़क, पी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
21. श्री पी0 सिद्धैया, प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर, जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0।
22. श्री नागेश, डी0जी0एम0, जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 W-11011/30/2021-JJM-I-DDWS दिनांक 16.10.2025 तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 2587/JJM Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन पाइप पेयजल योजनाओं की अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) समाप्त हो गई है, उन योजनाओं की नई अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 के द्वारा सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या 32/ई0डी0/2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् है।

1-सला ग्राम समूह सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

सला डब्ल्यू0टी0पी0 के अन्तर्गत स्काडा को सभी ओ0एच0टी0 से जोड़ने, क्रियाशील किये जाने एवं इन्टीग्रेशन का कार्य शेष है। WTP पर संचालन एवं अनुरक्षण हेतु Skilled Engineer की कमी है। सभी CWR पर रेलिंग, रैम्प निर्माण, स्लूस वाल्व चेम्बर का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। सभी ओ0एच0टी0 के Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, Water level

Indicator का कार्य पूर्ण नहीं है। गृह संयोजन के अन्तर्गत जी0आई0 पाइप क्लेम्पिंग, ग्राउटिंग, MDPE Pipeकी Encasing का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 18 टीम के सापेक्ष केवल 05 टीम कार्यरत है। सीडब्ल्यूआर एवं ओ0एच0टी0 के **Campus Development** एवं एप्रोच रोड का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा बाउण्ड्रीवाल में प्लास्टर, प्वान्टिंग, गेट लगाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं है। सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण कराए जाने का कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है।

कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा अनुबन्ध संख्या 35/ई0डी0/2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे सतही स्रोत आधारित रायपुरा, मढ़ेपुरा, कोटा मुस्तकिल एवं 256 भूजल आधारित पेयजल योजनाओं की प्रगति निम्नवत पाई गयी—

1-रायपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना—

इन्टेकवेल में JJM Logo, EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में फ्लोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। 17 OHTके सापेक्ष सभी में Down Pipe लगाये जाने का कार्य, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, वाटर लेवल इंडीकेटर का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DIपाइप लाइन में 18 गैप है, जिससे सी0डब्ल्यू0आर0 एवं अवर जलाशय को Functional किये जाने का कार्य बाधित हो रहा है। 83 ग्राम के सापेक्ष मात्र 32 ग्राम में कमिनिंग का कार्य किया गया है किन्तु किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिससे जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है।

2-कोटा मु0 सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना—

इन्टेकवेल में पैनल अधिष्ठापन, EOT Crane, SCADA का कार्य शेष है। EOT Crane एवं स्काडा की सामग्री वर्तमान तक कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा क्रय नहीं की गयी है। डब्ल्यू0टी0पी0 में प्लान्टेशन का कार्य तथा स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत 01 सी0डब्ल्यू0आर0 में पैनल अधिष्ठापन, केबल ट्रे लगाये जाने एवं केबल विछाये जाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सभी ओ0एच0टी0 के Railing, Floor एवं Valve Chamber, Mane hole cover, Water level Indicatorका कार्य शेष है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DIपाइप लाइन में 88 गैप है। वर्तमान तक 77 ग्राम के सापेक्ष केवल 04 ग्राम में कमिनिंग की गयी है तथा जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- मढ़ेपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना—

इन्टेकवेल में EOT Crane, SCADA, JJM Logo एवं पेन्टिंग का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में फ्लोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। सभी 12 ओ0एच0टी0 के Down Pipe, Railing, Floor एवं Valve Chamber, Mane hole cover, Water level Indicatorका कार्य शेष है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DIपाइप लाइन में 55 गैप है। 69 ग्राम के सापेक्ष केवल 15 ग्राम में कमिनिंग का कार्य किया गया है किन्तु किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।



4- 256 नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना-

256 नग नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 205 पम्प अधिष्ठापन का कार्य किया गया है, परन्तु स्टार्टर एवं पैनल अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है, जिससे ग्रामों को कमिशनिंग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 255 OHT के सापेक्ष 08 ओओएचओटी में Raft Foundation हेतु पीओसीओसीओ का कार्य नहीं किया गया है। सभी ओओएचटी में Stairs, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber बनाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं है तथा ओओएचटी को फंक्शनल किये जाने हेतु मात्र एक टीम लगाई गई है, जिससे ग्राम के सभी घरों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। 256 पम्प हाउस के सापेक्ष 08 पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा दरवाजे, खिड़की, एप्रन, कट आउट, बाईपास चैम्बर निर्माण का कार्य एवं क्लोरीन डोजिंग सिस्टम, पैन्टिंग एवं वोल्टेज स्टेप लाईजर, गर्डर, पैनल लगाये जाने एवं अन्य विओ/यौओ कार्य पूर्ण नहीं हैं। 255 बाउन्ड्रीवॉल के सापेक्ष केवल 233 में ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण किया गया है परन्तु प्लास्टर एवं प्वांटिंग का कार्य पूर्ण नहीं है। 255 स्टॉफ क्वार्टर के सापेक्ष केवल 248 में Slab casting का कार्य किया गया है, परन्तु आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लम्बिंग का कार्य पूर्ण नहीं है।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बीओजीओसीओसीओ एवं जीओवीओपीओआरओ द्वारा पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों के सापेक्ष सीओसीओ, इण्टरलॉकिंग एवं खड़न्जा रोड़ पुनर्निर्माण का कार्य नहीं किया गया है। अतः एजेन्सी को 31 जनवरी, 2026 तक सभी ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जीओवीओपीओआरओ व बीओजीओसीओसीओ के प्रतिनिधियों को सभी ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने, स्काडा अधिष्ठापन, शेष राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली की ज्वाइंटिंग, गृह जल संयोजन के कार्य एवं नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने के कार्यों तथा सभी ग्रामों को "हर घर जल" कराये जाने हेतु आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये अनुबन्ध की शर्तानुसार यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

माओ वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण-2025 में की गई घोषणा के आलोक में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक विस्तारित किया गया है। इस सन्दर्भ में, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा JJM-IMIS में समय सीमा विस्तार (Eutension of Timeline & Eot) की अपेक्षा की गई है।

सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी मैओ जीओवीओपीओआरओ द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसमें अनुबन्ध की शर्तानुसार प्रस्तावित समस्त कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक संख्या में मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगाई गई है, जिसके कारण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी के विरुद्ध 10 प्रतिशत L.D. (Liquidity Damage) अध्यारोपित किया गया है।

रायपुरा, मढ़ेपुरा, कोटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना एवं 256 नलकूप आधारित पेयजल योजना के अन्तर्गत कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी मैओ बीओजीओसीओसीओ लिओ, नई दिल्ली द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसमें अनुबन्ध की शर्तानुसार प्रस्तावित समस्त कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक संख्या में मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगाई गई है, जिसके कारण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी के विरुद्ध 10 प्रतिशत L.D. (Liquidity Damage) अध्यारोपित किया गया है।


उक्त के क्रम में सम्बन्धित फर्मों से जिन पाइप पेयजल योजनाओं की अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) JJM-IMIS पोर्टल पर समाप्त हो गई है। उन योजनाओं की नई अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर प्राप्त कर ली गई है।

अतः सम्बन्धित फर्मों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समय सारणी के दृष्टिगत अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) बढ़ाए जाने हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सुनिश्चित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर सम्यक कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की गई।

सभी कार्यो को मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु टी0पी0आई0 एवं जल निगम (ग्रामीण), जालौन को निर्देशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गयी।

यह कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया।

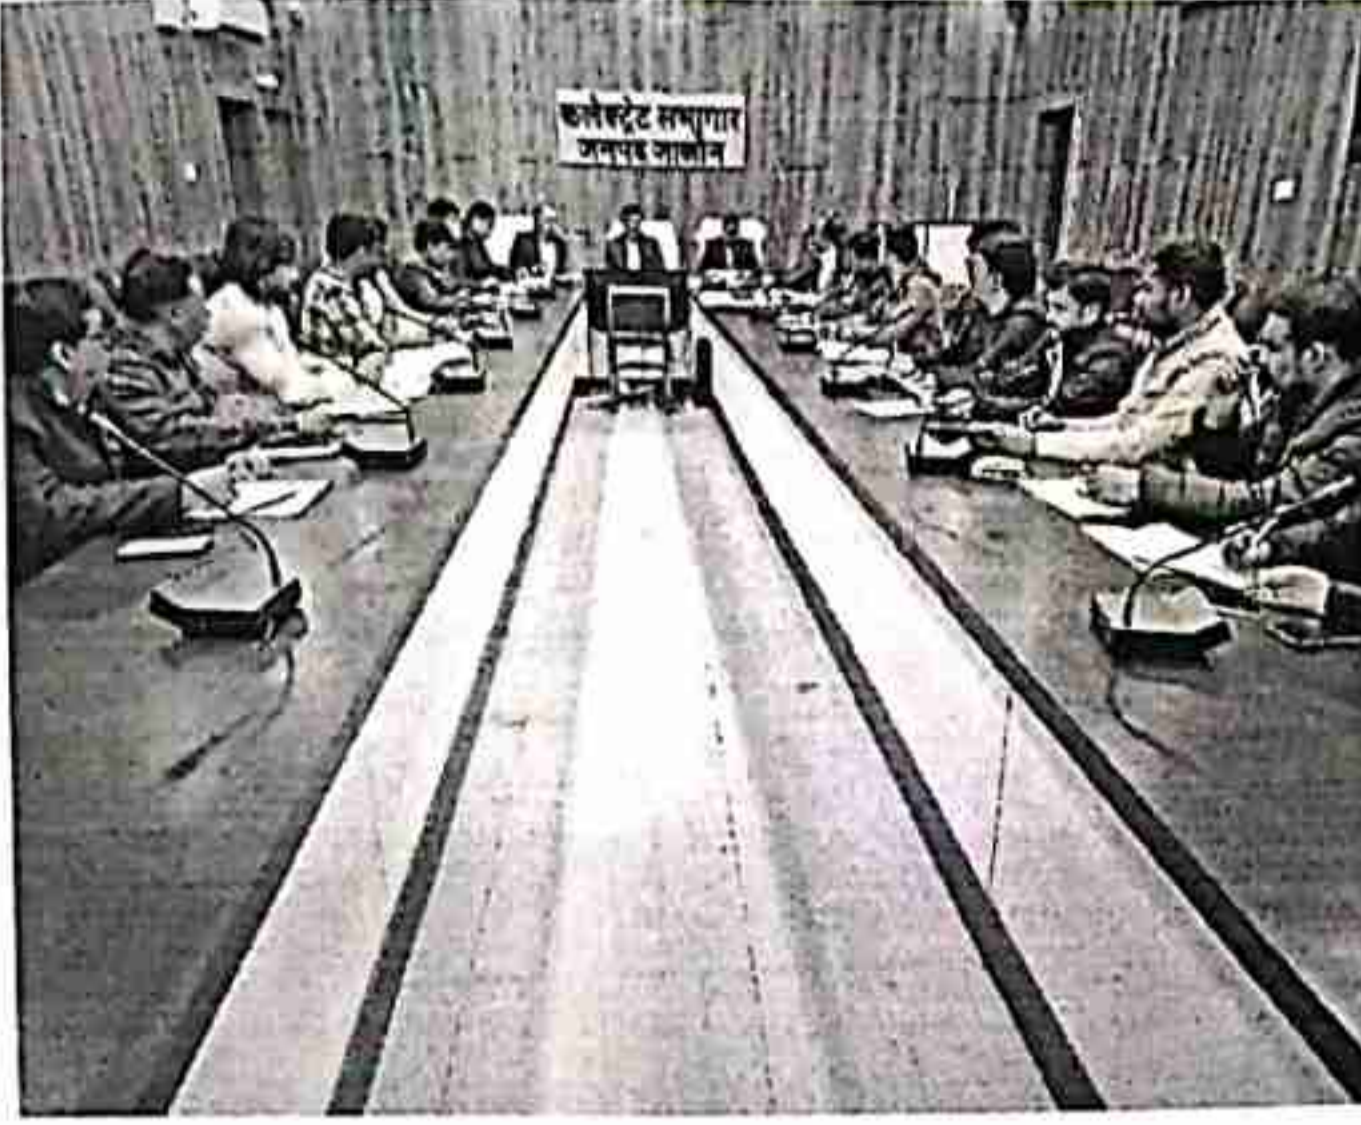

27/12/2025

(प्रमचन्द मौर्य)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

जनपद-जालौन

OC

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक 3138/ M-40/ 29 / /2025-26 दिनांक:- 27 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, नमामिगंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, झांसी मण्डल, झांसी।
3. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, जालौन।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
7. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
8. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स, लि0 हैदराबाद।
9. मै0 बी0जी0सी0सी0, प्रा0लि0, नई दिल्ली।

27/12/2025

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)


जनपद-जालौन

OC

सभी कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु टी0पी0आई0 एवं जल निगम (ग्रामीण), जालौन को निर्देशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गयी।

यह कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया।

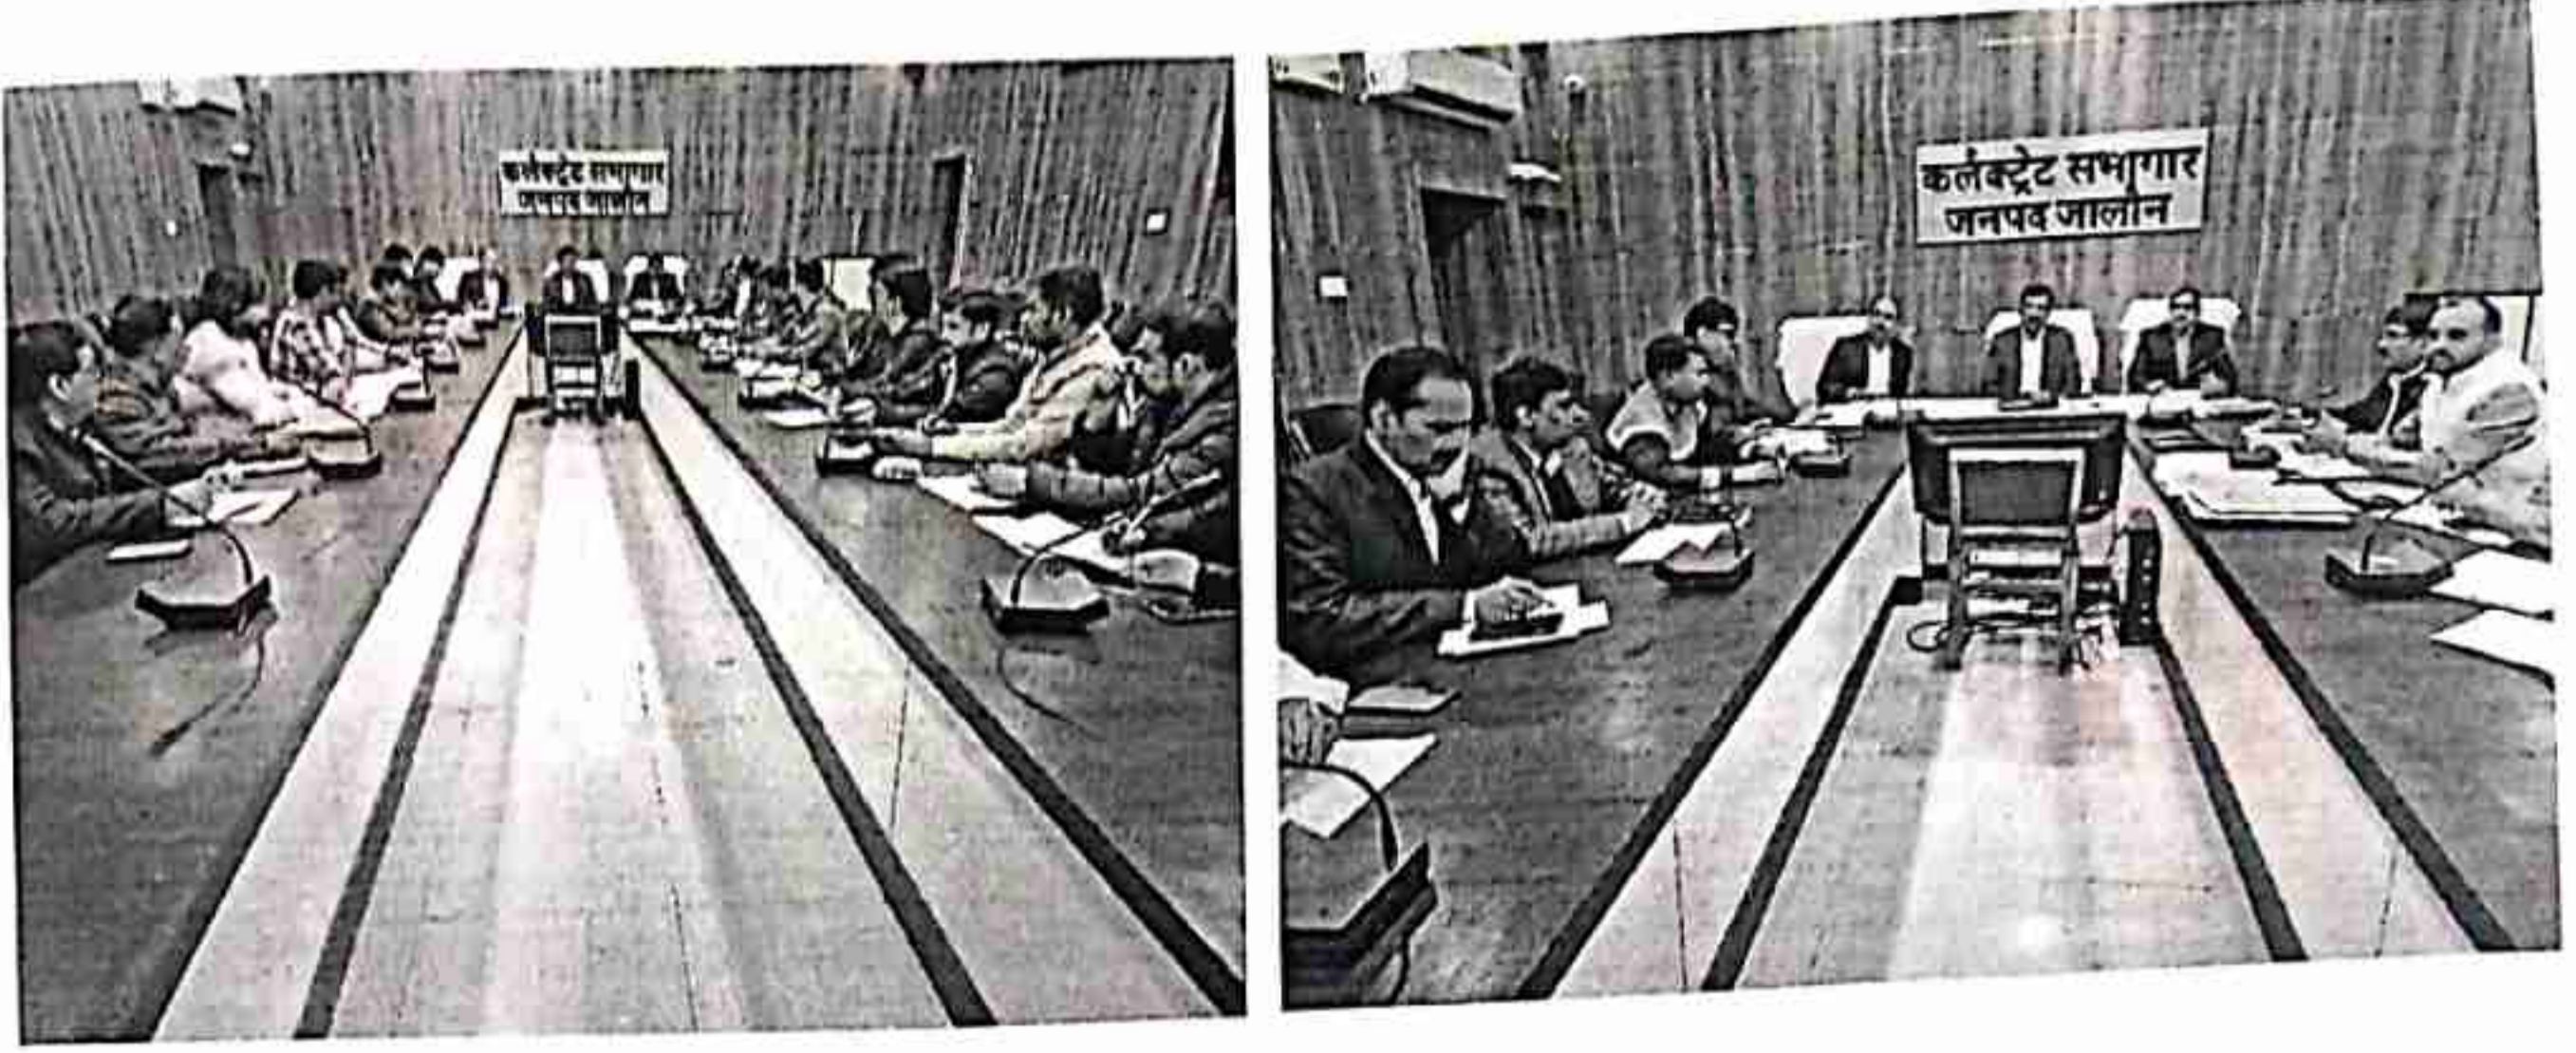


(प्रेमचन्द मौर्य)
अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)
जनपद-जालौन

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक 3138 / M-40 / 29 / /2025-26 दिनांक:- 27 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, नमामिगंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, झांसी मण्डल, झांसी।
3. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, जालौन।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
7. अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
8. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स, लि0 हैदराबाद।
9. मै0 बी0जी0सी0सी0, प्रा0लि0, नई दिल्ली।


अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)
जनपद-जालौन
