

## समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) के तहत दिनांक 12.11.2025 को विद्युत विभाग, जल संस्थान, जज निगम (शहरी) विभाग, जल निगम (ग्रामीण) एवं जल जीवन मिशन टीम के साथ बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही -

1. श्री पंकज तिवारी, जिला सूचना अधिकारी, जालौन।
  2. श्री अंचल कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
  3. श्री महेन्द्र नाथ भारती, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, जालौन।
  4. श्री जीतेन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जालौन।
  5. श्री हिमांशू नेगी, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (शहरी), जालौन।
  6. श्री सोम प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, जालौन।
  7. श्री राम अचल कुरील, ई0ओ0 उरई, जालौन
  8. श्री शिवपूजन सिंह, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
  9. श्री गगन दीक्षित, सहायक अभियन्ता, (वि0/यॉ0), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
  10. श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
  11. श्री गौरव द्विवेदी, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
  12. श्री धर्मेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, जल निगम।
  13. श्री अजय कुमार, अवर अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।
  14. श्री दिनेश कुमार पटेल, अवर अभियन्ता, सी0एन0डी0एस0, जालौन।
  15. श्री कृष्णा राजपूत, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, बी0एल0जी0, जालौन।
  16. श्री के0वी0 सत्यनारायण, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि0, जालौन।
  17. श्री श्याम नारायण दुबे, सोशल एक्सपर्ट, आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि0, जालौन।
  18. श्री आर0के0 सैनी, जी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
  19. श्री प्रमोद बड़क, एस0पी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
  20. श्री नागेश, डी0जी0एम0, जी0वी0पी0आर0 इन्जीनियर्स लि0।
  21. श्री बी0 श्रीनिवास रेड्डी, डी0पी0एम0, जी0वी0पी0आर0 इन्जीनियर्स लि0।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 के द्वारा सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या 32/ई0डी0/2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की प्रगति निम्नवत् है।

### 1-सला ग्राम समूह सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

सला डब्ल्यू0टी0पी0 के अन्तर्गत स्काडा को सभी ओ0एच0टी0 से जोड़ने, क्रियाशील किये जाने एवं इन्टीग्रेशन का कार्य शेष है। WTP पर संचालन एवं अनुरक्षण हेतु Skilled Engineer की कमी है। सभी CWR पर रेलिंग, रैम्प निर्माण, स्लूस वाल्व चेम्बर का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। सभी ओ0एच0टी0 के Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, Water level Indicator का कार्य पूर्ण नहीं है। गृह संयोजन के अन्तर्गत जी0आई0 पाइप क्लेम्पिंग, ग्राउटिंग, MDPE Pipe की Encasing का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 18 टीम के सापेक्ष केवल 05 टीम कार्यरत है। सीडब्ल्यूआर एवं ओ0एच0टी0 के Campus Development एवं एप्रोच रोड का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा बाउण्ड्रीवाल में प्लास्टर, प्वाण्टिंग, गेट लगाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं है। सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण कराए जाने का कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है, आवश्यक 35 टीम के सापेक्ष केवल 08 टीम कार्यरत है। उक्त योजना में HDPE पाइप लाइन को शत प्रतिशत कमिशनिंग किये जाने, गैप क्लोजिंग किये जाने, स्लूश वाल्व अधिष्ठापन किये जाने का कार्य, रोड रेस्टोरेशन, गृह संयोजन आदि कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक 750 मैनपावर के सापेक्ष केवल 215 कार्यरत है।



श्री नागेश, पी०एम०, जी०वी०पी०आर० इन्जीनियर्स लि० द्वारा 15 दिसम्बर, 2025 तक सभी ग्रामों को हर घर जल सत्यापित कराते हुये शत प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। कान्ट्रेक्टिंग एजेन्सी को अवशेष ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य 30 नवम्बर, 2025 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही अपेक्षित-अधिशायी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन/अधिशायी अभियन्ता (वि०/यॉ०), जल निगम, ग्रामीण, झाँसी/श्री नागेश, पी०एम०, जी०वी०पी०आर० इन्जीनियर्स लि०)

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी०जी०सी०सी० द्वारा अनुबन्ध संख्या 35/ई०डी०/2020-21 के सापेक्ष कराये जा रहे सतही स्रोत आधारित रायपुरा, मढ़ेपुरा, कोटा मुस्तकिल एवं 256 मूजल आधारित पेयजल योजनाओं की प्रगति निम्नवत पाई गयी-

### 1-रायपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

इन्टेकवेल में JJM Logo, EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। डब्ल्यू०टी०पी० में EOT Crane एवं स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में फ्लोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। 17 OHTके सापेक्ष सभी में Down Pipe लगाये जाने का कार्य, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, वाटर लेवल इंडिकेटर का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। सभी सी०डब्ल्यू०आर० में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ०एच०टी० में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर०टी०यू० रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DIपाइप लाइन में 18 गैप है, जिससे सी०डब्ल्यू०आर० एवं अवर जलाशय को Functional किये जाने का कार्य बाधित हो रहा है। 83 ग्राम के सापेक्ष मात्र 32 ग्राम में कमिनिंग का कार्य किया गया है किन्तु किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिससे जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है। इन्टेकवेल, डब्ल्यू०टी०पी०, सी०डब्ल्यू०आर० एवं अवर जलाशय के अन्तर्गत शेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु, ओएचटी को फंक्शनल किये जाने हेतु, गैप क्लोजिंग, स्लूस वाल्व अधिष्ठापन, कैनल क्रॉसिंग, कमिनिंग, पैनल अधिष्ठापन कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक 630 मैनुपावर के सापेक्ष मात्र 58 कार्यरत है।

कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी०जी०सी०सी० को सभी समीक्षा बैठकों में लगातार दिये जा रहे निर्देशों के बावजूद कार्य में कोई प्रगति नहीं है, कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है एवं कार्य में प्रगति लाने एवं कार्य को पूर्ण कराने का बार-बार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है।

(कार्यवाही अपेक्षित-अधिशायी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन/अधिशायी अभियन्ता (वि०/यॉ०), जल निगम, ग्रामीण, झाँसी/ श्री राजकुमार सैनी, पी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०)

### 2-कोटा मु० सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

इन्टेकवेल में पैनल अधिष्ठापन, EOT Crane, SCADA का कार्य शेष है। EOT Crane एवं स्काडा की सामग्री वर्तमान तक कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी बी०जी०सी०सी० द्वारा क्रय नहीं की गयी है। डब्ल्यू०टी०पी० में प्लान्टेशन का कार्य तथा स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत 01 सी०डब्ल्यू०आर० में पैनल अधिष्ठापन, केबल ट्रे लगाये जाने एवं केबल विछाये जाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सभी ओ०एच०टी० के Railing, Floor एवं Valve Chamber, Man hole cover, Water level Indicator का कार्य शेष है। सभी सी०डब्ल्यू०आर० में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ०एच०टी० में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर०टी०यू० रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DIपाइप लाइन में 88 गैप है। वर्तमान तक 77 ग्राम के सापेक्ष केवल 04 ग्राम में कमिनिंग की गयी है तथा जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। शेष अवर जलाशय का कार्य, ओएचटी को फंक्शनल किये जाने हेतु, गैप क्लोजिंग, स्लूस वाल्व अधिष्ठापन, कैनल क्रॉसिंग, कमिनिंग, पम्प एवं पैनल अधिष्ठापन कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक 650 मैनुपावर के सापेक्ष केवल 32 कार्यरत है।



### 3- मढ़ेपुरा सतही जल आधारित पाइप पेयजल योजना-

इन्टेकवेल मे EOT Crane, SCADA, JIM Logo एवं पेन्टिंग का कार्य शेष है। डब्ल्यू0टी0पी0 में स्काडा अधिष्ठापन का कार्य शेष है। योजना के तहत सभी पम्प हाउस में फ्लोमीटर, रैम्प, दरवाजे एवं खिड़की, Railing, Air Vent में mesh लगाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। सभी 12 ओ0एच0टी0 के Down Pipe, Railing, Floor एवं Valve Chamber, Mane hole cover, Water level Indicator का कार्य शेष है। सभी सी0डब्ल्यू0आर0 में क्लोरिनेशन हेतु क्लोरीन रूम का निर्माण कार्य एवं सभी ओ0एच0टी0 में स्काडा अधिष्ठापन हेतु आर0टी0यू0 रूम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। DI पाइप लाइन में 55 गैप है। 69 ग्राम के सापेक्ष केवल 15 ग्राम में कमिश्निंग का कार्य किया गया है किन्तु किसी भी ग्राम में शतप्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिससे ग्रामों को हर घर जल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। शेष अवर जलाशय का कार्य, ओएचटी को फंक्शनल किये जाने हेतु, गैप क्लोजिंग, स्लूस वाल्व अधिष्ठापन, कैनल क्रॉसिंग, कमिश्निंग, पम्प एवं पैनल अधिष्ठापन कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक 615 मैनपावर के सापेक्ष केवल 21 कार्यरत है।

कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 को सभी समीक्षा बैठकों में लगातार दिये जा रहे निर्देशों के बावजूद कार्य में कोई प्रगति नहीं है, कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है एवं बार-बार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है।

(कार्यवाही अपेक्षित-अधिशायी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन/अधिशायी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम, ग्रामीण, झाँसी/ अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय जालौन /श्री राजकुमार सैनी, पी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0)

### 4- 256 नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना-

256 नग नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 205 पम्प अधिष्ठापन का कार्य किया गया है, परन्तु स्टार्टर एवं पैनल अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है, जिससे ग्रामों को कमिश्निंग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 255 OHT के सापेक्ष 08 ओ0एच0टी0 में Raft Foundation हेतु पी0सी0सी0 का कार्य नहीं किया गया है। सभी ओएचटी में Stairs, 20 mm dia GI Pipe Railing, Floor एवं Valve Chamber बनाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं है तथा ओएचटी को फंक्शनल किये जाने हेतु मात्र एक टीम लगाई गई है, जिससे ग्राम के सभी घरों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। 256 पम्प हाउस के सापेक्ष 08 पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा दरवाजे, खिड़की, एप्रन, कट आउट, बाईपास चैम्बर निर्माण का कार्य एवं क्लोरीन डोजिंग सिस्टम, पेन्टिंग एवं वोल्टेज स्टेप लाईजर, गर्डर, पैनल लगाये जाने एवं अन्य वि0/यॉ0 कार्य पूर्ण नहीं हैं। 255 बाउन्ड्रीवॉल के सापेक्ष केवल 233 में ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण किया गया है परन्तु प्लास्टर एवं प्वांटिंग का कार्य पूर्ण नहीं है। 255 स्टॉफ क्वार्टर के सापेक्ष केवल 248 में Slab casting का कार्य किया गया है, परन्तु आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लम्बिंग का कार्य पूर्ण नहीं है।



256 नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाये जाने, सड़क पुर्ननिर्माण कार्य, कमिश्निंग, गृह संयोजन आदि कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक 1120 मैनपावर के सापेक्ष केवल 165 कार्यरत है। योजना के अन्तर्गत कमिश्निंग हेतु आवश्यक 18 टीम के सापेक्ष 05 टीम, स्लूस वाल्व अधिष्ठापन हेतु आवश्यक 08 टीम के सापेक्ष 02 टीम एवं विद्युत यांत्रिक कार्य पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक 18 टीम के सापेक्ष 02 टीम कार्यरत हैं।

कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी बी0जी0सी0सी0 द्वारा पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों के सापेक्ष इण्टरलॉकिंग एवं खड़न्जा रोड़ पुनर्निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः एजेन्सी को 30 नवम्बर, 2025 तक सभी ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कॉन्ट्रैक्टिंग एजेन्सी जी0वी0पी0आर0 व बी0जी0सी0सी0 के प्रतिनिधियों को सभी ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने, स्काडा अधिष्ठापन, शेष राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली की ज्वाइंटिंग, गृह जल संयोजन के कार्य एवं नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किये जाने के कार्यों तथा सभी ग्रामों को "हर घर जल" कराये जाने हेतु आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये अनुबन्ध की शर्तानुसार यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

±

सभी कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु टी0पी0आई0 एवं जल निगम (ग्रामीण), जालौन को निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में सभी घरों में पेयजल आपूर्ति हो रही है, उन्हें "हर घर जल" कराया जायें तथा "हर घर जल" प्रमाणित ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

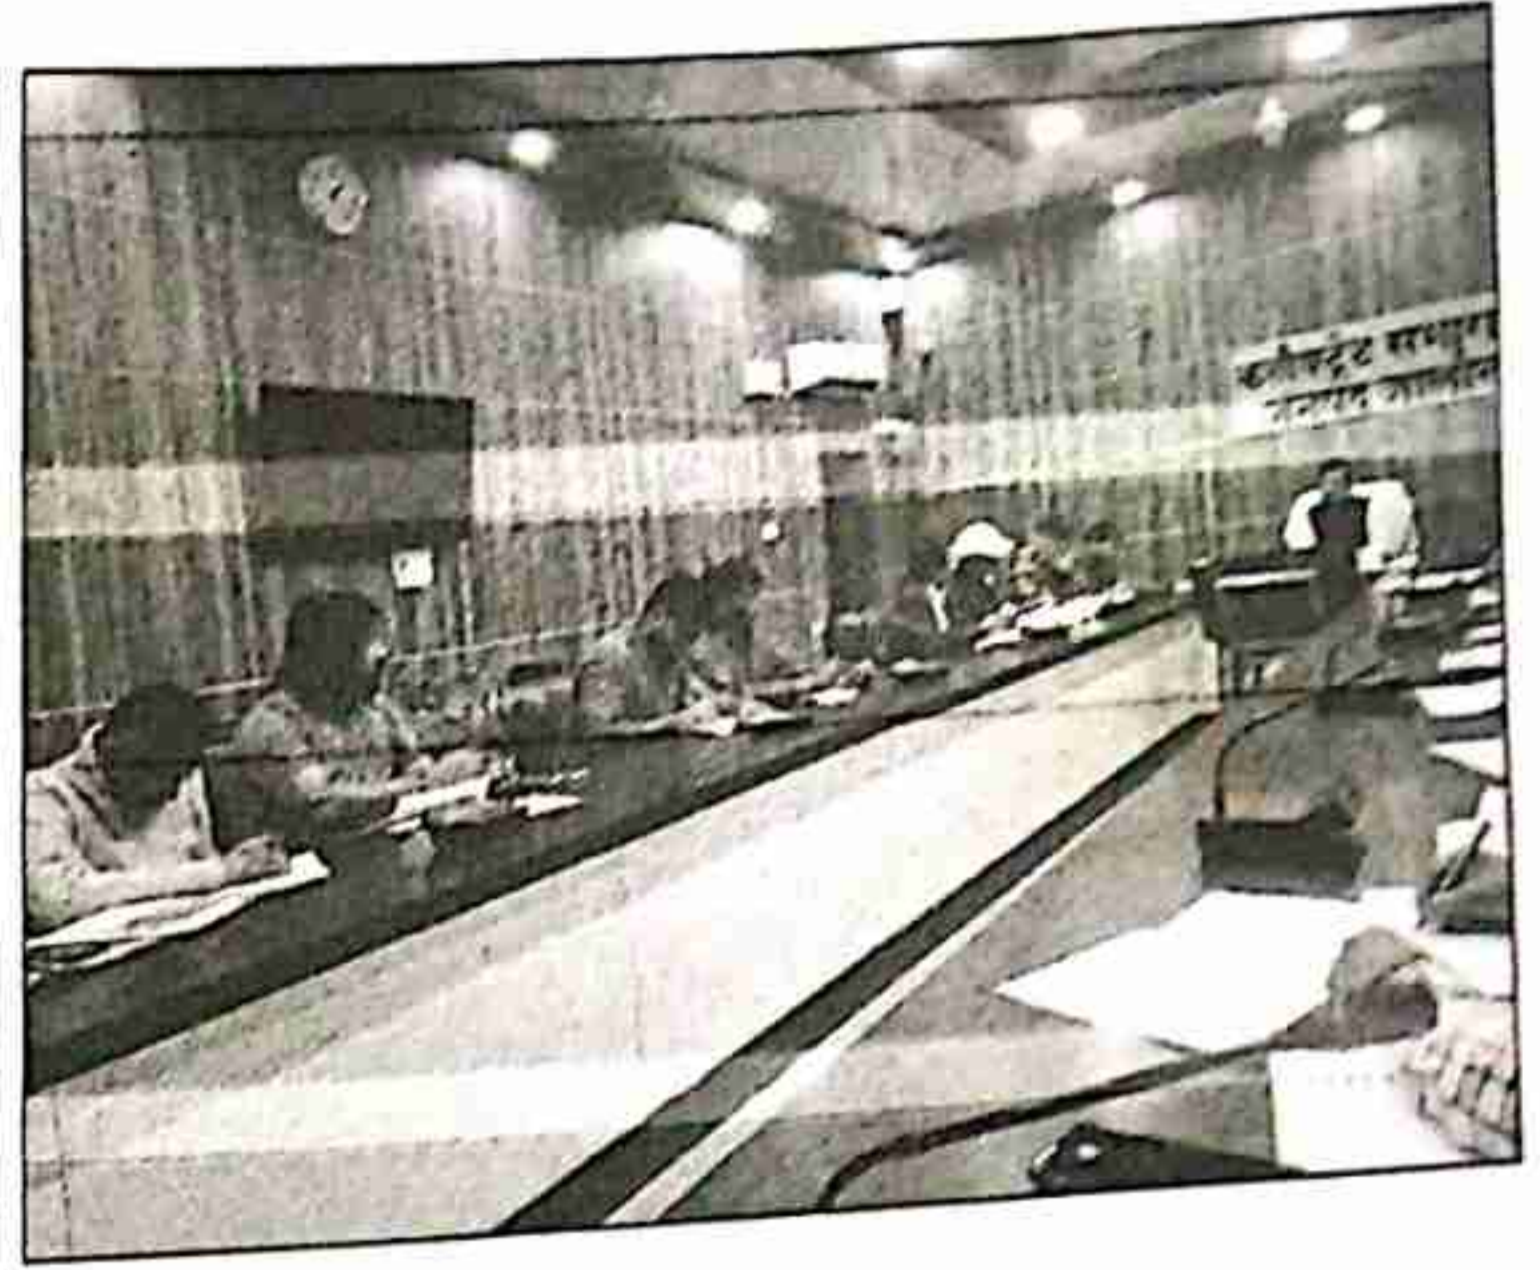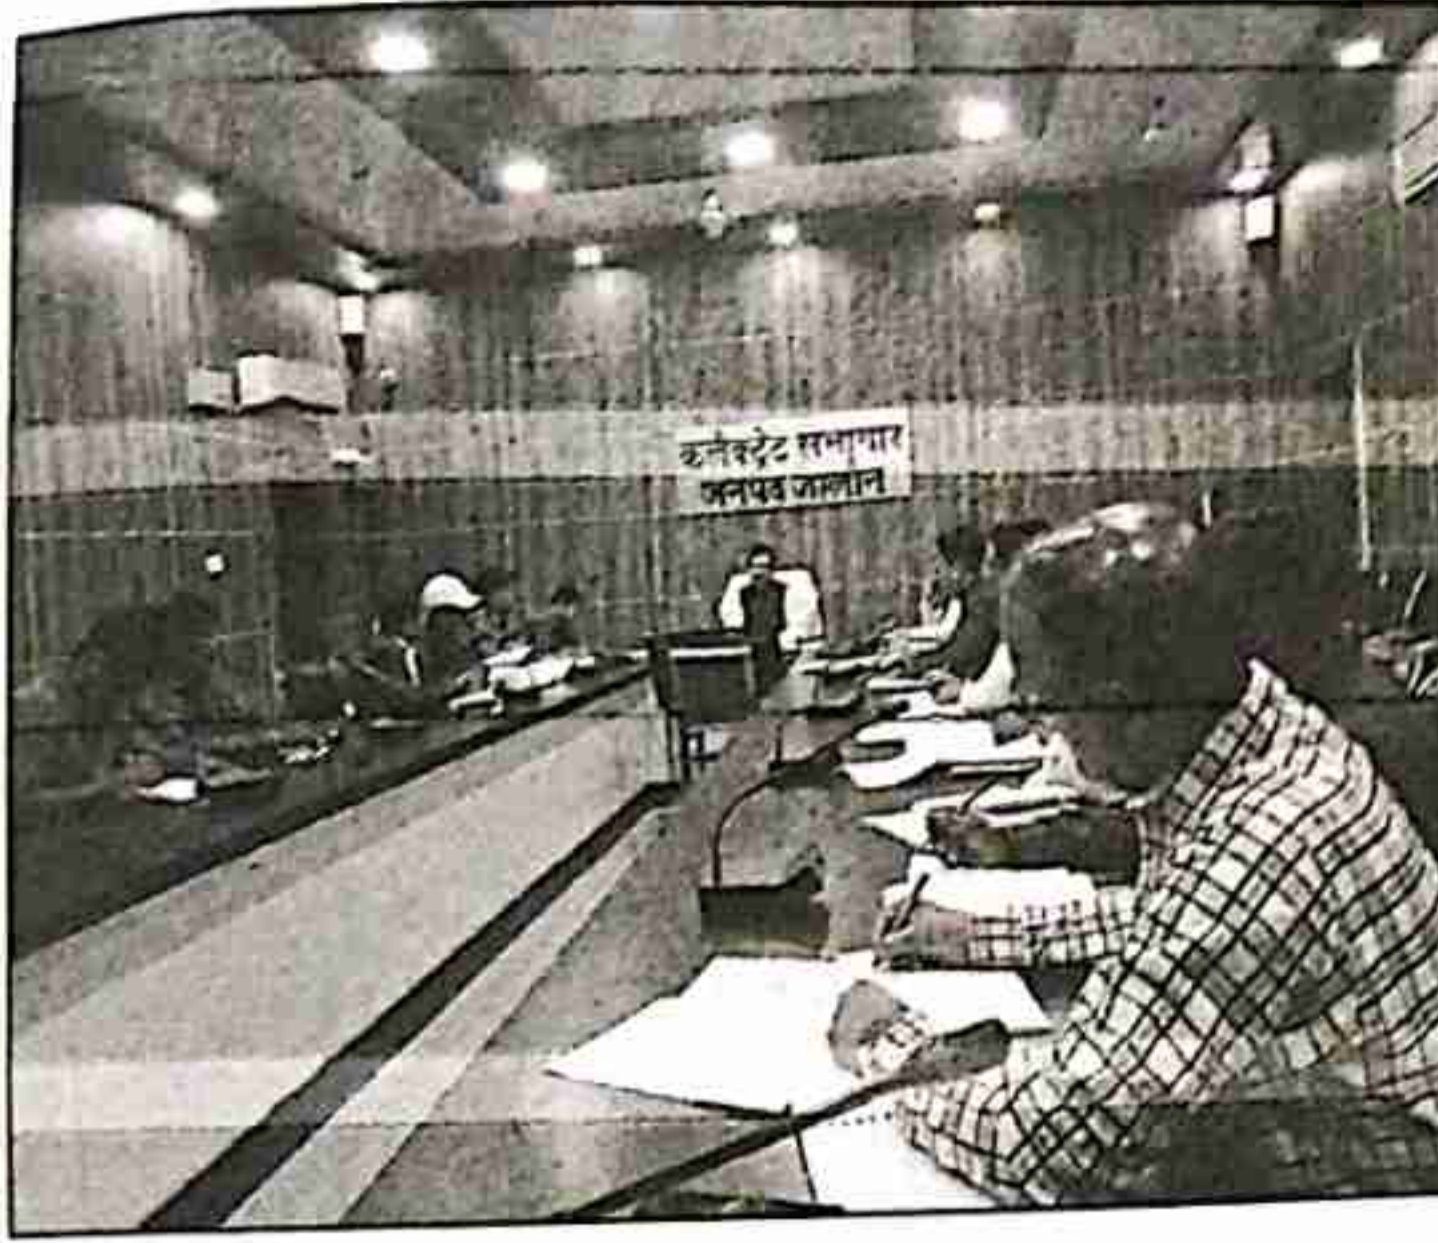

बैठक की कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी।

*[Signature]*  
17/11/2025  
अपर जिलाधिकारी  
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)  
जनपद-जालौन  
o/c ✗

## कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।


पत्रांक 2882/M-40 / / /2025-26 दिनांक:- ...1.8 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. आयुक्त महोदय, झांसी मण्डल, झांसी।
4. जिलाधिकारी महादेय, जालौन।
5. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत हाईडिल, जालौन।
6. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
7. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
8. टीम लीडर, पी0एम0सी, आरवी एसोसिएट्स-जालौन/लखनऊ।
9. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, बी0एल0जी0-जालौन।
10. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स, लि0 हैदराबाद।
11. मै0 बी0जी0सी0सी0, प्रा0लि0, नई दिल्ली।

*[Signature]*  
17/11/2025  
अपर जिलाधिकारी  
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)  
जनपद-जालौन  
o/c ✗

सभी कार्यों को मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु टी0पी0आई0 एवं जल निगम (ग्रामीण), जालौन को निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में सभी घरों में पेयजल आपूर्ति हो रही है, उन्हें "हर घर जल" कराया जायें तथा "हर घर जल" प्रमाणित ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

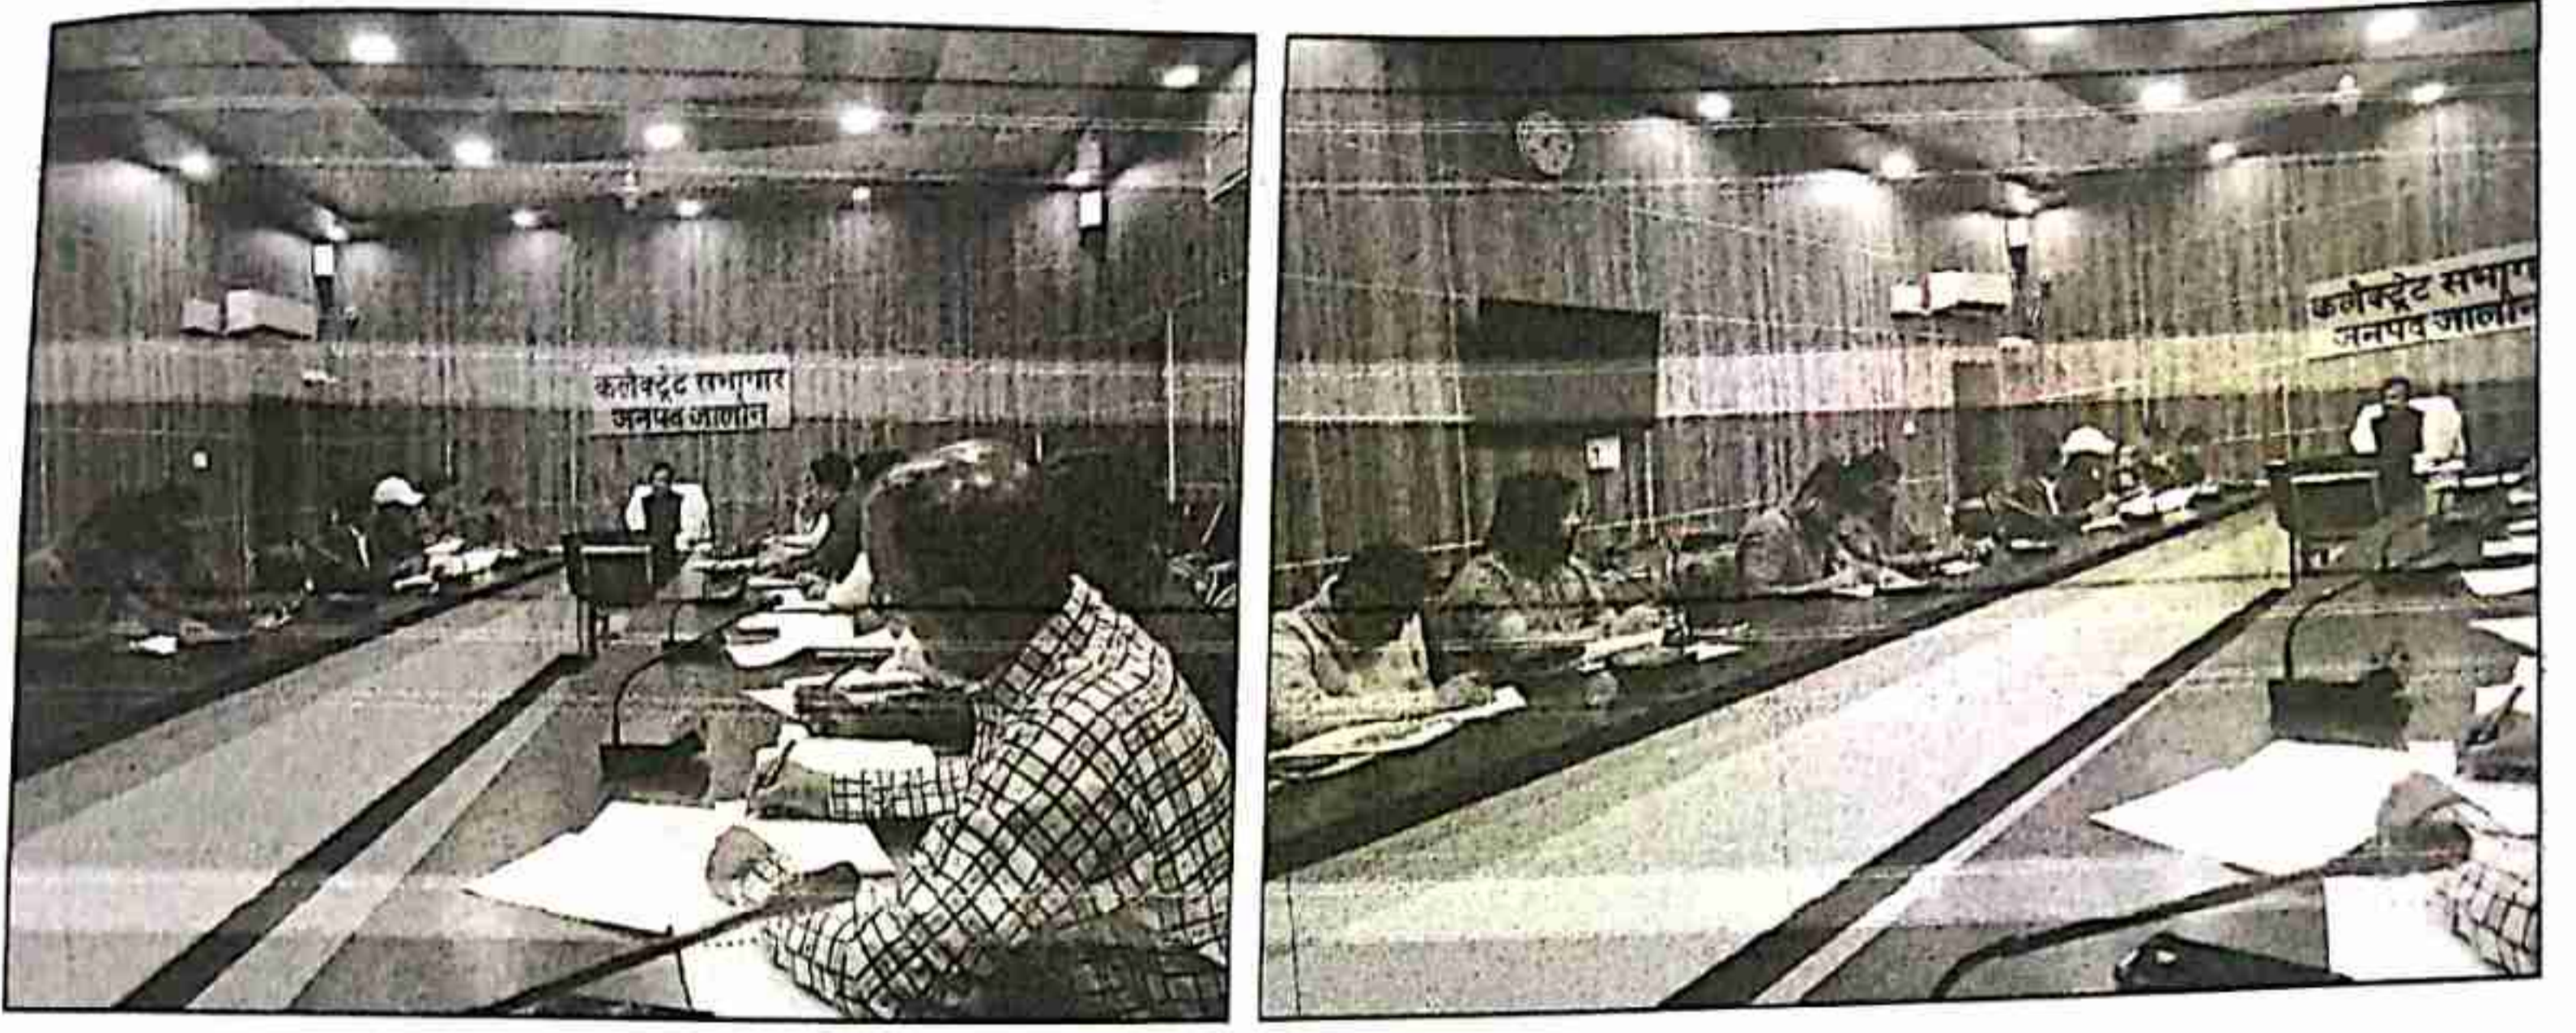

बैठक की कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी।

अपर जिलाधिकारी  
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)  
जनपद-जालौन

## कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक / / / / 2025-26 दिनांक:- ..... नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. आयुक्त महोदय, झांसी मण्डल, झांसी।
4. जिलाधिकारी महादेय, जालौन।
5. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत हाईडिल, जालौन।
6. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
7. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
8. टीम लीडर, पी0एम0सी, आरवी एसोसिएट्स-जालौन/लखनऊ।
9. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, बी0एल0जी0-जालौन।
10. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स, लि0 हैदराबाद।
11. मै0 बी0जी0सी0सी0, प्रा0लि0, नई दिल्ली।

17/11/2025  
अपर जिलाधिकारी  
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)  
जनपद-जालौन
