


**“जल जीवन मिशन” कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, रायबरेली की दिनांक
14.07.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

“जल जीवन मिशन” कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद रायबरेली में पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया -

1.	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, रायबरेली।
2.	मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य
3.	जिला विकास अधिकारी	-	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य
5.	जिला पंचायत राज अधिकारी	-	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी	-	सदस्य
7.	जिला मुख्य चिकित्साधिकारी	-	सदस्य
8.	अधि०अभि०, (वि०/यॉ०), जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ	-	सदस्य
9.	परियोजना प्रबंधक, मेसर्स एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद	-	कार्यदायी संस्था
10.	परियोजना प्रबंधक, मेसर्स वी०टी०एल० लि०, नोएडा	-	कार्यदायी संस्था
11.	जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, रायबरेली	-	अनुश्रवण इकाई।
12.	उप परियोजना प्रबंधक, मेसर्स सेन्सिस टेक, रायबरेली	-	टी०पी०आई०ए०।
13.	अधि०अभि०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली	-	सदस्य सचिव

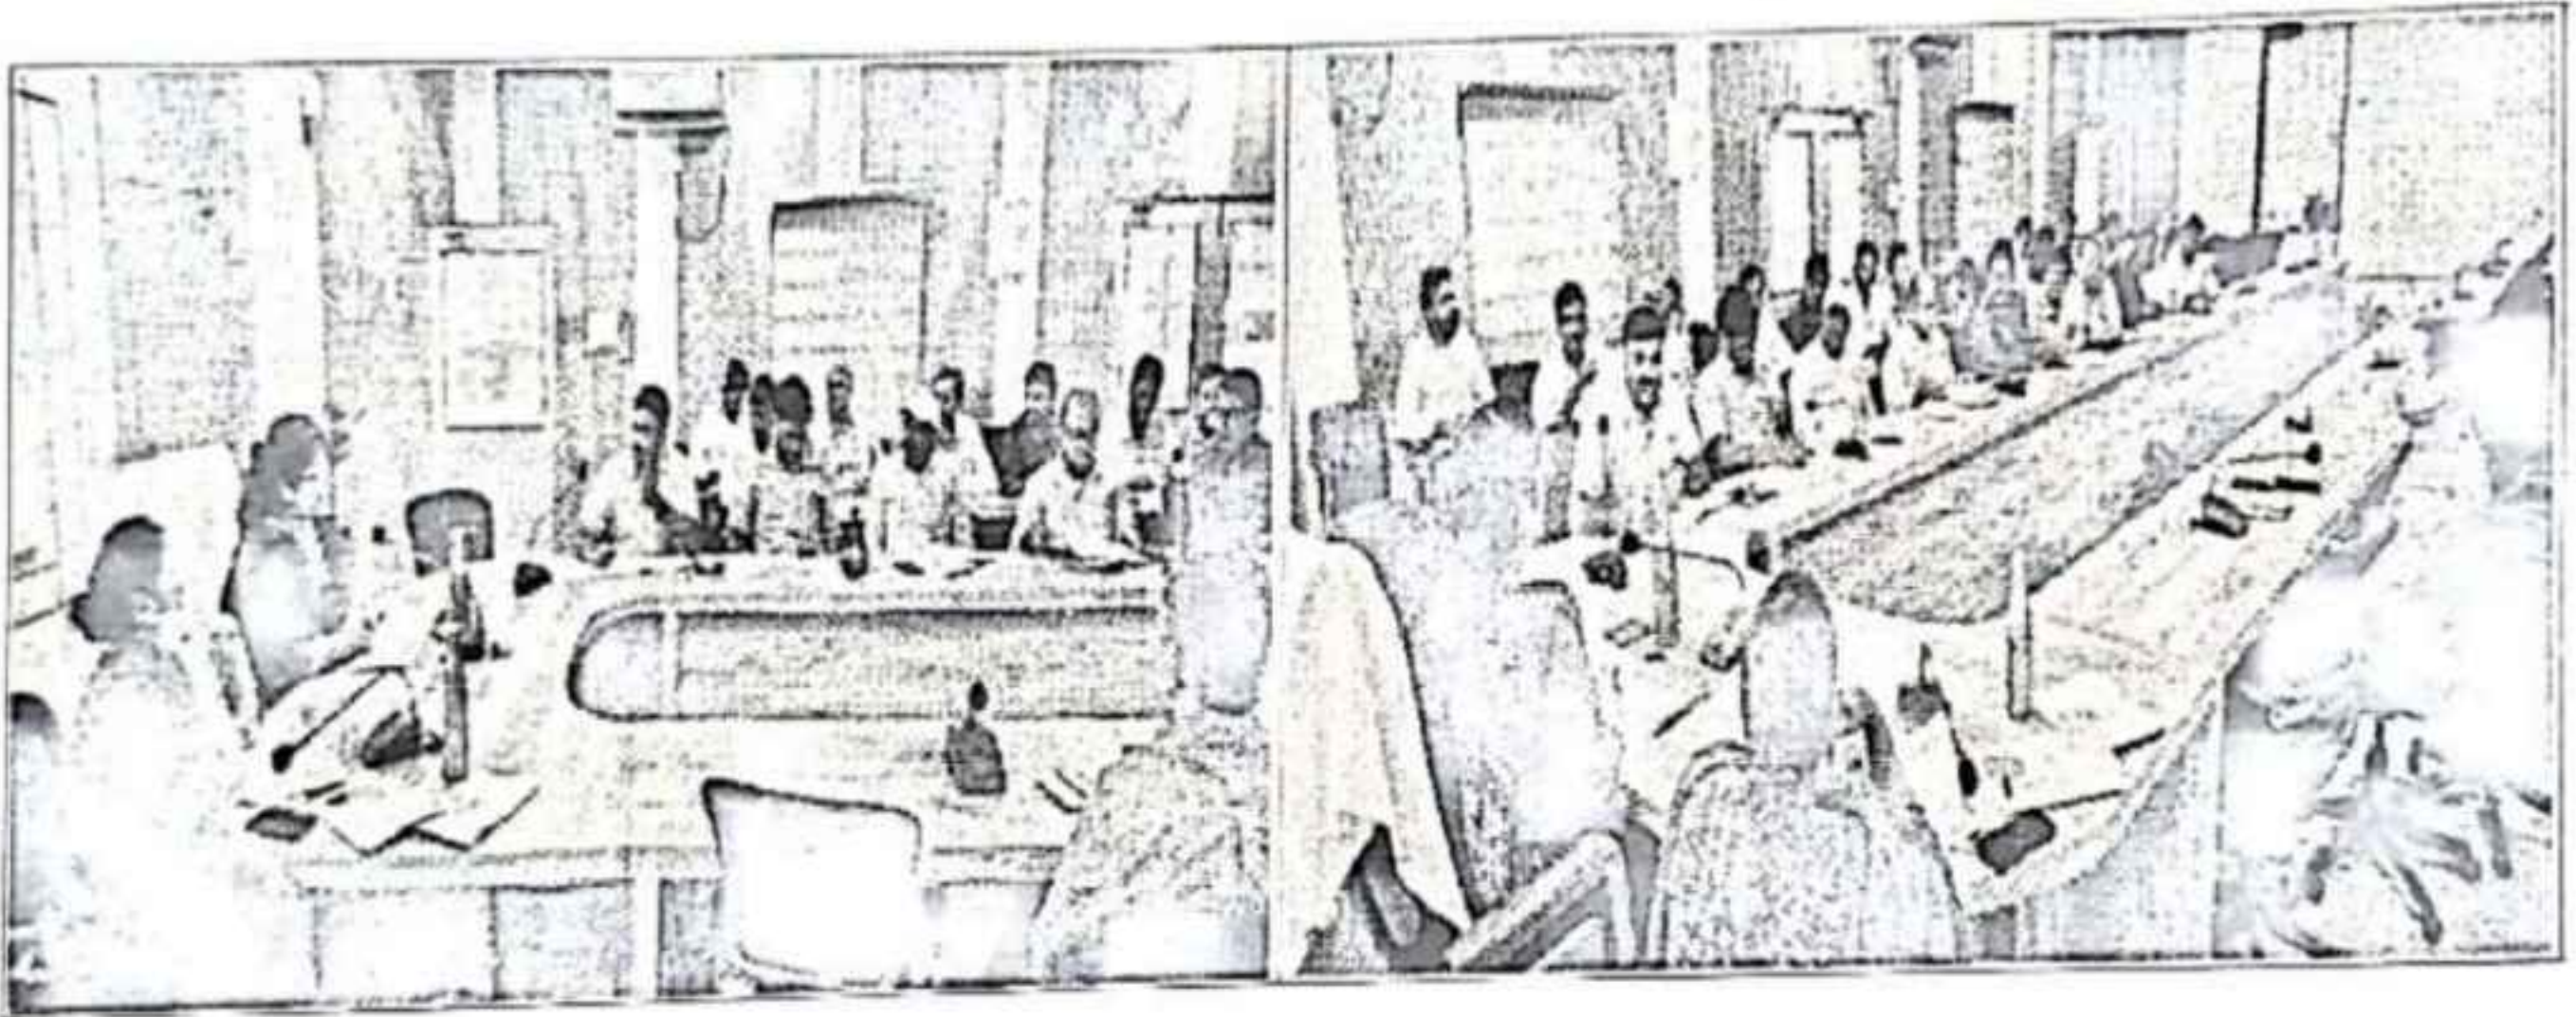

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर वार्ता की गयी :-

1- भूमि की स्थिति :-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे० एन०सी०सी० लि० को 434 नग पेयजल योजनाओं के 440 ग्राम पंचायतों के 675 राजस्व ग्रामों में कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 438 ग्राम पंचायतों में जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन करा लिया गया है। 01 नग ग्राम पंचायतों में जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन कराया जाना शेष है तथा 20 पेयजल योजनाओं पर बोस्वेल फेल होने के उपरान्त भूमि अप्राप्त है। उक्त योजनाओं पर अन्यत्र भूमि चिन्हाकन का कार्य पूर्ण कराते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जाना लक्षित है एवं मे० वी०टी०एल० को 213 नग पेयजल योजनाओं के 232 नग ग्राम पंचायत, 361 नग राजस्व ग्राम पर कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 230 ग्राम पंचायतों में जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन करा लिया गया है। 02 नग ग्राम पंचायतों पर जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन कराया जाना शेष है एवं उ०प्र०

जल निगम (ग्रामीण) को पुर्नगठन पेयजल योजनाओं हेतु 240 नग ग्राम पंचायत, 432 नग राजस्व ग्राम पर कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 236 ग्राम पंचायतों में जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हांकन करा लिया गया है। 02 पेयजल योजनाओं पर भूमि प्राप्त होने के उपरान्त नलकूप फेल है। उक्त योजनाओं पर अन्यत्र भूमि चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कराते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जाना लक्षित है। जिरा क्रम में अध्यक्ष महोदया द्वारा जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के पेयजल परिसर हेतु भूमि चिन्हांकन शीघ्रातिशीघ्र कराना सुनिश्चित करें। जिससे जल जीवन मिशन के कार्यों को ससमय पूर्ण कराया जा सके। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अवशेष भूमि का चिन्हांकन एवं पुर्नग्रहण कराना सुनिश्चित करें। जिससे भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के कार्यों को ससमय पूर्ण कर लाभार्थियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किया जा सके।

2. कार्य की प्रगति समीक्षा :-

1- फेज-2 मे० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद-

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे० एन०सी०सी० को 440 ग्राम पंचायत, 675 राजस्व ग्रामों को पेयजल योजनाओं के माध्यम से हर घर जल से आच्छादित करने हेतु कार्य कराया जाना है। जिसकी भौतिक प्रगति निम्नवत है-

क्र०सं०	मद	मात्रा	लक्ष्य	पूर्ण दिनांक 16.06.2026 तक	शेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	16
1	नलकूप	संख्या	444	410	34	14 भूमि प्राप्त (10 बोरवेल, 01 नई भूमि) जिसमें से 02 योजनाओं पर Electrical Resistivity Tomography Test कराने के उपरान्त असफल पाये गए। शेष 07 योजनाओं पर टेस्ट कराया जाना प्रस्तावित है तथा 03 योजनाओं पर विवाद निस्तारित 24 पेयजल योजनाओं पर (22 बोरवेल असफल, 02 नई भूमि) अप्राप्त।
2	पम्प हाउस	योजना	444	396	48	विगत माह 08 पम्पहाउस पूर्ण। भूमि उपलब्ध न होने के कारण 33 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 06 कार्य प्रगति पर
3	बाउण्ड्रीवॉल	योजना	444	389	48	विगत माह 07 बाउण्ड्रीवॉल पूर्ण। बोरवेल समस्या होने के कारण 33 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 11 कार्य प्रगति पर है।
4	शिरोपरि जलाशय पूर्णतया पूर्ण	योजना	438	256	182	विगत माह 16 पूर्ण। 00-25%- 04 26-50%- 31 51-75%- 37 76-99%- 77 100%- 256 33 योजनाओं में बोरवेल समस्या के कारण योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है।
5	सोलर	योजना	444	395	49	विगत माह 07 पूर्ण। 12 कार्य प्रगति पर, 33 योजनाओं में बोरवेल समस्या के कारण सोलर स्थापना की योजना नहीं बनाई गयी है।

6	गृह नल संगोजन	संख्या	216764	211092	5672	बोरवेल समस्या होने के कारण 5672 कनेक्शन लंबित है।
7	वितरण प्रणाली	कि०मी०	6199.07	5806.00	392.2	विगत माह 18.6 किमी. बिछाई गई। 33 योजनाओं में बोरवेल समस्या के कारण 282 किमी पाइप लाइन बिछाने का कार्य लंबित है तथा विभिन्न विभागों से एन०ओ०सी० लंबित/प्रक्रियाधीन होने के कारण 32 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य लंबित है।
8	रोड पुनर्स्थापन	कि०मी०	1839.08	1816.59	22.49	विगत माह 8.25 पुनर्स्थापन किया गया। अब तक 30.74 कि०मी० कार्य मोटरेबल अवस्था में पूर्ण किया जा चुका है।
9	नियमित जलापूर्ति	राजस्व ग्राम	674	559	115	33 पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 60 ग्रामों में बोरवेल फेल होने के कारण बाधित।
10	संचालन एवं अनुरक्षण	योजना	433	126	307	139 पेयजल योजनाएं ट्रायल रन में हैं।

उपरोक्त प्रगति के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि योजनाओं की प्रगति धीमी है जिसमें तेजी लाते हुए कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कराया जाए तथा पम्प हाउस, शिरोपरि जलाशय एवं सोलर प्लान्ट की प्रगति पर सुधार की आवश्यकता है एवं 76-99 प्रतिशत शिरोपरि जलाशय को शत-प्रतिशत पूर्ण करना तथा वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु तोड़ी/डिस्मेन्टल सड़को को तत्काल बैक फिल करना सुनिश्चित करें जिससे आमजनमानस को आवागमन में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े तथा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में शीघ्रातिशीघ्र सम्मिलित करे साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त पेयजल योजनाओं पर नियमित रूप से जल परीक्षण कराते हुए लाभार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जहाँ-जहाँ जल की गुणवत्ता को लेकर संदेह या आवश्यकता हो वहाँ प्राथमिकता के आधार पर जल परीक्षण कराया जाए जिससे आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही किया जा सके। समिति द्वारा कार्यदायी संस्था को प्रत्येक घटक पर मैनपॉवर व मशीनरी उपलब्ध कराते हुए साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर कार्य कराते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य कराना सुनिश्चित करें। जिससे जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को ससमय पूर्ण किया जा सकें।

II- फेज-3 मे० वी०टी०एल०, नोएडा-

अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे० वी०टी०एल० लि० को 242 ग्राम पंचायत, 361 राजस्व ग्रामों को पेयजल योजनाओं के माध्यम से हर घर जल से आच्छादित करने हेतु कार्य कराया जाना है। जिसकी भौतिक प्रगति निम्नवत है-

क्र०सं०	मद	मात्रा	लक्ष्य	पूर्ण दिनांक 13.07.2026 तक	शेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	16
1	नलकूप	योजना	239	234	5	02 पेयजल योजनाओं पर भूमि प्राप्त ERT कराया जाना प्रस्तावित है। 02 पेयजल योजनाओं पर नई भूमि अप्राप्त, 01 पेयजल योजना पर बोरवेल असफल होने के उपरान्त भूमि अप्राप्त।
2	पम्प हाउस	योजना	239	233	6	विगत माह 02 पम्पहाउस पूर्ण 03 पेयजल योजनाओं पर भूमि अप्राप्त।
3	बाउण्ड्रीवॉल	योजना	239	233	6	विगत माह 01 बाउण्ड्रीवॉल पूर्ण। 03 पेयजल योजनाओं पर भूमि अप्राप्त।

4	शिरोपरि जलाशय पूर्णतया पूर्ण	योजना	216	102	114	विगत माह 27 पूर्ण। 0-25%- 03 26-50%- 05 51-75%- 60 76-99%- 42 100%- 102 02 योजनाओं में भूमि अप्राप्त, 01 पेयजल योजनाओं पर भूमि विवादित
5	सोलर	योजना	239	232	7	विगत माह 01 पूर्ण। 03 पेयजल योजनाओं पर भूमि अप्राप्त,
6	गृह नल संयोजन	संख्या	102644	98350	4294	विगत माह 1355 पूर्ण। 03 पेयजल योजनाओं पर भूमि अप्राप्त जिसमें 794 गृह नल संयोजन प्रभावित
7	वितरण प्रणाली	कि०मी०	3428	3351	77	विगत माह 06 किमी. बिछाई गई। 36 किमी. भूमि अप्राप्त एवं क्रासिंग के कारण लंबित।
8	रोड पुनर्स्थापन	कि०मी०	851	810	41	शेष मोटरबल
9	नियमित जलापूर्ति	राजस्व ग्राम	361	266	95	विगत माह 09 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गई। 03 पेयजल योजनाओं पर भूमि अप्राप्त
10	संचालन एवं अनुरक्षण	योजना	212	52	160	विगत माह 03 पेयजल योजनाएं संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित हुई। 30 पेयजल योजनाएं ट्रायल रन में।

उपरोक्त प्रगति के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि योजनाओं की प्रगति धीमी है जिसमें तेजी लाते हुए कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कराया जाए तथा पम्प हाउस, शिरोपरि जलाशय तथा सोलर प्लान्ट की प्रगति पर सुधार की आवश्यकता है एवं 76-99 प्रतिशत शिरोपरि जलाशय को शत-प्रतिशत पूर्ण करना तथा वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु तोड़ी/डिस्मेन्टल सड़को को तत्काल बैक फिल करना सुनिश्चित करें जिससे आमजनमानस को आवागमन में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े तथा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में शीघ्रताशीघ्र सम्मिलित करे साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त पेयजल योजनाओं पर नियमित रूप से जल परीक्षण कराते हुए लाभार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जहाँ-जहाँ जल की गुणवत्ता को लेकर संदेह या आवश्यकता हो वहाँ प्राथमिकता के आधार पर जल परीक्षण कराया जाए जिससे आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही किया जा सके। समिति द्वारा कार्यदायी संस्था को प्रत्येक घटक पर मैनपॉवर व मशीनरी उपलब्ध कराते हुए साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर कार्य कराते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य कराना सुनिश्चित करें। जिससे जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को ससमय पूर्ण किया जा सकें।

III- उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली की प्रगति का विवरण:-

अधिसासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली को 240 ग्राम पंचायत, 425 राजस्व ग्रामों को पुर्नगठन पेयजल योजनाओं के माध्यम से हर घर जल से आच्छादित करने हेतु कार्य कराया जाना है। जिसकी भौतिक प्रगति निम्नवत है-

क्र०सं०	मद	इकाई	लक्ष्य	पूर्ति	अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
01	नलकूप	संख्या	273	191	82	03 ग्राम पंचायतों में भूमि अप्राप्त, 01 ग्राम पंचायत में नलकूप फेल

02	पम्प हाउस	संख्या	273	135	138	62 नग पर कार्य प्रगति पर, 54 नग पर कार्य अनारम्भ
03	शिरोपरि जलाशय	संख्या	212	68	144	0-25%- 50 26-50%- 17 51- 75% - 52 76 - 99% - 25 100% - 68
04	सोलर	संख्या	243	44	199	129 नग पर सामग्री की आपूर्ति कर ली गयी है, 82 नग पर कार्य अनारम्भ
05	वितरण प्रणाली	कि०मी०	2944	2382.94	561.06	शेष पर कार्य प्रगति पर
06	गृह नल संयोजन	संख्या	123090	104370	18713	81 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ, 54 राजस्व ग्रामों में हर घर जल, 22 राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणित

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को 44 पुर्नगठन पेयजल योजना आवंटित है, जिसमें 23 पैकेज को 16 वेण्डरों को आवंटित है। 44 पेयजल योजनाओं पर विगत लगभग 01 वर्ष से अधिक भुगतान न होने के कारण कार्य प्रभावित है। जिस हेतु मुख्यालय स्तर को भुगतान कराने हेतु आग्रह किया गया है। जिस पर समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि भुगतान न होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः शासन को धन आवंटन हेतु पत्र प्रेषित कराया जाए जिससे कार्यों में तेजी लाई जा सके। उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को आवंटित समस्त पेयजल योजनाओं पर मैनपॉवर व मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए नल कनेक्शन, शिरोपरि जलाशय, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली तथा सोलर पर सामान्तर साप्ताहिक कार्य योजना बनाते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराया जा सके तथा वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु खोदी-गई सड़को को तत्काल बैक फिल करना सुनिश्चित करें जिससे आमजनमानस को आवागमन में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

3. संचालन एवं अनुरक्षण के अंतर्गत पुरानी योजनाओं की प्रगति:-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 43 पेयजल योजनाएं जो ग्राम पंचायत को हस्तांतरित थी जिसमें 77 ग्राम सम्मिलित है। उक्त योजनाएं संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 के अंतर्गत 10 वर्ष की अवधि हेतु सफल संचालन एवं अनुरक्षण हेतु चयनित किया गया है। जिसकी कार्यदायी संस्था मेसर्स ओम इंफ्रा प्रा० लि० है। वर्तमान में 23 पेयजल योजनाओं पर आंशिक जलापूर्ति की जा रही है एवं 20 पेयजल योजनाएं वर्तमान में बंद है। 02 नयी पेयजल योजनाएं प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 45 पेयजल योजनाओं पर गरम्मत का कार्य (पम्प हाउस, शिरोपरि जलाशय, पेयजल पाइपलाइन, गृह नल संयोजन इत्यादि) कराया जाना प्रस्तावित है। समस्त 45 पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० तैयार कर स्वीकृत हेतु जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके सापेक्ष 10 पेयजल योजनाओं पर विगत माह स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिन पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त पेयजल योजनाओं पर मरम्मत का कार्य कराते हुए शीघ्रातिशीघ्र शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही मे० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद/ मे०विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०-गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि०जे०वी०, नोएडा/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/मेसर्स ओम इंफ्रा प्रा० लि०)

अंत में उपरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

Digitally signed by
SARNEET KAUR BROCA
Date: 29-07-2026
17:29:26

जिलाधिकारी
रायबरेली।

कार्यालय जिलाधिकारी रायबरेली।

पत्रांक : 2703 / M-25 / 27 दिनांक : 21/8/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (लक्ष्मण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. जिला विकास अधिकारी, रायबरेली।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली।
10. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, रायबरेली।
11. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजी० प्रा०लि० जे०वी०, नोएडा।
12. टीम लीडर, मेसर्स सेन्सिस टेक लिमिटेड, रायबरेली।
13. जिला समन्वयक, मे० आरवी एसोसिएट्स, रायबरेली (डी०पी०एम०यू०)।

जिलाधिकारी
रायबरेली।
