

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 17.09.2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त –

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17.09.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
- 2- जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बाराबंकी।
- 7- सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
- 8- सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3/निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, बाराबंकी।
- 9- समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाराबंकी।
- 10- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 11- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी (फिचनर), बाराबंकी।
- 12- श्री अनुराग गंगवार, डी०टी०एल० टीपीआई एजेन्सी (मेघज), बाराबंकी।
- 13- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

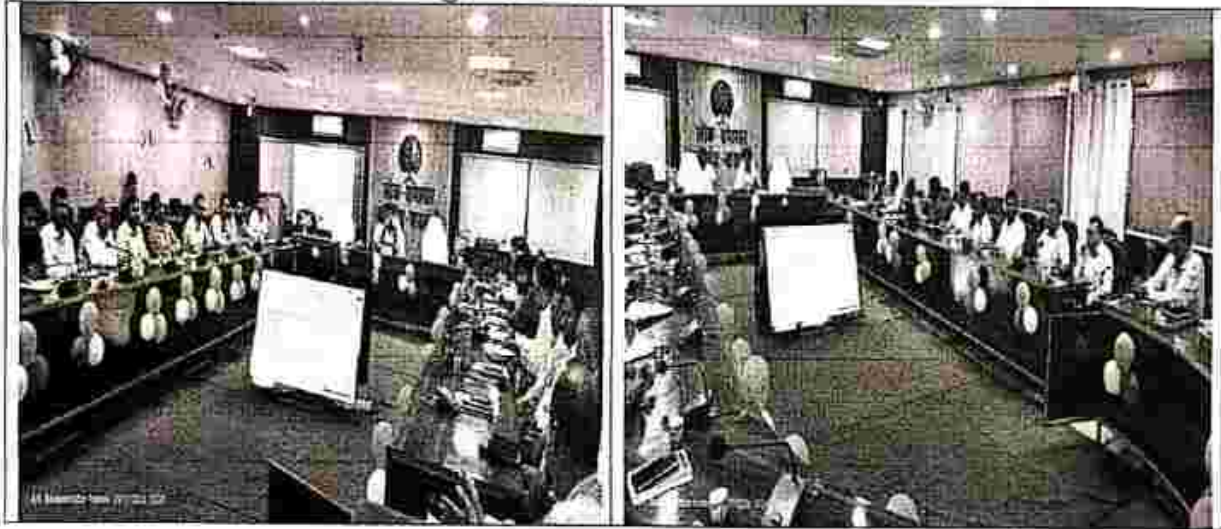


Table – 1 Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत जेजेएम से पूर्व स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं में से जल निगम की कोई भी पेयजल योजना निर्माणाधीन नहीं है।

Table – 1A Jal Operation And Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
118	192	30	127	35

जनपद अन्तर्गत जल निगम की जेजेएम से पूर्व निर्मित 118 नग पेयजल योजनायें हैं, जिसमें 192 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त कार्य हेतु मै0 यूनिवर्सल फर्म जनपद में चयनित हुई है। वर्तमान में मात्र 35 नग राजस्व ग्राम में पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिसे माह सितम्बर, 2026 तक ठीक कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अधिसारी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि दो भागों में मरम्मत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसपर कार्य प्रगति पर है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

Table – 1B Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	123	82	123	13	19	0	0	69	104

अधिसारी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम अन्तर्गत कोई भी योजना पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष पेयजल योजनाओं को वित्तीय रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 2 Physical Progress Phase Wise

S no	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Scheme s / Villages	Direct Pumping Schemes /Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gayatri Projects LTD	38	59	53	14	9	12	17	10	5	0	39	27
					9	15	16	28	17	6			
					30								
2	Megha	328	579	311	61	40	29	259	128	149	0	328	86
					32	58	55	466	207	256			
					218								
3	PNC-SPML-IV	356	630	482	4	80	66	210	170	84	0	357	125
					93	130	113	387	289	145			
					235								
4	Vindhya-GAJA (JV)	44	96	40	12	11	13	20	5	14	0	46	33
					0	13	35	48	8	35			
					28								

5	VSA	83	222	125	10	7	11	65	31	43	0	84	39
					10	12	28	183	69	93			
					105								
6	Universal Mep	118	192	157	30	118	0	0	0	0	0	0	0
					7	192	0	0	0	0			
					120								
Total		967	1778	1168	281	265	131	571	344	295	0	854	310
					151	420	247	1112	590	535			
					736								

अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत 849 नग पेयजल योजनाओं में से 147 नग पेयजल योजनाएँ अनुस्क्षण एवं संचालन की श्रेणी में जा चुकी हैं। 131 नग पेयजल योजनाएँ ट्रायल एण्ड रन की श्रेणी में हैं, जिसे अनुस्क्षण एवं संचालन की श्रेणी में अगले माह ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करना एवं समस्त योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु उचित मैनपावर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन राजस्व ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, को शत-प्रतिशत की श्रेणी में एवं 90 प्रतिशत से कम जलापूर्ति वाले ग्रामों को 90-99 प्रतिशत की श्रेणी में लाने के निर्देश दिये गये।

Table – 2A Single Village Scheme Physical Progress

SN O	Type	Total Schem es	Total Village s	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruptio n	OHT		Financial Details (Lakh)	
			Certifie d Village	Total R WS Village s RWS(%)	100 %	O&M Schem es /Villag es	Trial Run Schem es/ Village s	Schem es /Villag es	Direct Pumpi ng Schem es /Villag es	No RWS Schem es /Villag es		Requir ed OHT	Comple ted OHT	Estima ted Cost	Expe ndit ure
					90% to 99 % < 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (UM)	398	308	289	89	86	62	250	143	106	0	401	165	112424 .7	6284 4.6
			58	72%	36	86	62	250	143	106					
					164										
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Inf Nigam)	67	67	58	2	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67	87%	3	67	0	0	0	0					
					53										
	Total	465	465	347	91	153	62	250	143	106	0	401	165	112424 .7	6284 4.6
			125	75%	39	153	62	250	143	106					
					217										

अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च, 2027 तक समस्त एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। समस्त पेयजल योजनाओं पर वर्तमान में किये गये कार्य के सापेक्ष धनराशि भुगतान होना प्रारम्भ हो गयी है। मै0 पी0एन0सी0 को कुल 187 (एकल ग्राम-160, मल्टीविलेज-27), मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 140 (एकल ग्राम-136, मल्टीविलेज-4), मै0 वी0एस0ए0 को कुल 16 (एकल ग्राम-14, मल्टीविलेज-02), मै0 वी0टी0एल0 को कुल 18 (एकल ग्राम-17, मल्टीविलेज-01), मै0 गायत्री को कुल 24 (एकल ग्राम-21, मल्टीविलेज-03) इस प्रकार कुल 365 नग पेयजल योजनाओं को माह मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना है। जिस पर मै0 पी0एन0सी0 ने लगभग 75 प्रतिशत, मै0 मेघा ने 65 प्रतिशत मैनपावर लगा रखी है, जोकि अत्यन्त कम है। मै0 वी0एस0ए0 एवं मै0 गायत्री की प्रगति उचित पायी गयी। अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वी0टी0एल0 फर्म द्वारा कार्य करने में कोई भी रुचि नहीं ली जा रही है। वर्तमान में फर्म द्वारा नाम मात्र मैनपावर लगायी हुई है जिससे कि दिये गये लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने में कठिनाई आयेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 वी0टी0एल0 को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से उचित मैनपावर लगाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा

की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक दिवस वांछित मैनपावर के सापेक्ष कितनी मैनपावर लगी है, का नियमित अनुश्रवण किया जाये एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर द्वारा नियमित पेयजल योजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

Table – 3 RWS Disruption (Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electric al Issue	Tuflu Pump	Road Wideni ng	Damage Village Internal Works	Local Repairi ng	Total	Theft	Power Electric al Issue	Tuflu Pump	Road Wideni ng	Damage Village Internal Works	Local Repa iring	To tal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Megha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PNC-SPML-JV	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
4	Vindhya-GAJA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	VSA	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
6	Universal Mep(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	31	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0

अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि नियमित जलापूर्ति वाले एवं निर्माणाधीन योजनान्तर्गत 91 नग राजस्व ग्रामों में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी है जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। जिसमें मात्र 68 नग राजस्व ग्राम अन्तर्गत डाली गयी पाइप लाइन, जोकि लो0नि0वि0 एवं अन्य द्वारा निर्मित रोड के नीचे आ गई है, पर वांछित कार्यवाही नहीं हो पायी है। जिससे कि पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने में कठिनाई आरंभ रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा समस्त सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति कैसे प्रारम्भ की जा सकती है, पर विचार कर आगामी दिनांक 25.09.2026 को प्रस्तावित बैठक में समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

Table – 4 Certification/Jal Arpan/Jal Ankalan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan (RV)	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Gayatri Projects LTD	59	17	5	16	55
2	Megha	579	18	25	12	441
3	PNC-SPML-JV	630	118	80	85	544
4	Vindhya-GAJA (JV)	96	13	4	7	88
5	VSA	222	16	9	10	188
6	Universal	192	192	3	188	0
Total		1778	374	126	318	1316

जल अर्पण एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन कार्य में वांछित प्रगति न पाये जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। रोस्टर तैयार कर अवशेष जल अर्पण एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 4 A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized (%)
1	2	3	4	5	6
1	1789	1764	1	24	98.60%

जिलाधिकारी महोदय द्वारा आर0पी0डब्लू0एस0एस0 आईडी पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	891	891	100
2	पंप हाउस	891	884	99.21
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	891	540	60.61
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	854	840/310	98.36
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	10289	9602	93.32
6	सौर ऊर्जा प्लांट	807	727	90.09
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	517152	508651	98.36
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	3798	3644	95.95
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1586	1316	82.98
11	कमीशनिंग गाँव	1586	1145	72.19
12	नियमित जल आपूर्ति	1586	1012	63.81

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त राजस्व ग्रामों में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति कराने एवं अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	38	24	0	9	8	0
2	Megha	328	75	63	40	39	37
3	PNC-SPML JV	356	104	88	80	72	61
4	Vindhya-GAIA (JV)	44	22	15	11	10	7
5	VSA	63	20	13	7	6	5
	Total	849	245	179	147	135	110
##	Jal Nigam	118	0	0	0	0	0
	Total	967	245	179	147	135	110

अधिकांसी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कुल 147 नग पेयजल योजनाओं अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में जा चुकी है जिसमें 110 नग पेयजल योजनाओं में स्काडा सिस्टम सही तरीके से कार्य कर रहा है जिससे कि पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में लगे स्काडा सिस्टम को लाइव रखने के निर्देश दिये गये।

Table – 7 Grivance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	89	89	0	25	25	0
2	Megha	956	914	42	160	155	5
3	PNC-SPML JV	979	954	25	292	289	3
4	Vindhya-GAIA (JV)	105	97	8	29	29	0
5	VSA	173	170	3	13	13	0
6	Universal Mep(Jal Nigam)	267	266	1	27	27	0
	Total	2569	2490	79	546	538	8

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुसूचण एवं संचालन की श्रेणी में अधिकांश शिकायतों के लम्बित होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी। समस्त शिकायतों का 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table - 8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/IE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	1	0	1	0
2	IE/AES	8	6	2	75

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष फ्लोराइड एवं जेई/एईज से प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 31 नग पेयजल योजनाओं पर अभी तक ट्रांसफार्मर क्रियाशील नहीं किये गये हैं एवं पूर्व अधिष्ठापित विद्युत संयोजनों में विद्युत सम्बन्धी समस्याएँ हैं। अधिशाली अभियन्ता, जल निगम को सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(ईशान प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 9597 / 26 / 30 दिनांक 21-09-2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 4- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/ निर्माण खण्ड-1/निर्माण खण्ड-3, लोअनिवि0, बाराबंकी।
- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- अधिशाली अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 7- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 8- अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 9- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी/फतेहपुर/रामनगर/रामसनेहीघाट/हैदरगढ़।
- 10- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

Digitally signed by
ISHAN PRATAP SINGH

Date: 18-09-2026
18:38:38

जिलाधिकारी
बाराबंकी
