


जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 15.09.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 15.09.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
01	वंदिता श्रीवास्तव	मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।	प्रशासनिक विभाग
02	श्री सुनील कुमार	अधिशारी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
03	श्री श्रवण कुमार	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
04	श्री सुरेन्द्र कुमार	अधिशारी अभियन्ता	विद्युत विभाग
05	श्री विवेक कुमार कुशवाहा	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
06	श्री नीरज कुमार	सहायक अभियन्ता	एस०डब्ल्यू०एस०एम०
07	श्री चरण सिंह	उप परियोजना प्रबंधक	मे० एन०सी०सी० लिमिटेड
08	श्री अभय उपाध्याय	इंजीनियर	मे० एन०सी०सी० लिमिटेड
09	श्री देवेश कुमार गुप्त	जिला समन्वयक	डी०पी०एम०यू०
10	श्री रविन्द्र गोखले	डी०पी०एम०	मेसर्स मेघज-थर्ड पार्टी एजेन्सी
11	श्री अंजनी भारती	QA/QC	मेसर्स मेघज-थर्ड पार्टी एजेन्सी
12	श्री विनय सिंह	साईट इंजीनियर	मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक्स लि०
13	श्री अमलेश कुमार	डी०टी०एल०	मेसर्स मेघज-थर्ड पार्टी एजेन्सी

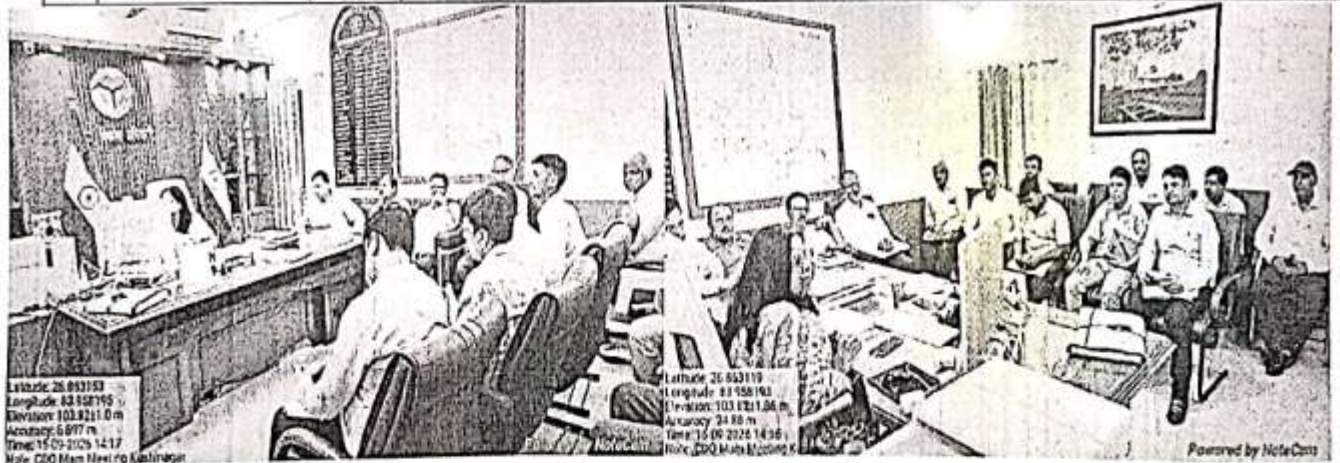

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है-

Table No.-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress.

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
8	17	2	5	1	0	8

MS/D 1586 Of. Wo./Le 23/DM.M.155

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हें माह अक्टूबर, 2026 तक एवं शेष पेयजल योजनाओं माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
195	504	73	320	111

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फर्म मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	250	129	250	62	135	0	0	67	118

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 129 नग पेयजल योजनाएँ जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-2 : Physical Progress Phase wise

S. n	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages In O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NCC Ltd.	453	919	697	373 56 268	200 372	45 102	208 456	128 242	112 214	0	453	274
2	VTL	195	504	393	73 82 238	195 504	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		648	1423	1090	446 138 506	395 876	45 102	208 456	128 242	112 214	0	453	274

MS/D:\S&E Of. Wo./Lk.23/DM.M.\56

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि -

1. मे० एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में नियमित जलापूर्ति वाले गावों की संख्या बढ़ायी जाये तथा जिन ग्रामों में शतप्रतिशत जलापूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें शतप्रतिशत जलापूर्ति से लाभान्वित किया जाये।
2. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक्स द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में नियमित जलापूर्ति वाले गावों की संख्या बढ़ायी जाये तथा जिन ग्रामों में शतप्रतिशत जलापूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें शतप्रतिशत जलापूर्ति से लाभान्वित किया जाये।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

S.N.	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JIM)	182	182 77	153 84%	86 12 55	91 91	11 11	80 80	40 40	29 29	71483.17	46519.24
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	78	78 61	66 85%	10 2 49	78 78	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0.00
Total		260	260 138	219 84%	96 19 104	169 169	11 11	86 86	40 40	29 29	71483.17	46519.24

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाये है, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये -

1. फर्म मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा जिन 80 अदद पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनके समस्त कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करे।

Table No.-3 : RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

S. N o.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Th eft	Power Electri cal Issue	Tull u Pu mp	Road Widen ing	Dam age Villa ge Inter nal Wor ks	Local Repair ing	Tot al	Th eft	Power Electri cal Issue	Tull u Pu mp	Road Widen ing	Dam age Villa ge Inter nal Wor ks	Local Repair ing	Tot al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NCC Ltd.	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
2	Vindhya Telelinks Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कारणों से बाधित नियमित जलापूर्ति वाले विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये तत्काल मरम्मत कराकर जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

S. No.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	919	368	201	316	297	852
2	Vindhya Telelinks Limited [Jal Nigam]	504	394	8	11	396	0
Total		1423	762	209	327	693	852

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में शत प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में हैं, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

S. No.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1459	1414	0	45	96.92%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5 : Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	453	454	100
2	पंप हाउस	453	452	99.78
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	453	450	99.34
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	453	450/274	99.34
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	6394	6289	98.36
6	सौर ऊर्जा प्लांट	350	336	96.00
7	घरेलू जल कनेक्शन(FHTC)	553162	542944	98.15
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2586	2579	99.73
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	916	864	94.32
11	कमीशनिंग गाँव	916	674	73.58
12	नियमित जल आपूर्ति	916	697	76.09

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि—

1. जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
2. जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

S. No.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	453	187	156	200	163	138
Total		453	187	156	200	163	138
2	Jal Nigam	195	0	0	0	0	0
Total		648	187	156	200	163	138

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर को निर्देशित किया गया कि -

1. जो पेयजल योजनाये ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
2. जो पेयजल योजनाये Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live करना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 : Grievance Redressal System

S. No.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	815	809	6	477	474	3
2	Vindhya Telelinks Limited(Jal Nigam)	470	464	6	51	51	0
Total		1285	1273	12	528	525	3

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 11 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदेश के Arsenic/Fluoride/IE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

S. No	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	15	15	0	100
2	IE/AES	201	183	18	91

Table No-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/ईई से प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जेई/ईई से प्रभावित 26 ग्रामों, जिनमें कार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता पर 02 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु:-

1-विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :-

अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 अदद पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं जिनमें से अब तक मात्र 71 अदद योजनाओं पर ही विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो पाया है, उक्त अवशेष 32 अदद योजनाओं के विद्युतीकरण का कार्य समय से न हो पाने के कारण जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है तथा उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 31 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं में विभिन्न विद्युत खराबी के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिसके लिये लगातार विद्युत विभाग से अनुरोध किया जा रहा है। उक्त के कम में अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवशेष कार्यों को आगामी 15 दिवस में शत प्रतिशत पूर्ण करा लिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये करा लिये जाए, जिससे जलापूर्ति बहाल हो सके।

उक्त के अतिरिक्त उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 34 अदद योजनाओं पर विभिन्न विद्युत खराबी यथा ट्रांसफार्मर खराबी, केबल जल जाना आदि के कारण जलापूर्ति बाधित है। उक्त के कम में अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मरम्मत कार्यों को आगामी 15 दिवस में शत प्रतिशत पूर्ण करा लिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये करा लिये जाए, जिससे जलापूर्ति बहाल हो सके।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिशाली अभियन्ता (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

2- भूमि विवाद :-

अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण हेतु 454 अदद कार्यस्थलों हेतु भूमि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष शतप्रतिशत भूमि का आवंटन हो गया तथा उपरोक्त 453 अदद स्थलों पर बोरिंग का पूर्ण कर लिया गया है परन्तु योजना का कार्य प्रारम्भ होने के कुछ दिनों बाद 07 अदद योजनाओं के कार्यस्थलों पर विभिन्न प्रकार के विवाद (सूची संलग्न) उत्पन्न होने के कारण शेष कार्य नहीं हो पा रहा है तथा 11 अदद ग्राम समूह योजनाओं पर, जिन ग्राम पंचायतों में जलकल स्थल प्रस्तावित नहीं है उनके ग्रामवासियों द्वारा निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। उक्त के कम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त विवादों की तहसीलवार सूची उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये निस्तारण कराकर उपरोक्त अवशेष कार्यों को अतिशिघ्र पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०पी०एम०यू०)

3- उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन:-

अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं को आगामी 10 वर्षों तक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य कार्यदायी एजेंसी मे० विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अनुरक्षण हेतु लॉट-03 व लॉट -04 में 172 अदद योजनाओं के मरम्मत कार्यों की आंशिक स्वीकृति मुख्यालय स्तर से प्रदान की गयी है। परन्तु उक्त कार्यों की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है। उक्त के कम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त एजेंसी को उनके स्तर एवं जिलाधिकारी महोदय के स्तर से नोटिस जारी किया जाये तथा उच्चाधिकारियों को पृष्ठांकित किया जाये।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में चल रहे रागरत कार्यों को निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

रामीक्षा बैठक राधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR
Date: 16-09-2026
17:07:28

(सुनील कुमार)

अधिकासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

Digitally signed by
Vandita Srivastava
Date: 16-09-2026
19:29:46

(वदिता श्रीवास्तव)

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

Digitally signed by
Mahender Singh Tawar
Date: 22-09-2026
11:43:22

(महेन्द्र सिंह तवर)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

पत्रांक- 4212 / कार्य-02 / 199 दिनांक 25/09 / 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिकासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
5. जिला विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
8. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
10. अधिकासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
11. अधिकासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
12. जिला कृषि अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
15. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
16. अधिकासी अभियन्ता (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
17. समस्त अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
18. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
19. परियोजना प्रबन्धक, विन्ध्या टेलीलिव्स लिमिटेड, कुशीनगर।
20. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०एम० कुशीनगर।
21. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
22. समस्त सहायक अभियन्ता/जू०ई०।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।
