

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-03.09.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में 060जे0एम0 पोर्टल के डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड के अनुसार सम्बन्धित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/गोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
2. श्री करुणाकर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
3. समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
4. समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. श्री चन्द्रशेखर गिरि, डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिटिव डेक लि0, चित्रकूट।
6. श्री प्रोविन्स कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एल0एण्ड0टी0, चित्रकूट।
7. श्री एस0 मौर्या, डी0पी0एम0, कार्यदायी संस्था जी0बी0पी0आर0, चित्रकूट।
8. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन मवन लखनऊ।
9. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मेसर्स सतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कबी, चित्रकूट।
10. श्री शिवन, प्रतिनिधि, मेसर्स भारतीय इंजीनियर्स जलौगक।
11. श्री महेन्द्र दीक्षित, डिस्ट्रिक्ट हेड, मेसर्स इंगल इन्फ्रा इण्डिया लि0, महाराष्ट्र।
12. श्री मनीष अहिस्वार, डिप्टी टीम लीडर, मेसर्स आरवी एल0सिएड्स (ओ0एण्ड0एम0), चित्रकूट।

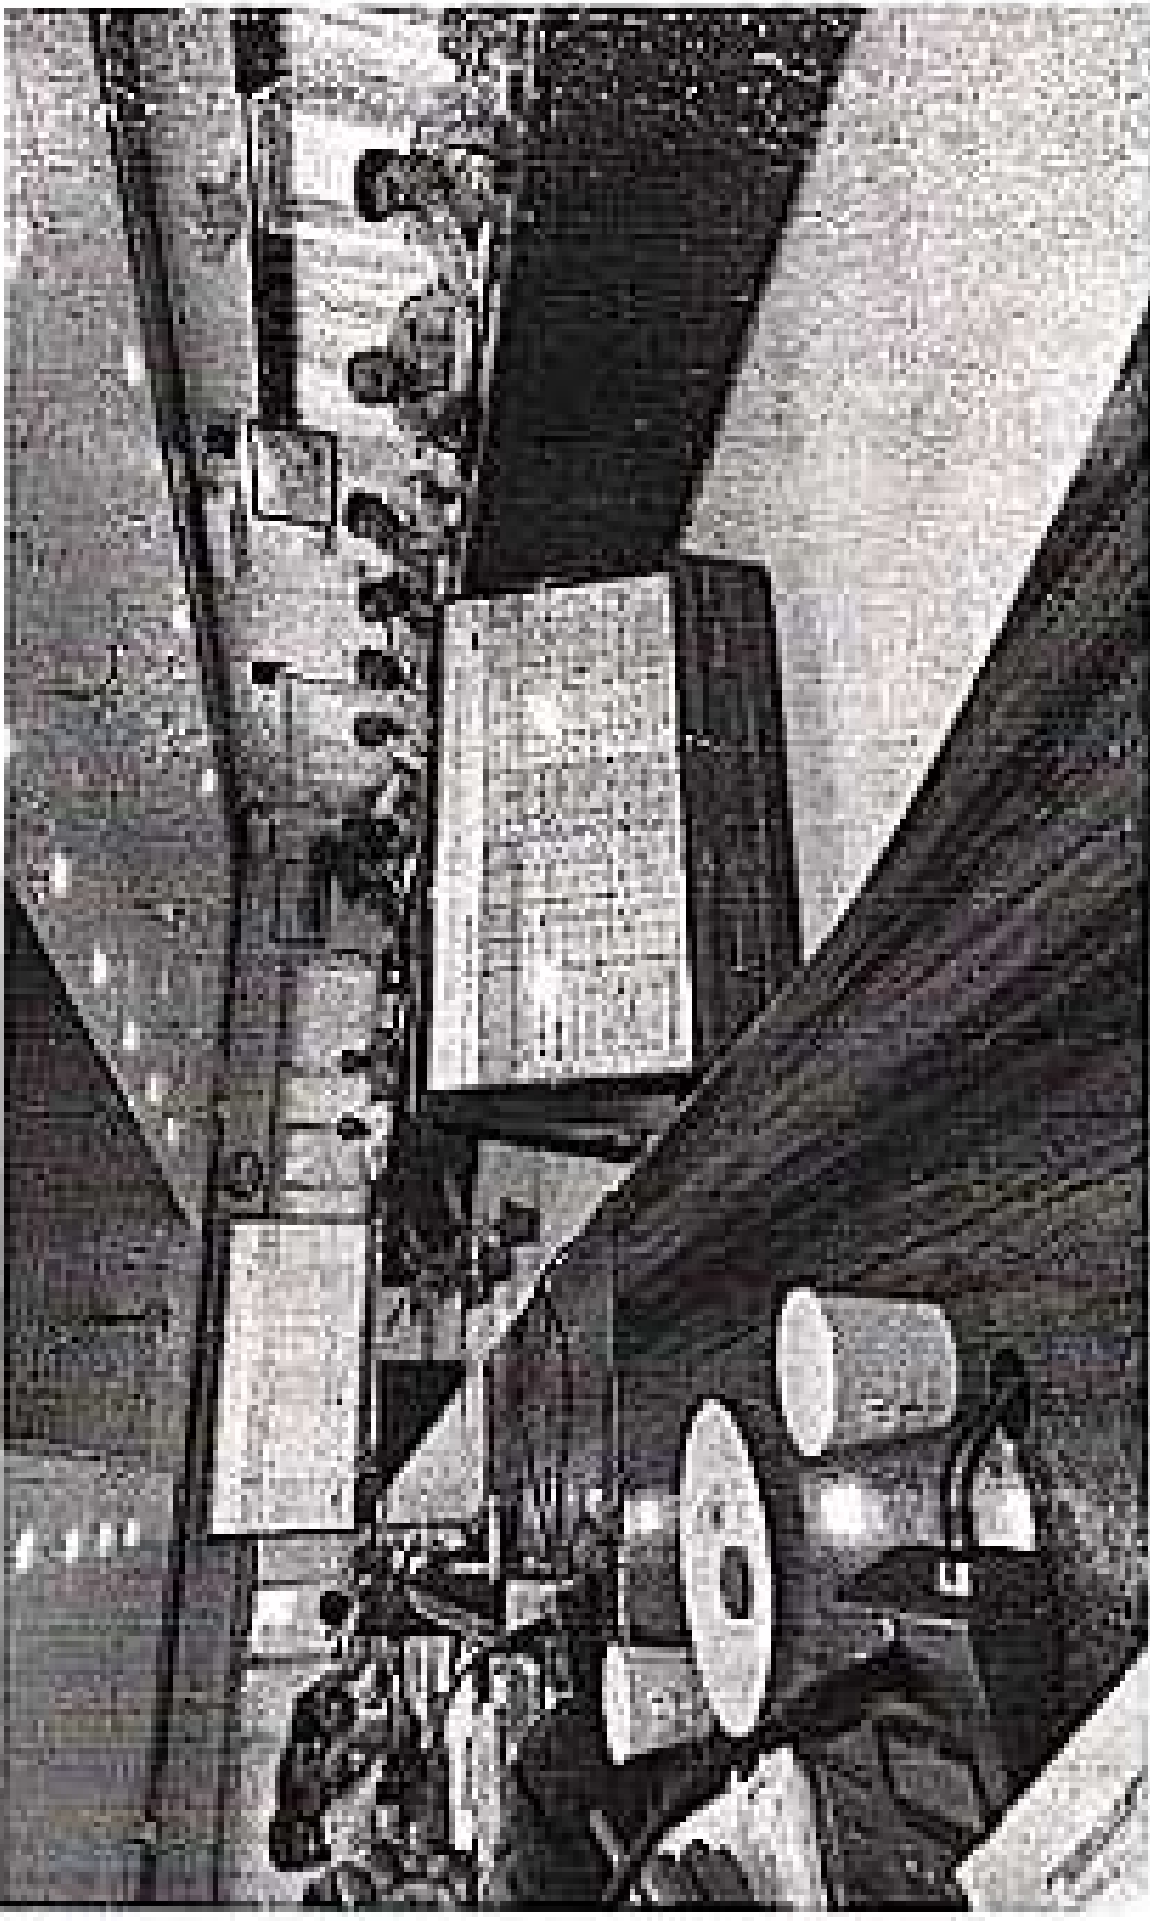


Table 1-Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत अण्डर कन्स्ट्रक्शन योजनाओं की संख्या शून्य है परन्तु रेड्रोफिटिंग / आनगोइंग योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में फिनिशिंग एवं कमिशनिंग के कार्य अवशेष हैं। जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट एवं समस्त फार्मों के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत पर्याप्त मैनपावर लगाते हुये अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 1A-Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
47	144	106	32	06

Table 1A Observations अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा अनुस्क्षण एवं संभालन अन्तर्गत 47 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 144 ग्रामों के सापेक्ष 106 ग्राम फुली फंक्शनल एवं 32 ग्राम पार्श्विकली फंक्शनल है एवं 06 ग्राम डिमाण्ड ओनली का पानी नहीं मिलने के कारण नान फंक्शनल हैं।

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुस्क्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट, फार्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०पी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि पार्श्विकली फंक्शनल 32 ग्रामों एवं नान फंक्शनल 06 ग्रामों में डिमाण्ड ओनली एवं पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन एवं संरचनाओं के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित फार्म को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने का माइक्रोप्लान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Table 1B-Jal Nigam Retrofitting Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	61	44	61	0	0	0	0	44	61

Table 1B Observations

Table 1B में ऊपर जिलाधिकारी (नगमि नगरे) महोदय द्वारा अधिसूची अभियन्ता, लण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) पित्रकूट को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणधीन योजनाओं में फिनिशिंग एवं कमिशनिंग के अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित फर्म को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने का माइक्रोप्लान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये हैं उनके भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये फाइनेन्शियल क्लोज किया जाये।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed			Work In Progress			OHT	
				Total RWS Villages	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	Villages in O&M but not RWS	Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] CVPR	1	69	65	40/13/12	0/0	0/0	1/69	0/0	1/4	0	28	27
2	[JJM] Larsen & Toubro Ltd	2	345	274	119/84/71	0/0	0/0	2/345	0/0	1/71	0	108	108
3	[Jal Nigam] Eagle Infra India Ltd	46	97	91	59/9/23	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%/ 90% to 99%/ ≤ 90%	O&M Schemes Villages	Tribal Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	[Jat Nigam] JWIL Chitrakoot	1	47	47	47/100	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0
Total		50	558	477	265/106/106	0/0	0/0	3/414	0/0	2/75	0	136	135

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के आतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि--

1. फर्म जी0बी0पी0आर0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजना के अन्तर्गत कुल 69 ग्रामों के सापेक्ष अवशेष 03 ग्रामों में माह सितम्बर 2026 तक ओ0एच0टी0, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें एवं जिन ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम पेयजल आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
2. फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बागर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 286 ग्रामों के सापेक्ष अवशेष 82 ग्रामों में माह सितम्बर 2026 तक ओ0एच0टी0, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें एवं जिन ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम पेयजल आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
3. फर्म ईंगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अनुरक्षण एवं संचालित ग्रामों में क्लोरीन युक्त मानक अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाये एवं ग्रामों से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराया जाये।
4. फर्म जे0डब्लू0आई0एल0, एस0एस0आई0एल0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अनुरक्षण एवं संचालित ग्रामों में क्लोरीन युक्त मानक अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाये एवं ग्रामों से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराया जाये।

Table-2A Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages/ Certified Village	RWS Villages			Work Completed			Work In Progress			Villages in O&M	OHT		Financial Details (Lakhs)							
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%		O&M	Trial Run	Schemes	Direct Pumping Schemes	No RWS Schemes	Completed OHT	Required OHT	Estimated Cost	Expenditure								
																Villages	Schemes	Villages	Villages				
																				Villages	Schemes	Villages	Villages
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JNM)	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	38	38.26	32.84%	22/37	35	0	0	0	0	6	0	0	0	0								
	Total	38	38.26	32.84%	22/37	35	0	0	0	0	6	0	0	0	0								

Table 2A में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा अधिसारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) धिब्रयूट को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में फिमिशिंग एवं कमिशनिंग के अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित फर्म को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने का माइक्रोप्लान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये हैं उनके भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये फाइनेन्सियल क्लोज किया जाये।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)								O&M RWS disruption(Village)					
		Theft	Power Electrical Issue	Tulla Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tulla Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GVPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Larsen & Toubro Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Eagle Infra India Ltd[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JWIL Chitrakoot[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन निशान के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०ग्र० जल निगम (ग्रामीण) (सिविल/वि०/या०) को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कर्धी से सम्बन्ध स्थापित करते हुये पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये कराकर ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही रोपरेट फीडर का प्राक्कलन प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०ग्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GVPR	69	53	18	22	62
2	Larsen & Toubro Ltd	345	190	27	89	283
Total		414	243	45	111	345

Table 4 Observations

हर घर जल प्रमाणीकरण- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 59 ग्रामों के सापेक्ष समस्त 59 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण करा लिया गया है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 288 ग्रामों के सापेक्ष 131 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण करा लिया गया है।
3. रेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 69 ग्रामों के सापेक्ष 53 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण करा लिया गया है।

जल अर्पण-

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 13 ग्राम पंचायतों में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 14 ग्राम पंचायत में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।
3. रेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 18 ग्राम पंचायत में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।

जल आंकलन- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रिपोर्टेड 111 ग्राम पंचायतों में जल आंकलन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

रोड रेस्टोरेशन-

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 60.00 कि०मी० के सापेक्ष 59.00 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं योजनान्तर्गत 59 ग्रामों के सापेक्ष 58 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 304.52 कि०मी० के सापेक्ष 274.00 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं योजनान्तर्गत 288 ग्रामों के सापेक्ष 226 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
3. रेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 97.10 कि०मी० के सापेक्ष 84.93 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं योजनान्तर्गत 69 ग्रामों के सापेक्ष 62 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल (Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration) वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी (नमाभि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पर्याप्त मशीनरी व मैनपावर लगाते हुये यथाशीघ्र पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराते हुये जल अर्पण की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है, उन ग्रामों में वर्ग ऋतु के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर रोड रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक-30.09.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	561	545	0	16	97.15%

Table 4A Observations

आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस०— अधिराप्ती अभियन्ता, खाण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के अन्तर्गत समस्त पंचजल योजनाओं की आर०पी०डब्ल्यू०एस०एस० आई०डी० पूर्ण करा ली गयी है।

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं (Sujal Gaon ID/RPWSS ID) की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त एसोस्टस की जिया टैगिंग सुजलाम भारत एप के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
2	ओवरहेड टैंक (OHT)	136	136/135	100.00
3	पाइपलाइन विछाने का कार्य (कि.मी.)	4511	4292	95.11
4	घरेलू नल वनोपसर्जन (MTC)	163970/	163698	99.83
5	जल शुद्धिकरण संबंध (व.त.प)	3	3	100.00
6	सड़क मरम्मत का कार्य (KCM)	455	415	91.20
7	वे गॉल जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	414	345	82.60
8	नियमित जल आपूर्ति	414	339	81.88

Table 5 Observations

ओवर हेड टैंक— अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 17 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष समस्त 17 नग ओवर हेड टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं समस्त 17 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 91 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष समस्त 91 नग ओवर हेड टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं 86 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल हैं, 05 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल नहीं हैं।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 28 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष समस्त 27 नग ओवर हेड टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं 26 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल हैं, 02 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल नहीं हैं एवं 01 नग ओवर हेड टैंक का कार्य अवशेष है।

अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एच०डी० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष ०५ नग ओ०एच०डी० को यथाशीघ्र फंक्शनल कराना सुनिश्चित करें। फर्म मैसर्स जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष ०१ नग ओ०एच०डी० का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

पाइप लाइन— अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ५७६.५५ कि०मी० के सापेक्ष समस्त ५७६.५५ कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अन्तर्गत ३०३८.३६ कि०मी० के सापेक्ष समस्त २६०७.०० कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ६६२.३६ कि०मी० के सापेक्ष समस्त ६६०.५० कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एच०डी० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष ४३१.३८ कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्म मैसर्स जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष २१.६८ कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

नियमित जलापूर्ति— अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ५९ ग्रामों के सापेक्ष समस्त ५९ ग्रामों (४६ ग्रामों में शत-प्रतिशत, १२ ग्रामों में ९० से ९९ प्रतिशत एवं ०१ ग्राम में ९० प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत २८६ ग्रामों के सापेक्ष २१५ ग्रामों (७३ ग्रामों में शत-प्रतिशत, ७२ ग्रामों में ९० से ९९ प्रतिशत एवं ७० ग्रामों में ९० प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ६९ ग्रामों के सापेक्ष ६५ ग्रामों (४० ग्रामों में शत-प्रतिशत, १३ ग्रामों में ९० से ९९ प्रतिशत एवं १२ ग्रामों में ९० प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।

Table No-5 अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एच०डी० एवं जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति यथाशीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है, उन ग्रामों में वर्षा ऋतु के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर रोड रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक-३०.०९.२०२६ तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	1	1	1	0		
2	Larsen & Toubro Ltd	2	2	2	0		
Total		3	3	3	0		
1	Jal Nigam	47	0	0	0	0	0
Total		50	3	3	0		

Table 6 Observations

स्काडा आटोमेशन- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्ताफिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 17 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष 13 नग ओ०एच०टी० का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है. 03 नग ओ०एच०टी० का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्राप्त है. 01 नग ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कॅलीब्रेशन का कार्य लम्बित है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 91 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष 12 नग ओ०एच०टी० का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है. 23 नग ओ०एच०टी० का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्राप्त है. 42 नग ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कॅलीब्रेशन का कार्य लम्बित है. 14 नग ओ०एच०टी० के उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य अपूर्ण है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 28 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष 13 नग ओ०एच०टी० का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है. 10 नग ओ०एच०टी० का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्राप्त है. 04 नग ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कॅलीब्रेशन का कार्य लम्बित है. 01 नग ओ०एच०टी० के उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य अपूर्ण है।

अपर जिलाधिकारी (नमानि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत सगस्त ओ०एच०टी० पर आटोमेशन व इंटीग्रेशन का कार्य पूर्ण कराले हुये फंक्शनल कराना सुनिश्चित करें।

Table No-6 में अपर जिलाधिकारी (नमानि गंगे) महोदय द्वारा विगत माह की समीक्षा बैठक की तिथि से वर्तमान तक अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं होने पर अग्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि माइक्रोस्लान के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष ओ०एच०टी० के स्काडा आटोमेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	207	201	6			0
2	Larsen & Toubro Ltd	960	929	31			0
3	Eagle Infra India Ltd(Jal Nigam)	218	216	2	161	159	2
4	JWIL Chitrakoot(Jal Nigam)	83	76	7	83	76	7
	Total	1468	1422	46	244	235	9

Table 7 Observations

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि फर्मों के द्वारा संदर्भों के निस्तारण में सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है, जो कि आप समस्त की ग्रीवियान्स जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। फर्मों के द्वारा शिकायतकर्ता से शत-प्रतिशत यार्ता नहीं की जा रही है एवं शत-प्रतिशत सर्वे कार्य नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण संतुष्ट फीडबैक के प्रतिशत में वृद्धि नहीं हो पा रही है एवं सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है, जो कि गम्भीर लापरवाही एवं कर्तव्य में शिथिलता को दर्शाता है और विभाग की समयबद्ध सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

Table No-7 में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, खण्ड कार्यालय, खण्ड जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), खण्ड जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं समस्त कार्यवाही संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत ग्रीवियान्स का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण भवनीय मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अतः समस्त ग्रीवियान्स का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण निर्धारित तिथि से 03 दिन पूर्व कराना सुनिश्चित करें।

Table 8.भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	2	2	0	100

Table 8 Observations अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में फ्लोराइड से प्रभावित 02 नग ग्रामों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

Table 9-Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कन्टामिनेटेड सैमपल की संख्या शून्य है।

Other Instructions

CIRP Status- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त योजनाओं की सी०आई०आर०पी० पूर्ण कर लिया गया है।

Land Availability / Issues- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता से सम्बन्धित कोई समस्या नहीं है।

Chlorination Details- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत किये जा रहे पेयजल आपूर्ति में क्लोरिनेशन की समुचित मात्रा का उपयोग करते हुये शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।

Other Issue-Related Instructions- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन-

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आवश्यक 51 नग मैनपावर के सापेक्ष केवल 15 मैनपावर कार्यरत है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आवश्यक 600 नग मैनपावर के सापेक्ष केवल 301 मैनपावर कार्यरत है।
3. रेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आवश्यक 284 नग मैनपावर के सापेक्ष केवल 140 मैनपावर कार्यरत है।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा योजनान्तर्गत फर्मों के द्वारा पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगाये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी तैनात करते हुये अवशेष कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-


1. जगनद चित्रकूट में दिनांक-29.08.2026 व दिनांक-01.09.2026 को अत्यधिक वर्षा होने से गंदाकिनी नदी एवं वाल्मीकि नदी का पानी बढ़ने से चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के खरी, वनहट, औदहा बट्ठारा एवं लोहदा सीडक्लूअर/पम्प हाउस में पानी भर जाने एवं विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो गयी थी एवं रेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत मानिकपुर सतना मार्ग पर टिकरिया रेलवे स्टेशन के पास 50 मीटर रोड सह जाने के कारण 05 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि० चित्रकूट के डिप्टी टीम लीडर, फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०बी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजरों के साथ विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये समस्त पंप हाउसों में मोटर, फैनल एवं अन्य विद्युत उपकरणों की जांच एवं गरममत कार्य करवाकर सम्बन्धित ग्रामों में एक सप्ताह के अंदर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि अपने योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने का माइक्रोप्लान प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर सप्ताह के अंदर खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जा रही है उन ग्रामों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करना सुनिश्चित करें एवं मा० जनप्रतिनिधियों (मा०सासद, मा० विधायक, मा० जिला पंचायत अध्यक्ष, मा० अध्यक्ष, स्टाक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान) की उपस्थिति में ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों, समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अंतर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़क मार्गों के पुर्नस्थापन के कार्यों को पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये प्राथमिकता पर 30.09.2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिसकी ग्रामवार कार्ययोजना प्रत्येक दशा में 02 दिवस के अंदर अधोहस्तकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि रोड रेस्टोरेशन कार्यों को स्वयं या टी०पी०आई० के इंजीनियरों की उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

9. अपर जिलाधिकारी (नभामि गंगे) महोदय चित्रकूट द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सिलौटा मुस्तफिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड समनगर को ग्राम प्रधानों का उद्घोटीप्रीवो का एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश दिये गये।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि रेंपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत रुखमा खुर्द एवं ऐलहा बंदैया सी०डब्ल्यू०आर० पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया जाने के कारण रेट्रोफिटिंग योजना के अन्तर्गत ०७ पेयजल योजनाओं में पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। जिसके सम्बन्ध में फर्म जी०वी०पी०आर० चित्रकूट के प्रोजेक्ट मैनेजर को विगत ०३ महीनों से निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है किन्तु फर्म जी०वी०पी०आर० चित्रकूट के प्रोजेक्ट मैनेजर को द्वारा वर्तमान तक उक्त सी०डब्ल्यू०आर० पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट एवं फर्म जी०वी०पी०आर० चित्रकूट के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि रेंपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत रुखमा खुर्द एवं ऐलहा बंदैया सी०डब्ल्यू०आर० पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य १५ दिन के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
11. फर्म एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि डिमाण्ड ओनली के अवलोकन कार्यों को पूर्ण कराकर रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं में नियमित पेयजल आपूर्ति यथाशीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
12. रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत समस्त अवरोध कार्यों को पूर्ण कर्त्तव्य हुये ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें एवं ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एच०, ग्रीडियन्स, जगप्रतिनिधियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एच० सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्तामानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तब कर्त्तव्य हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/डेवेलपर्स एवं जूनियर सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/डेवेलपर्स एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक सन्दर्भों ऑफलाइन/ ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये। आई०जी०आर०एच० सन्दर्भों के निस्तारण का संतुष्टि फीडबैक ८० प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। साथ ही ओ०एण्ड०एम० एजेन्सी के डिस्ट्रिक्ट हेड को निर्देश दिये गये ओ०एण्ड०एम० योजनाओं के अन्तर्गत आई०जी०आर०एच० सन्दर्भों के निस्तारण का संतुष्टि फीडबैक ९० प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निरन्तर अनुप्रवाच करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।
14. धादी खंगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत गडौली, मानपुर, खैरी, हिनौतागाफी, बैसौवा, औदहा, देवल, चन्हाट रंगौली एवं कुत्तली सी०डब्ल्यू०आर० पर एवं रेंपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत मानिकपुर रुरल फीडर से कनेक्ट ०५ नग कमरा पटा, सरहट, चुल्ही, मेला एवं टिकरिया सी०डब्ल्यू०आर० पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं सेक्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके संबंध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त लोकेशन पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराया जाये एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कर्त्तव्य को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संवाहन हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराये।
15. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निरन्तर निर्देशित करने के उपरान्त भी जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी०एच०सी०, पी०एच०सी० आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित नहीं किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को पुन निर्देशित किया गया कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी०एच०सी०, पी०एच०सी० आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कर्त्तव्य गये कनेक्शन का सत्यापन कार्य पूर्ण करते हुये आख्या आगामी बैठक के पूर्व अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T) (GVPR) इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम को समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु कार्यरथलों में अतिरिक्त मैनेजर/टीम/मशीनरी की तैनाती करती हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य स्थायी रूप पूर्ण कराने को निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यन्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे०पी०एम० वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर सतत कार्य गुणवत्तापूर्ण करवाते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।



(स्वच्छ/कुमार)
अपर जिलाधिकारी (नगमि गंगे)
चित्रकूट

दिनांक ०९/१०/२०२६

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (नगमि गंगे), चित्रकूट

संख्या १२९३ / १७-८ / १२९ / २०२६

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नगमि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
5. आयुक्त महोदय, चित्रकूटग्राम मण्डल, बांदा।
6. मुख्य अभियन्ता, (गुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
7. मुख्य विरक्त अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/गं०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, वर्ड पाटी इम्प्लेमेंट (टी०पी०आई०), सेन्सिबल टेक लि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
12. जलस्तर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०पी०एम० कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
14. समस्त ठेकेदार, रेड्रोफिटिंग पैकेज-१, २, ३, मऊ व बरगड, परदवा एवं कोल्लुवामाजी को अनुपालनार्थ।

अपर जिलाधिकारी (नगमि गंगे)
चित्रकूट

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T)/ (GVPR) इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/ डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आकलित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यस्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करती हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य सप्ताशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत मन्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे०जे०एम० वाट्सएप्प ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर सतत कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने हुए खोजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सघनवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(स्वप्निल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (नमागि गंगे)
चित्रकूट

दिनांक ०९-१०-२०२६

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (नमागि गंगे), चित्रकूट

संख्या १२४९ / M-८ / १२७ / २०२६

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख सचिव महोदय, नमागि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिसन, लखनऊ।
- जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
- आयुक्त महोदय, चित्रकूटग्राम मण्डल, बांदा।
- मुख्य अभियन्ता, (पुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/बॉ०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (DWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
- डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इम्पेशन (टी०पी०आई०), सेन्सिटेव टेक लि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
- क्लर्कर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
- प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०पी०एम० कार्यदायी संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
- समस्त ठेकेदार, रेड्रोफिटिंग पैकेज-१.२.३, गऊ व बरगड, परदवां एव कोल्हवानाफी को अनुपालनार्थ।

(स्वप्निल कुमार)
अपर जिलाधिकारी (नमागि गंगे)
चित्रकूट
