


कार्यालय- जिलाधिकारी, अयोध्या

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 27 अगस्त, 2026 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्य की समीक्षा के सम्बन्ध में आयुक्त बैठक का कार्यगुत्ता।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 27.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

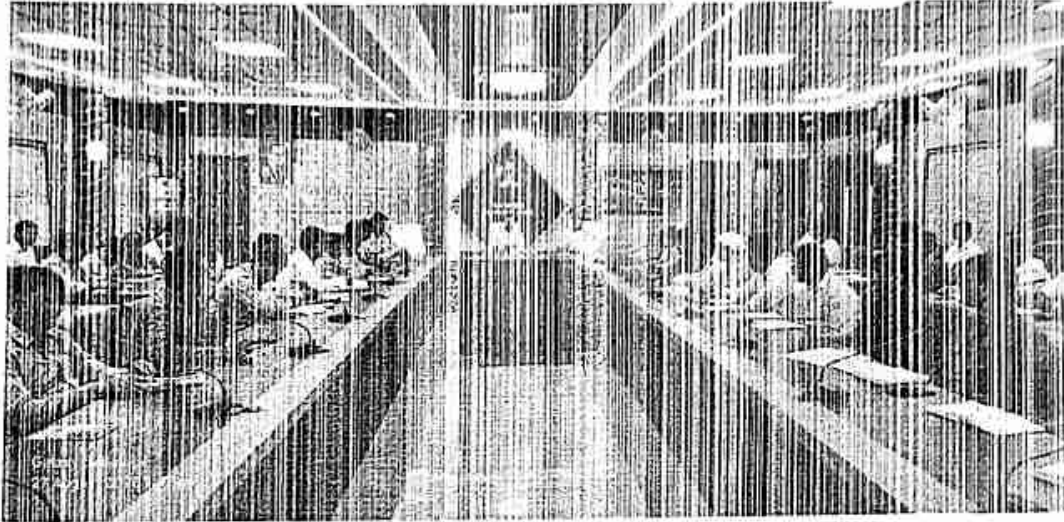

बैठक के दौरान के दौरान JJM Dashbord पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आकड़ों का जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई जो निम्नवत् है-

Table No-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table No-1 के सार्वजनिक अधिप्राप्ति अभियन्ता जल निगम द्वारा अद्यतन कराया गया कि 'समस्त योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village States		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
20	35	07	22	06

Table No.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुस्क्षण (Operation & Maintenance) के अधीन तत्कालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधोस्तरीय द्वारा कार्यदायी फर्म यूनिवर्सल एम0इंफो को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुस्क्षण मद में योजनाओं पर स्वीकृत कार्य को अधिकतम 01 माह में पूर्ण कराते हुये योजनावद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional और Non Functional को Partial Functional में करना सुनिश्चित करे।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Schemes	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Schemes	Total No of Village Financially Completed	No of Physical Not Completed AWP Schemes	Total No of Village Not Completed AWP	No of Financially Not Completed /WTP Schemes	Total No of Village Financially Not Completed AWP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	18	13	18	0	0	0	0	13	18

Table No.-1B में जल निगम (ग्रामीण) की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोस्तरीय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 13 नए पेयजल योजनाएं जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-2 : Physical Progress agency wise

S. No.	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work in Progress			Villages in O&M but not RWS	O&M	
				Total RWS Villages	100% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Person Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Requires O&M	Completed O&M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] Gayatri Projects LTD	36	46	44	18 17 09	22 28	10 13	4 5	2 2	1 1	0	36	34
2	[JJM] UNIVERSAL MEP	154	265	290	215 24 41	144 257	9 29	1 1	0 0	1 1	0	159	157
3	[JJM] Vinodhaya-GAJA (JV)	48	95	80	40 21 19	21 65	8 19	6 11	0 0	5 7	0	48	48
4	[JJM] VSA	297	724	452	240 101 133	119 283	63 147	116 300	41 109	32 114	3	297	305
5	[Jal Nigam] Universal Map	20	35	29	7 1 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		555	1185	915	520 164 223	309 633	82 208	127 317	43 11	39 123	3	539	544

Table No.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत agency wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोस्तरीय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं संबंधित फर्मों को निर्देशित किया गया कि -

- (i)- 319 नए पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित जो Single village एवं Multi-Village Scheme Category में हैं, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित आपूर्ति, जल की गुणवत्ता एवं प्रसार की स्थिति के साथ योजनावार सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

- (ii) मेसर्स सीएचएच द्वारा जो 02 नग पैयजल योजनाओं (147 पाजल ग्राम), मेसर्स इनिमल द्वारा 09 नग पैयजल योजनाओं (29 राजराव ग्राम), मेसर्स गायत्री द्वारा 10 नग पैयजल योजनाएं (13 राजराव ग्राम) तथा मेसर्स सिन्का-गारा द्वारा जो 08 नग पैयजल योजनाओं (10 राजराव ग्राम) ट्रिपल एण्ड रन में हैं, उन सभी योजनाओं को गह्र अक्टूबर 2020 तक संचालन एवं अंशुक्षण में ले जाने को निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- (iii) जिन पैयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उनके पूर्ण क्षमता पर निर्मित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर को साथ जलापूर्ति को निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

S. No.	Type	Total Schemes	Total Villages Covered	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Financial Details (Lakh)			
				Total RWS Villages	$\frac{100\%}{2024-25-26}$ % < 90%	0-5% Villages	Total 100% Schemes Villages	Schemes Villages	0-5% Villages	No RWS Schemes Villages	Estimated Cost	Expenditure		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JMD)	193	193	168	87%	27	40	132	23	33	11	19	71810.33	19718.20
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	10	10	10	100%	4	6	2	0	0	0	0	0	0
Total		203	203	178	88%	31	46	134	23	33	11	19	71810.33	19718.20

Table No.-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पैयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशारी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाएँ हैं, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जा चुका है।

Table No.-3 : RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

S. No.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							C&T RWS disruption(Village)						
		Ther	Power Electrical Issue	Tell e Pump	Road Widening	Damage Villag e Internal Works	Local Repairing	Total	Ther	Pover Electrical Issue	Tell e Pump	Road Widening	Damage Villag e Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	UNIVERSAL MEP	0	0	0	2	2	0	3	0	0	0	2	2	0	3
3	Vindhya-GAJA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	YSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Universal Mep(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	2	2	0	3	0	0	0	2	2	0	3

Table No.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में नियमित जलापूर्ति में व्यवधान की समीक्षा करते हुए अधीक्षताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित विभाग से संपन्चय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aiklan/RPWSS/Road Restoration

S.No.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aiklan	100% Road Rehabilitation Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Gayatri Projects LTD	46	14	13	15	40
2	UNIVERSAL MEP	285	177	169	174	247
3	Vindhya-GAJA (JV)	95	36	14	37	84
4	VSA	724	119	143	95	554
5	Universal Mep (Jal Nigam)	35	35	2	34	0
Total		1185	381	341	335	926

Table No.-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aiklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधीक्षताक्षरी अभियन्ता, उज्जैन जल निगम (ग्रामोण) को अधीक्षताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Detail:

S.No.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1185	1181	1	4	99.55%

Table No.-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामोण वाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं में Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए अधीक्षताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष 04 ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5 : Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Actual/Completed	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	593	590	99.49
2	पंप हाउस	593	581	97.98
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	593	421	70.99
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	539	537/444 (Started/ Completed)	99.63
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	9860	9719	98.57
6	सौर ऊर्जा प्लांट	534	482	90.26

7	परिलू नल कनेक्शन(FITC)	151769	346417	98.43
8	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	5780	5687	98.39
9	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1147	920	80.21
11	कमीशनिंग गाँव	1147	890	77.59
12	नियमित जल आपूर्ति	1147	886	77.21

Table No.-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोदस्ताक्षरी द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि -

- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से मानक गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- फर्म मेसर्स वीएसओएससीएल, मेसर्स विन्ध्या-गाजा, मेसर्स गाजत्री-एमडी एल मेसर्स बुनिगॉल को निर्दिष्ट किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर ले यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमिशन परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उचित के साथ-साथ निर्मित/निर्माणधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उओप्र जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

S. No.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	Gayatri Projects LTD	36	23	4	22	17	4
2	UNIVERSAL MEP	154	149	147	144	142	140
3	Viadhy-GAJA (JV)	48	38	37	34	33	32
4	VSA	297	141	109	119	116	52
5	Jal Nigam	20	0	0	0	0	0
Total		555	351	297	319	308	238

Table No.-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए न्यायिक Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए अधोदस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उओप्र जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या को निर्दिष्ट किया गया कि -

- जो पेयजल योजनाएँ संचालन एवं अनुस्मरण में हैं किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
- जो पेयजल योजनाएँ Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live कराया जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 : Grievance Redressal System

S. No.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	1	3	1	3	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	68	43	25	41	32	9
2	UNIVERSAL MEP	808	794	14	780	768	12
3	Vindhya-GAJA (JV)	129	111	18	108	99	9
4	VSA	778	626	158	496	392	98
5	Universal Mep (Jal Nigam)	56	52	4	9	8	1
Total		1839	1624	219	1428	1299	129

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु स्वीकृत करते हुए अधोदस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 219 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रदूषित क्षेत्रों का विवरण

S. No.	Description	Total Villages	Contaminated Villages	Villages with Schemes	Completion (%)
1	2	3	4	5	6
1	JE/AES	4	4	0	100

Table No.-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/एई प्रदूषित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फ्लोराइड से प्रदूषित 04 ग्रामों में कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

Table No.-9 : Water Quality

S. No.	Test by	Test detail							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village With Contaminated Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trail Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No.-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधोदस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि सनस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच करना सुनिश्चित करें।

Land Availability / Issues

- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि अग्रस्त गंगा नहर पर शिरोपरि जलाशय निर्माण हेतु भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा एवम्बर उपनिवेशवासी और जो जल को स्थिति की जानकारी चाही गई साथ ही निर्देशित किया गया कि अधिशाली शिरोपरि जलाशय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराई। अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कोल नहर एवं सन्त से निर्मित नहरों हेतु भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपनिवेशवासी से सम्बन्ध स्थापित कर भूमि प्राप्त करें। जो जमीन अवगत करने में सहजतरिण तल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सार्वभौम प्रयोजन योजना विकासखण्ड-हरेरदनगंज में शिरोपरि जलाशय निर्माण को स्थिति की जा रही बात करने से रोका जा रहा है परन्तु उपनिवेशवासी देवापुर को सूचित करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिया गया कि उपनिवेशवासी देवापुर से सम्पर्क करते बात की कटाई करें।
- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 25 नम योजनाओं में पंचायतों/ग्रामों से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना संचित है। जिस हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। साथ ही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मिर्जापुर मार्ग पर अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अनेक समस्या है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित प्रमाण पत्र के साथ संपूर्ण रूप से निरीक्षण करते हुए सूचित करें।

Chlorination Details :-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि गत एक माह में 317 नम देवतल योजनाओं से सैम्पल प्रयोगशाला में निरीक्षण हेतु एकत्रित किये गये जिसमें 72 नम सैम्पल जल निगम (ग्रामीण) की प्रयोगशाला द्वारा एकत्रित किया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि 05 नम योजनाओं बलेश्वरी की मात्रा कम है। साथ ही 04 नम देवतल योजनाओं में कम प्रेशर से जलापूर्ति पायी गई। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए निवारण कराया जा रहा है।

Other Issue-Related Instructions :-

- अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में कहा गया कि आपके द्वारा पोर्टल पर दर्शायी गई स्थिति तथा घरतल पर पायी गई स्थिति भिन्न है। कई स्थानों पर नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है तथा कनेक्शन उपलब्ध नहीं माना गया है। जिस पर अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जो योजनाएं संचालन एवं अनुदान में व्रयनित हैं उनमें नियमित जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका निवारण भी कराया जा रहा है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया सभी सहोअभि व जूनिइजीव तथा फर्म के कर्मचारियों द्वारा नियमित निरीक्षण कर जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 1447 नम राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 920 नम राजस्व ग्रामों में 100 प्रतिशत सड़क पुनर्स्थापना का कार्य कर दिया गया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा पोर्टल पर दर्शायी गई स्थिति तथा घरतल पर पायी गई स्थिति से भिन्न है। कई स्थानों से सड़क पुनर्स्थापना से सम्बन्धित कतिपय शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिस पर अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क पुनर्स्थापना का कार्य संतोषजनक रूप से कराया गया है एवं कार्यालय स्तर पर जो आईजीआरएस शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनमें सड़क पुनर्स्थापना से सम्बन्धित शिकायतें बहुत कम हैं। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया सभी जूनिइजीव व सहोअभि तथा फर्म के कर्मचारी सड़क पुनर्स्थापना का कार्य समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- पूरे डीइ बीरबल प्रयोजन योजना विकासखण्ड-हरेरदनगंज में शिरोपरि जलाशय निर्माण के दौरान लेवर के चोटिल होने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जानकारी चाही गई जिस पर अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा पुरानी बांस-बल्ली प्रयोग करने एवं गत एक वर्ष से बांस-बल्ली बंधे होने के कारण घटना हुई है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा काफी रोष व्यक्त करते हुए फर्म को चेतावनी दी गई कि आगे से ऐसी घटना घटित होती है तो आपके विरुद्ध एफओआईआर कराते हुए कार्यवाही की जायेगी। इसके सम्बन्ध में अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सम्बन्धित फर्म को सुरक्षा मानकों के अनुसार कार्य न करने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उन योजनाओं का सत्यापन अन्य विभागों के माध्यम से कराया जाय एवं सुनिश्चित करें कि सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) तथा समस्त सहोअभि/जूनिइजीव को निर्देशित किया गया कि कार्यरत योजनाओं में सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- अधिकासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अतगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग, अयोध्या द्वारा सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के दौरान जल जीवन मिशन अन्तर्गत विद्युती गई पाइप लाइन एवं गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं तथा पाइप लाइन चौड़ीकृत सड़क के नीचे आ जा रही है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थपक्षी द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो पाइप लाइन एवं गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त हो गई है उनकी मरम्मत का प्रावधान करे तथा भविष्य में सड़क चौड़ीकरण कराये जाने से पूर्व पाइप लाइन की शिफ्टिंग हेतु आवश्यक धनराशि प्राकलन में सम्मिलित करे।

Digitally signed by
SHASHANK TRIPATHI
Date: 08-10-2026
19:54:36
अशोक त्रिपाठी
जिलाधिकारी
अयोध्या।

पत्रांक 8579 / M-27 / 171 दिनांक : 09/10/2026
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

- मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
- अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
- अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-4, ज०नि०वि०, अयोध्या।
- समस्त उपजिलाधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित क्षेत्र की योजनाओं में भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा भूमि विवादित है, का निस्तारण कराने का कष्ट करे।
- समस्त खण्ड विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि पूर्ण योजनाओं से हर घर जल प्रमाणीकरण हेतु ग्राम पंचायत सचिव से सत्यापन कराकर प्रमाणीकरण का कार्य कराएं।
- डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, अयोध्या।
- टीम लीडर, टी०पी०आई०, अयोध्या यूनिट।
- मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि० एवं ऐमकी (जे०वी०), हैदराबाद, मेसर्स वी०एस०ए०-एस०सी०एल० (जे०वी०), हैदराबाद, मेसर्स युनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि०, मुम्बई, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक लि०-गाला इंजीनियरिंग प्रा०लि० (जे०वी०), नोएडा-201301 (उ०प्र०)।

Digitally signed by
Arvind Yadav
Date: 09-10-2026
16:50:20
(अरविन्द यादव)
अधिकासी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
अयोध्या।
