



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),

मंझनपुर, कौशाम्बी- 212207

पत्रांक : २१५२ / ११-८ / ५१

दिनांक : १४/०५/२६

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय— समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित खबर "पानी की टंकी से बह रही है मुसीबत, खुदी सड़के बनी परेशानी" की निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में।




महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 14.05.2026 को समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित खबर "पानी की टंकी से बह रही है मुसीबत, खुदी सड़के बनी परेशानी" के सन्दर्भ में प्रकाशित खबर की आख्या निम्नानुसार है:—

कमदूमपुर ढोकसहा पेयजल योजना— जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड— कौशाम्बी के ग्राम— मकदूमपुर ढोकसहा में पेयजल योजना निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 1 नग उच्च जलाशय, 16.224 किमी० पाइप लाइन व 983 नग हाउस कनेक्शन का कार्य प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण, उच्च जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत तथा 13.403 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 841 नग हाउस कनेक्शन का कार्य कराया जा चुका है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 04.25 कि०मी० के सापेक्ष 3.50 कि०मी० सड़के/गलियों को पुर्नस्थापित करा दिया गया है एवं शेष सड़के/गलियों को आवागमन हेतु मोटरबल करा दिया गया है। पाइप लाइन ज्वाइंटिंग व टेस्टिंग के उपरान्त शेष सड़कों/गलियों को पूर्व की भाँति पुर्नस्थापित करा दिया जायेगा एवं शेष कार्य पूर्ण होने के पश्चात जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। योजना को माह— मार्च, 2027 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

मोगरी कड़ा पेयजल योजना— जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड— सिराथू के ग्राम— पोगरी कड़ा में पेयजल योजना निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 1 नग उच्च जलाशय, 8600.00 किमी० पाइप लाइन व 478 नग हाउस कनेक्शन का कार्य प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण, उच्च जलाशय का कार्य 75 प्रतिशत तथा 8.500 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 447 नग हाउस कनेक्शन का कार्य कराया जा चुका है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 04.23 कि०मी० के सापेक्ष 3.90 कि०मी० सड़के/गलियों को पुर्नस्थापित करा दिया गया है एवं शेष सड़के/गलियों को आवागमन हेतु मोटरबल करा दिया गया है। पाइप लाइन ज्वाइंटिंग व टेस्टिंग के उपरान्त शेष सड़कों/गलियों को पूर्व की भाँति पुर्नस्थापित करा दिया जायेगा एवं शेष कार्य पूर्ण होने के पश्चात जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। योजना को माह— मार्च, 2027 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

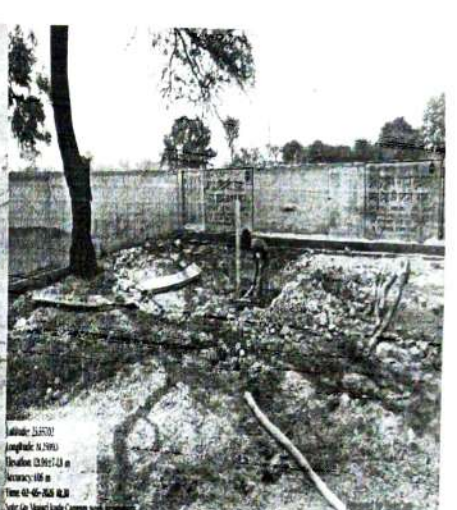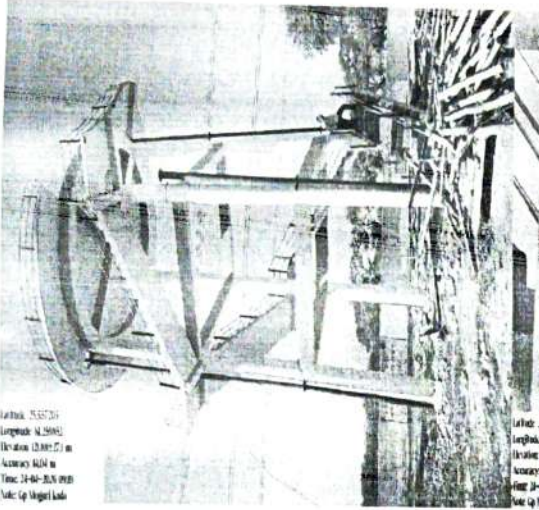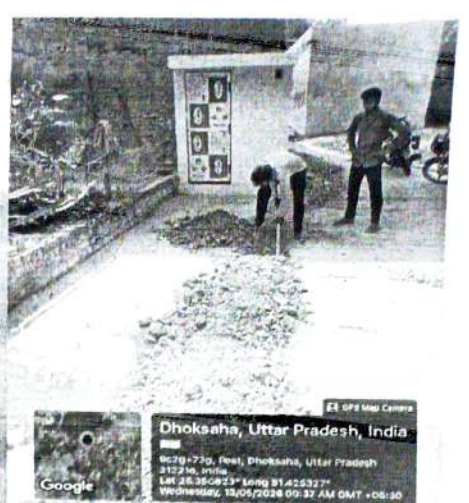

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कौशाम्बी को सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना अधिकारी कौशाम्बी।
4. सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
5. मेसर्स बाबा जी०ए० इन्फ्रा(जे०वी०) को इस निर्देश के साथ प्रेषित की त्वरति गति से समस्त कार्य पूर्ण कराते हुये नियमित क्लोरीनेशन युक्त जलापूर्ति प्रारम्भ करायें।
6. मेसर्स जे०एम०सी०-के०पी०आई०एल० को इस निर्देश के साथ प्रेषित की त्वरति गति से समस्त कार्य पूर्ण कराते हुये नियमित क्लोरीनेशन युक्त जलापूर्ति प्रारम्भ करायें।

अधिशासी अभियन्ता

