


दिनांक 13.12.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के विभिन्न घटकों पर विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में, आ रही समस्याओं के समाधान किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2024 को अपराह्न 12:00 बजे से कलेक्टर, हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसके कार्यवृत्त का अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक—23.12.2024 को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे—

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
2. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
3. शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
4. श्री आशीष बाजपाई, सहायक अभियंता, इल० एण्ड मैकें०, एस.डब्लू.एस.एम., हमीरपुर।
5. श्री नरेन सिंह गिल, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लिं० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
6. श्री मोहनीश शारदा, क्यू.ए./क्यू.सी.इंजी., सेन्सिस टेक लिं० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
7. श्री आर.के.शुक्ला, सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी०, हमीरपुर।
8. अनुराग कुमार सिंह, सहायक अभियंता, एसडब्लूएसएम, हमीरपुर।
9. श्री शैलेन्द्र गुप्ता, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
10. श्री संगम नाथ पाण्डेय, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
11. श्री अमरेन्द्र कुमार सिंहा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
12. श्री प्रमोद, ए.जी.एम. JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
13. श्री राकेश पारिख, डी०पी०एम०, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
14. श्री प्रगांशु गुप्ता, मैनेजर, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
15. श्री सोनू कुमार, मै० अनिल कुमार शर्मा।
16. श्री अरविन्द सिंह, मै० नरेन्द्र कुमार गुप्ता।
17. श्री अशोक कुमार, श्री हरि इन्फ्रा प्रा० लि०।
18. श्री प्रिंस सिंह राजपूत, जय मॉ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन।

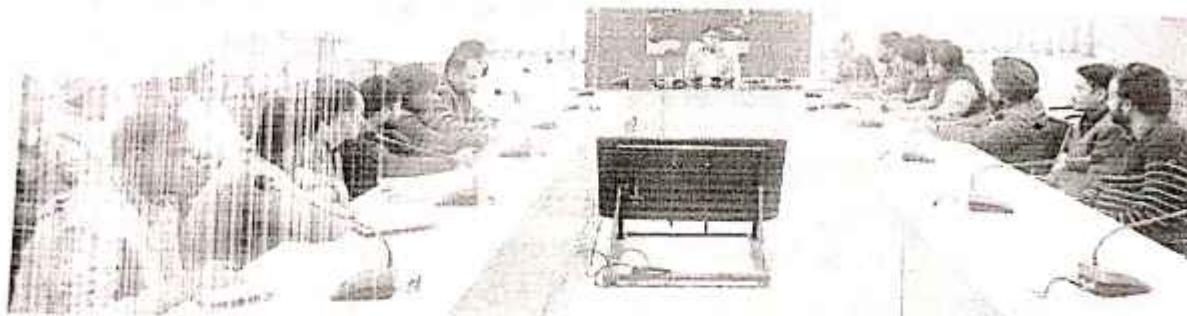

फर्म जे.डब्लू.आई.एल.—एस.पी.एम.एल.(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 131 ग्रामों के सापेक्ष 125 ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण तथा 06 ग्रामों में अवशेष है तथा 13 ग्रामों में हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना शेष है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार विकास खण्ड सुमेरपुर व मौदहा में 154 मार्गों के सी०सी०/बी०ओ०ई०/इंटरलाकिंग

[Signature]

रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है। फर्म के पास पर्याप्त मैनपावर न होने के कारण रोड़-रेस्टोरेशन तथा हर घर जल प्रमाणिकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

कार्यदायी फर्म पी.एन.सी.-एस.पी.एम.एल.(जेबी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 02 ग्रामों में रेस्टोरेशन का कार्य तथा 10 ग्रामों में हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना शेष है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार विकास खण्ड कुरारा, राठ, गोहाण्ड, सरीला व मुरुकरा में 264 गाँवों के सी०सी०/ बी०ओ०ई०/ इंटरलाइंग रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है। फर्म के पास पर्याप्त मैनपावर न होने के कारण रोड़-रेस्टोरेशन तथा हर घर जल प्रमाणिकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर रोड़ रेस्टोरेशन तथा हर घर जल प्रमाणीकरण दिनांक 10.01.2025 के पूर्व पूर्ण करा लिया जाय। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों को कार्य पूर्ण कर औपरेशन एण्ड मेन्टेनेन्स (O&M) में जाना है यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पूरा करा लिया गया है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा ग्रामों में चौपाल लगाकर सत्यापन करा लिया जाय कि माँगों के रेस्टोरेशन व नल संयोजन का कार्य गुणवत्तापूर्ण करा लिया गया है तथा रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन व नियमित रूप से शत-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, सत्यापन आख्या उपलब्ध करायें।

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मै० अनिल कुमार शर्मा द्वारा नलकूप से अवर जलाशय तक पाइप लाइन नहीं डाली गयी है, जिसके कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र नलकूप से अवर जलाशय वो कनेक्ट कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय।

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म श्री हरि इन्हा प्राठिलि० द्वारा 02 अवर जलाशय, 517 नल संयोजन तथा 03 ग्रामों में रोड़-रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। कार्यदायी फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक-02.01.2025 तक अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मैनपावर लगाकर 10.01.2025 तक कार्य पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मै० नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा 01 अवर जलाशय, 800मी० पाइप लाइन, 181 नल संयोजन तथा 02 ग्रामों में 06 माँगों के रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मैनपावर लगाकर 10.01.2025 तक अवशेष कार्य पूर्ण करा लिया जाय।

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मै० जय मॉ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन द्वारा 01 अवर जलाशय, 1.69 किमी० पाइप लाइन बिछाने तथा 10 ग्रामों में रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मैनपावर लगाकर 10.01.2025 तक अवशेष कार्य पूर्ण करा लिया जाय।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय अधिकारी के माध्यम से ग्राम चौपाल का आयोजन कराकर सत्यापन करा लिया जाय कि

—
—
—

Page 2 of 3



Scanned with OKEN Scanner

ग्राम में नव संवर्धन व बौद्ध रेस्टोरेशन का कार्य गुणवत्तापूर्ण पूरा कर सिया गया है, लौही भी गली/ नोहला अवधार नहीं है तथा पूरे ग्राम में रोस्टर के अनुपालन प्रतीक्षित जलापूर्ति की जा सकी है, कार्य क्षमता होने तथा प्राची शिकायतों का लैसित मिसाइम किया जाय। ग्रामों में कार्य पूर्ण होने के बाद योजना हैमध्योवर दिये जाने से पूर्व ग्राम की सुखी बैठक का आदीजन कराया जाय। ग्राम पंचायत/ बदर जलाहयों पर जलापूर्ति का निर्धारित समय, निर्माण वर्षित द्वा नाम व नीजें० तथा योजना का विवरण अकित कराया जाय। जनरल ने कार्यसा आईएसोडॉ० संस्थाओं के नाम से लोगों के जल संरक्षण कोटि के सम्बन्ध में लोगों को जगहक कराया जाय।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को जल संरक्षण के सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाये जाने का सुझाव दिया गया जिसमें वर्षा तथा घरों से बहने वाले प्रवाहों पर जल का संबंधन किया जा सके तथा नूमि का जल सुख बना रहे, जल स्रोतों तथा कन्य संग्रहों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाय।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिकारी अधिकारी, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर, टी०पी०आई० तथा प००५०५०५०५० व्यक्तिगत साथ लेते हुए कार्य नानक के अनुपालन, गुणवत्तापूर्ण तथा स्थीकृत ड्राइंग डिज़ाइन के अनुपालन कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापत्तवाही न दर्शी जाय।

क्षमता में सभी लोगों द्वारा देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(सुरेश कुमार)
अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
Subramanyam Kumar हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

दिनांक-24 दिसम्बर, 2024

पत्र संख्या-८७८/नगंगे-प्र०३०-सा०१०(२०२४-२५)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- प्रबन्ध निदेशक, उठाप० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- अधिकारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- मुख्य अभियंता, एस०डब्लूएस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
- मुख्य अभियंता, उ०५० जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
- अधीक्षण अभियंता, उ०५० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
- अधिकारी अभियंता, उ०५० जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ०५ दिवस के अन्दर अनुपालन आच्या उपलब्ध करायें।
- अधिकारी अभियंता उ०५०, जल निगम (ग्रामीण), विक्रूट। (ई-मेल द्वारा)
- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेनेटर टेक लिंग० (टी०पी०आई०) / सुपरविजन इंजी०, पी०एम०सी० हमीरपुर।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०/जनरल मैनेजर, जे०डब्लूआई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
- पुर्णगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)

अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
Subramanyam Kumar हमीरपुर।

