

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 27.08.2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त –

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 27.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- श्री अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
- 3- जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 4- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बाराबंकी।
- 8- सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 9- सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3/निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, बाराबंकी।
- 10- समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 11- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 12- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी(फिचनर), बाराबंकी।
- 13- श्री अनुराग गंगवार, डी०टी०एल० टीपीआई एजेन्सी (मेधज), बाराबंकी।
- 14- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

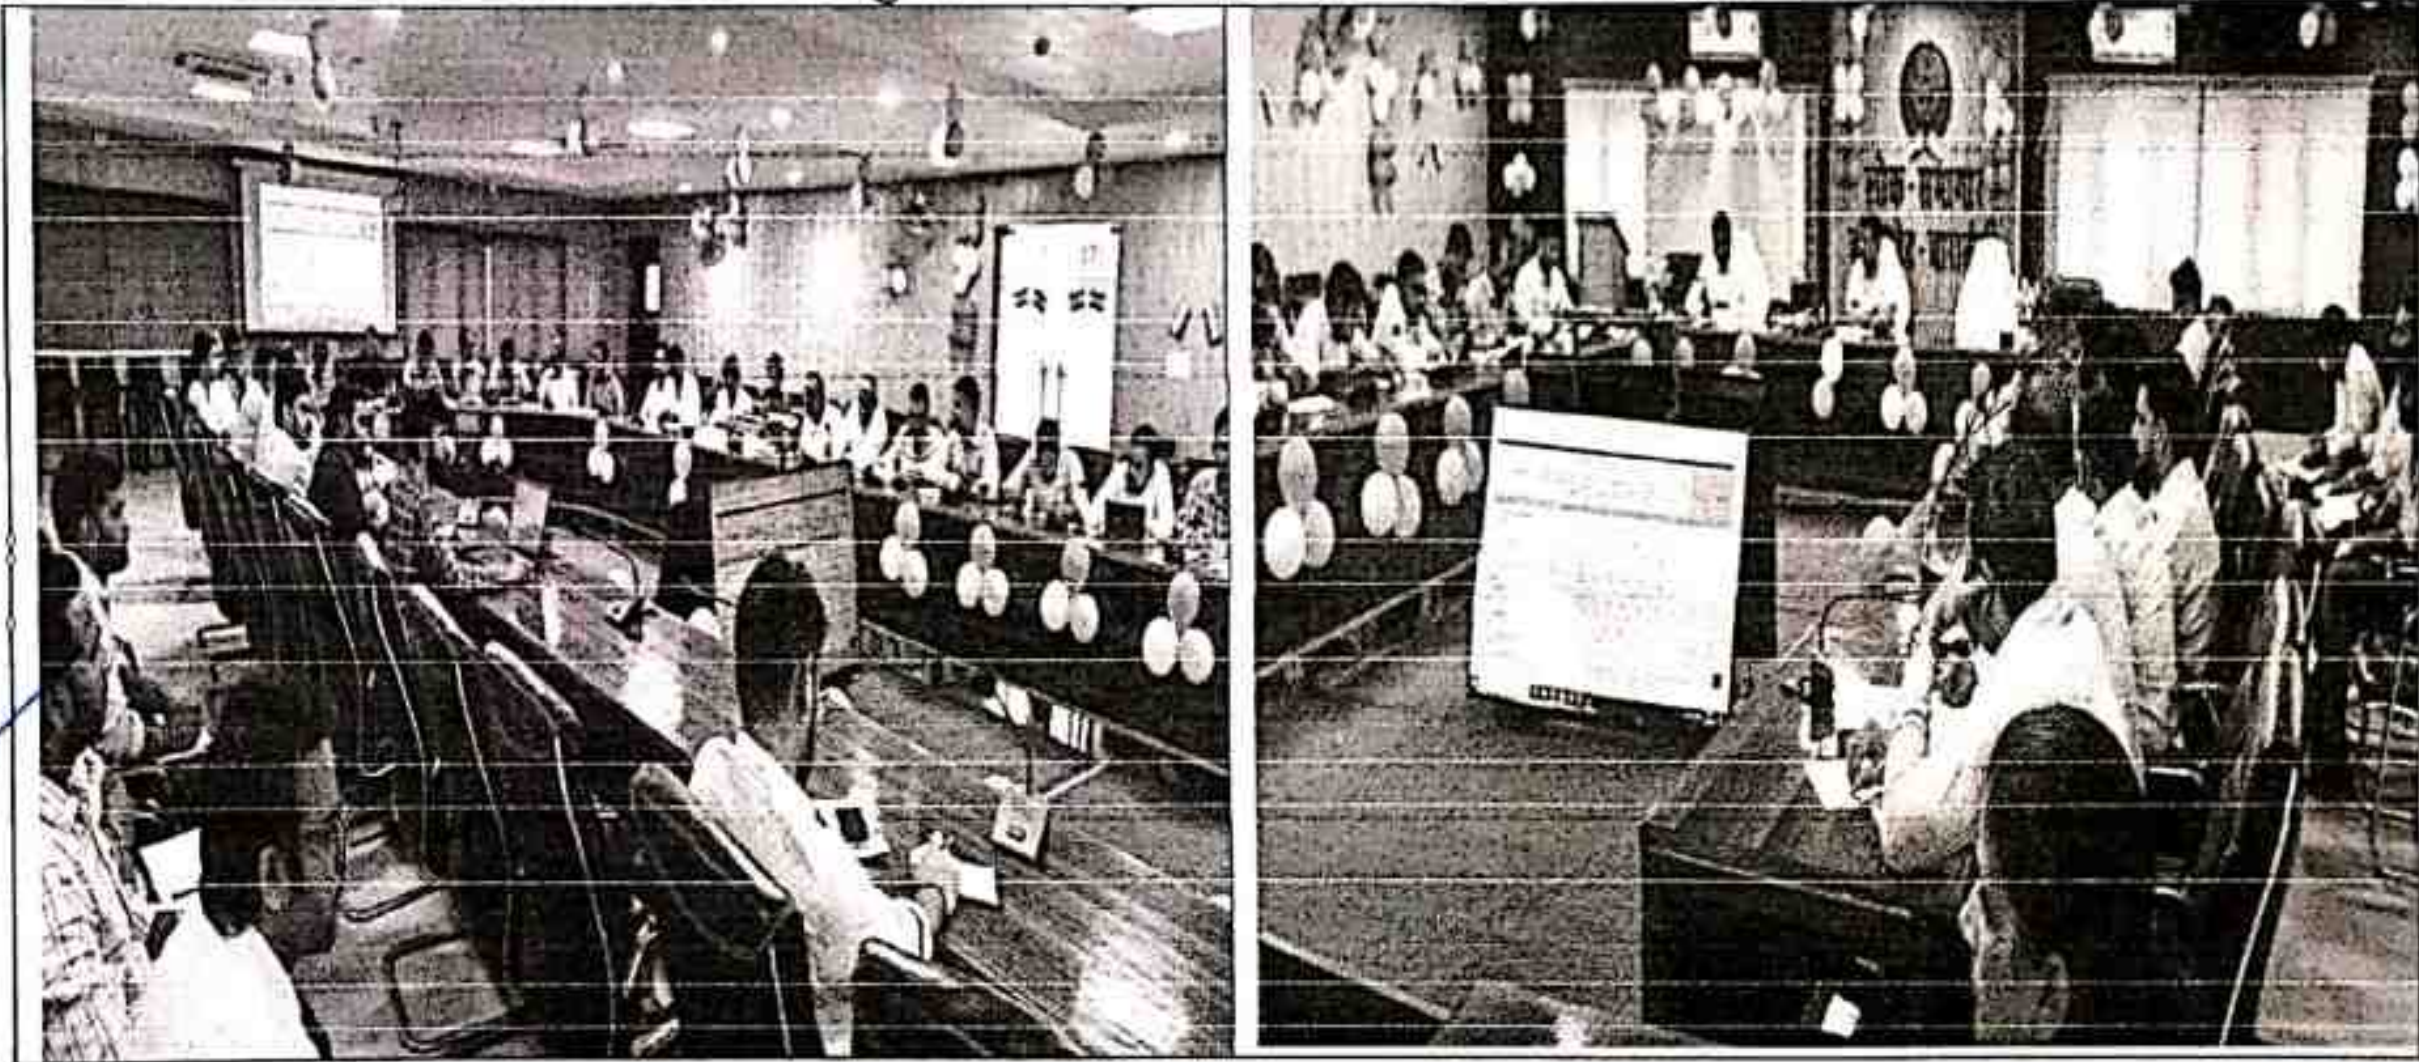


Table – 1 Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत जेजेएम से पूर्व स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं में से जल निगम की कोई भी पेयजल योजना निर्माणाधीन नहीं है।

Table – 1A Jal Operation And Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
118	192	30	123	39

जनपद अन्तर्गत जल निगम की जेजेएम से पूर्व निर्मित 118 नग पेयजल योजनायें हैं, जिसमें 192 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त कार्य हेतु मै0 यूनिवर्सल फर्म जनपद में चयनित हुई है। वर्तमान में मात्र 39 नग राजस्व ग्राम में पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिसे माह सितम्बर, 2026 तक ठीक कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि दो भागों में मरम्मत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसपर कार्य प्रगति पर है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

Table – 1B Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	123	82	123	13	19	0	0	69	104

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम अन्तर्गत कोई भी योजना पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष पेयजल योजनाओं को वित्तीय रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 2 Physical Progress Phase Wise

S no	Agency Name	Total Scheme s	Total Village s	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Village s	100%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes / Villages	Scheme s/ Villages	Direct Pumping Schemes / Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Co mpl ete d OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gayatri Projects LTD	38	59	53	14	9	12	17	11	5	0	39	25
					9	15	16	28	18	6			
					30								
2	Megha	328	579	307	61	40	29	259	129	151	0	328	81
					32	58	55	466	206	260			
					214								
3	PNC-SPML- JV	356	630	478	151	76	68	212	169	88	0	357	124
					93	125	115	390	287	149			
					234								
4	Vindhya- GAJA (JV)	44	96	40	11	10	14	20	5	14	0	46	33
					0	12	36	48	8	35			
					29								

5	VSA	83	222	5	10	7	9	67	32	43	0	84	38
					10	12	23	188	72	3			
					105								
6	Universal Mep	118	192	153	30	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	0	0	0	0	0			
					116								
Total		967	1778	1156	277	142	132	575	346	301	0	854	301
					151	222	245	1120	591	543			
					728								

अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत 849 नग पेयजल योजनाओं में से 142 नग पेयजल योजनाएं अनुसूचण एवं संचालन की श्रेणी में जा चुकी हैं। 132 नग पेयजल योजनाएं ट्रायल एण्ड रन की श्रेणी में हैं, जिसे अनुसूचण एवं संचालन की श्रेणी में अगले माह ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करना एवं समस्त योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु उचित मैनपावर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन राजस्व ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, को शत-प्रतिशत की श्रेणी में एवं 90 प्रतिशत से कम जलापूर्ति वाले ग्रामों को 90-99 प्रतिशत की श्रेणी में लाने के निर्देश दिये गये।

Table – 2A Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
			Certified Village	Total RWS Villages RWS(%)	100 %	O&M Schemes /Villages	Trial Run Schemes/ Villages	Schemes /Villages	Direct Pumping Schemes /Villages	No RWS Schemes /Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99 %										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JIM)	398	398	286	87	82	65	251	142	109	0	401	160	112424.7	6284.4.6
			58	72%	36	82	65	251	142	109					
					163										
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	67	67	58	2	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67	87%	3	67	0	0	0	0					
					53										
Total	Total	465	465	344	89	149	65	251	142	109	0	401	160	112424.7	6284.4.6
			125	74%	39	149	65	251	142	109					
					216										

अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च, 2027 तक समस्त एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। समस्त पेयजल योजनाओं पर वर्तमान में किये गये कार्य के सापेक्ष धनराशि भुगतान होना प्रारम्भ हो गयी है। मै0 पी0एन0सी0 को कुल 179 (एकल ग्राम-152, मल्टीविलेज-27), मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 125 (एकल ग्राम-121, मल्टीविलेज-04), मै0 वी0एस0ए0 को कुल 16 (एकल ग्राम-14, मल्टीविलेज-02), मै0 वी0टी0एल0 को कुल 21 (एकल ग्राम-20, मल्टीविलेज-01), मै0 गायत्री को कुल 24 (एकल ग्राम-21, मल्टीविलेज-03) इस प्रकार कुल 365 नग पेयजल योजनाओं को माह मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाना है। जिस पर मै0 पी0एन0सी0 ने लगभग 1500 नग मैनपावर के सापेक्ष 800 नग मैनपावर, मै0 मेघा ने लगभग 2000 नग मैनपावर के सापेक्ष 700 नग मैनपावर लगा रखी है, जोकि अत्यन्त कम है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 पी0एन0सी0 एवं मै0 मेघा के

भुगतान जब तक उचित मैनपावर न लगायी जाये, तब तक रोकने के निर्देश दिये गये एवं समस्त एजेन्सियों को समयान्तर्गत योजना पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक दिवस वांछित मैनपावर के सापेक्ष कितनी मैनपावर लगी है, का नियमित अनुश्रवण किया जाये एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर द्वारा नियमित पेयजल योजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

Table – 3 RWS Disruption (Village)

No.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electric al Issue	Tullu Pump	Road Wideni ng	Damage Village Internal Works	Local Repairi ng	Total	Thef t	Power Electric al Issue	Tullu Pum p	Road Wideni ng	Damage Village Internal Works	Local Repa iring	To tal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Megha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PNC-SPML-JV	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
4	Vindhya-GAJA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	VSA	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
6	Universal Mep[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	31	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0

अधिकांश अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि नियमित जलापूर्ति वाले कुल 31 नग राजस्व ग्रामों में एवं निर्माणाधीन योजनान्तर्गत 77 नग राजस्व ग्रामों में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी है जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त योजनाओं पर लो0नि0वि0 एवं जल निगम द्वारा पाइप की गहराई की जांच संयुक्त रूप से करने के निर्देश दिये गये।

Table – 4 Certification/Jal Arpan/Jal Ankalan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan (RV)	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Gayatri Projects LTD	59	17	5	16	55
2	Megha	579	18	25	12	441
3	PNC-SPML-JV	630	118	80	85	544
4	Vindhya-GAJA (JV)	96	13	4	7	88
5	VSA	222	16	9	10	188
6	Universal	192	192	3	188	0
Total		1778	374	126	318	1316

जल अर्पण एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन कार्य में वांछित प्रगति न पाये जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। रोस्टर तैयार कर अवशेष जल अर्पण एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 4 A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized (%)
1	2	3	4	5	6
1	1789	1764	1	24	98.60%

जिलाधिकारी महोदय द्वारा आर0पी0डब्लू0एस0एस0 आईडी पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	891	891	100
2	पंप हाउस	891	884	99.21
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	891	540	60.61
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	854	840/301	98.36
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	10289	9595	93.25
6	सौर ऊर्जा प्लांट	807	727	90.09
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	517152	508651	98.36
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	3537	3455	97.68
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1586	1316	82.98
11	कमीशनिंग गाँव	1586	1145	72.19
12	नियमित जल आपूर्ति	1586	1004	63.30

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त राजस्व ग्रामों में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति कराने एवं अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	38	7	0	9	7	0
2	Megha	328	75	59	40	39	33
3	PNC-SPML-JV	356	101	84	76	68	58
4	Vindhya-GAJA (JV)	44	22	13	10	10	7
5	VSA	83	20	14	7	6	5
Total		849	225	170	142	130	103
##	Jal Nigam	118	0	0	0	0	0
Total		967	225	170	142	130	103

अधिकांसी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कुल 142 नग पेयजल योजनाओं अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में जा चुकी है जिसमें 103 नग पेयजल योजनाओं में स्काडा सिस्टम सही तरीके से कार्य कर रहा है जिससे कि पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में लगे स्काडा सिस्टम को लाइव रखने के निर्देश दिये गये।

Table – 7 Grivance Redressal Syestem

I/1389436/2026

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	87	78	9	25	24	1
2	Megha	947	731	216	162	141	21
3	PNC-SPML-JV	976	793	183	287	275	12
4	Vindhya-GAJA (JV)	103	68	35	28	23	5
5	VSA	171	149	22	13	10	3
6	Universal Mep(Jal Nigam)	267	230	37	26	21	5
	Total	2551	2049	502	541	494	47

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में अधिकांश शिकायतों के लम्बित होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी। समस्त शिकायतों का 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	1	0	1	0
2	JE/AES	8	6	2	75

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष फ्लोराइड एवं जेई/एईजे से प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

बन्धे के समानान्तर एवं क्रासिंग हेतु पाइप लाइन विछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Digitally signed by
ISHAN PRATAP SINGH
Date: 07-09-2026
12:42:25

(ईशान प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक

दिनांक

,2026

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2— मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3— जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 4— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/ निर्माण खण्ड-1/निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
- 5— जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 6— अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 7— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 8— अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 9— समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

जिलाधिकारी
बाराबंकी



Table – 7 Grivance Redressal Syestem

I/1389448/2026

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	87	78	9	25	24	1
2	Megha	947	731	216	162	141	21
3	PNC-SPML-JV	976	793	183	287	275	12
4	Vindhya-GAJA (JV)	103	68	35	28	23	5
5	VSA	171	149	22	13	10	3
6	Universal Mep(Jal Nigam)	267	230	37	26	21	5
	Total	2551	2049	502	541	494	47

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में अधिकांश शिकायतों के लम्बित होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी। समस्त शिकायतों का 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	1	0	1	0
2	JE/AES	8	6	2	75

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष फ्लोराइड एवं जेई/एईज से प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

बन्धे के समानान्तर एवं क्रासिंग हेतु पाइप लाइन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(ईशान प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक / दिनांक ,2026

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2— मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3— जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 4— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/ निर्माण खण्ड-1/निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
- 5— जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 6— अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 7— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 8— अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 9— समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

Digitally signed by
ISHAN PRATAP SINGH
Date: 07-09-2026
12:43:24

जिलाधिकारी
बाराबंकी
