

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, झोंसी की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 12.09.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद झोंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहे -


क्र.सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जुनैद अहमद	मुख्य विकास अधिकारी, झोंसी।
2	श्री राजय कुमार पाण्डेय	अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति झोंसी।
3	श्री सुनील कुमार	जिला विकास अधिकारी, झोंसी।
4	श्री जगदीश राम गौतम	जिला पंचायत राज अधिकारी, झोंसी।
5	श्री रणविजय सिंह	अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्या, उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
6	श्री विजय कुमार	अधि०अभि०, लिपट कैनाल डिवीजन राजघाट, सि. वि. झोंसी।
7	श्री आर.एन. ताल,	अधि.अभि., नि.ख.-3, लो०नि०वि०, झोंसी।
8	श्री आर.एस. सिंह बादलीवाल	अधि.अभि. झोंसी डिवीजन जल संस्थान, झोंसी।
9	श्री हिमांशु नेगी	परि०प्रब०, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
10	श्री राजीव कठेरिया	सहा.अभि., निर्माण इकाई, उ.प्र. जल निगम, झोंसी।
11	श्री दिनेश बाबू मिश्रा	सहा०अभि०, सिंचाई निर्माण खण्ड, सि.वि., मऊरानीपुर।
12	श्री शैलेन्द्र कुमार सेठी	सहा०अभि०, झोंसी प्रखण्ड वेतवा नगर, झोंसी।
13	श्री दीपाकर राय	सहा०अभि०, सपरार प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, झोंसी।
14	श्री राजेश कुमार गुप्ता	टीम लीडर, टी.पी.आई., झोंसी।
15	श्री श्रीनिवास मिश्रा	टीम लीडर, पी.एम.सी., झोंसी।
16	श्री विजय लोखण्डे	प्रोजेक्ट मैनेजर, एन.सी.सी., झोंसी।
17	श्री लक्ष्मीनारायण	प्रोजेक्ट मैनेजर, बी.जी.सी.सी., झोंसी।
18	श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति	प्रोजेक्ट मैनेजर, आई.एच.पी., झोंसी।
19	श्री विशाल	प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिप्रो टेक्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर, झोंसी।
20	श्री नारायण दास	प्रोजेक्ट मैनेजर, दारा इंजीनियरिंग, झोंसी।

बैठक में जिला पंचायत अधिकारी, झोंसी द्वारा द्वारा अगवत कराया कि जनपद झोंसी के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा संचालित 114 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में से वर्तमान में 93 नग पूर्ण क्षमता पर, 01 नग आंशिक, 17 नग पूर्ण बन्द एवं 03 नग आंशिक क्षमता पर चालू हैं, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी को निर्देशित किया गया कि उक्त आंशिक क्षमता पर चालू एवं पूर्ण बन्द 21 नग ग्रामों को जल जीवन मिशन के अनुरूप संतृप्त किये जाने हेतु ग्रामों का विवरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	आंशिक, पूर्ण बन्द एवं आंशिक क्षमता पर चालू पेयजल योजनाओं का विवरण	वर्तमान स्थिति
	17 + 4 = 21 योजनाएं	- वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में पूर्व से सम्मिलित योजनायें - 18 नग - जल जीवन मिशन में सम्मिलित करने हेतु योजनायें - शून्य - पूर्व से निर्माणाधीन रेट्रोफिटिंग में सम्मिलित योजनायें - शून्य - जल जीवन मिशन में प्रस्तावित रेट्रोफिटिंग हेतु योजनायें - 3 नग

जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित पेयजल योजनाओं पर ग्राम प्रधान द्वारा तैनात किये गये कार्मिकों द्वारा मोटर न चालने के कारण ग्रामों की जलापूर्ति प्रभावित हो रही है, जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेशित किया गया कि अपने स्तर से समस्त ग्राम प्रधानों को निर्देशित कर योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित कराना सुनिश्चित करें तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद झॉसी के समस्त ग्रामों का सत्यापन कराते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कोई भी राजस्व ग्राम/पुरवा/मजरा पाईप पेयजल विहीन न हों।

(कार्यवाही- जिला पंचायती राज अधिकारी, झॉसी।/अधि०अभि० जल निगम (ग्रामीण)

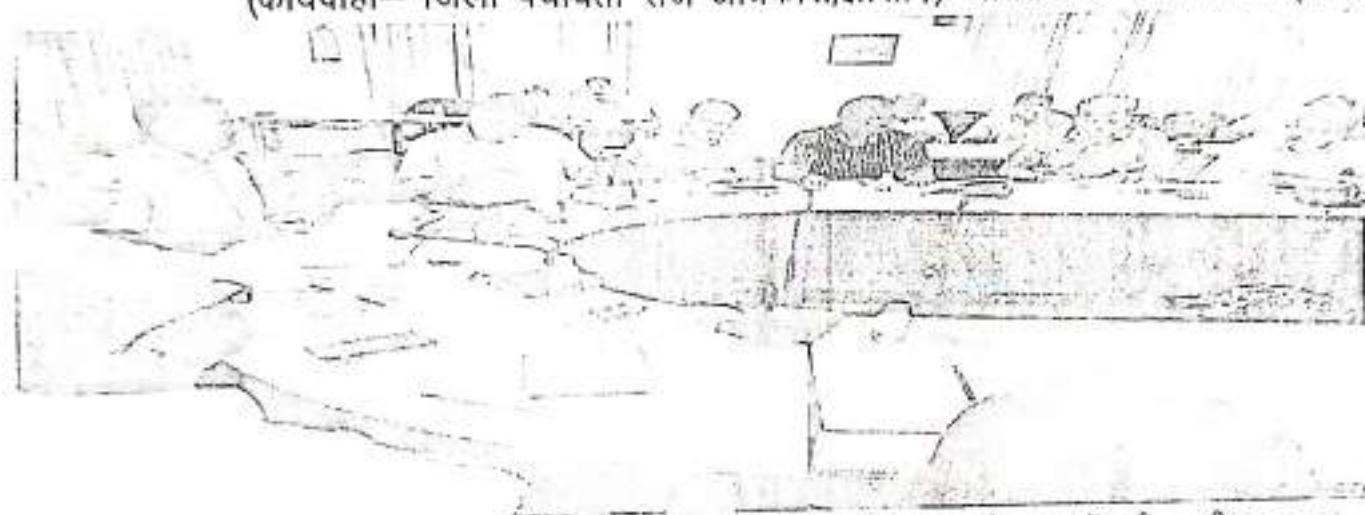

जल संस्थान, झॉसी द्वारा अनुरक्षित एवं संचालित पेयजल योजनाओं की समीक्षा करने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद झॉसी के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा 27 नग पेयजल योजनाओं का संचालन/रखरखाव किया जा रहा है, जिनमें कुल 184 ग्राम सम्मिलित हैं। उपरोक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों में से 84 ग्राम चालू एवं 100 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बन्द है, जिसपर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), झॉसी को उपरोक्त 100 नग बन्द ग्रामों को जल जीवन मिशन के अनुरूप संतृप्त किये जाने हेतु विवरण, ग्रामों की सूची सहित अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :-

क्रम सं०	योजना ओं की संख्या	योजना में सम्मिलित कुल ग्रामों की संख्या	योजना में सम्मिलित ग्राम		जल संस्थान द्वारा अनुरक्षित योजनान्तर्गत सम्मिलित बन्द ग्रामों की वर्तमान स्थिति					टिप्पणी
			चालू	बन्द	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन या स.पे.यो. में पूर्ण र. सम्मिलित ग्राम	जल जीवन मिशन में सम्मिलित करने हेतु ग्राम	पूर्व से निर्माणाधी न रेट्रोफिटिंग में सम्मिलित ग्राम	जल जीवन मिशन में रेट्रोफिटिंग हेतु प्रस्तावित ग्राम	जल निगम द्वारा अनुरक्षित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27	184	84	100	78	4	4	12	2	—


अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 06 नगर निगमों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिस पर अन्य नगरों में पेयजल की समस्या के निदान हेतु की जा रही कार्यवाही की जानकारी अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, झोंसी से चाही गई, जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि चिरगाँव नगर की पेयजल मांग को पूरा करने के 02 नग निजी नलकूपों के माध्यम से टैंकरों का संचालन कराते हुये चिरगाँव नगर की पेयजल मांग को पूरा किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में प्रस्तुत पुस्तिका में अंकित सूचना एवं अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, झोंसी द्वारा दी गई जानकारी में भिन्नता होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, झोंसी को निर्देशित किया गया कि आगामी 03-04 दिनों में स्थिति स्पष्ट करते हुये संशोधित प्रगति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, झोंसी/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), झोंसी)

जल निगम द्वारा अनुसूचित 06 नग पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/ जल संस्थान, झोंसी को अविलम्ब हस्तान्तरित करने तथा निर्माणाधीन रनगुवां ग्राम समूह पेयजल योजना के समस्त जोनों में शीघ्र पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करते हुये योजना के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), झोंसी/जिला पंचायत राज अधिकारी, झोंसी/अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, झोंसी)


अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-11 के कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान अनुबन्धित फर्म मैरार्स तहल के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया तथा सहायक अभियन्ता, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झोंसी को अनुबन्धित फर्म को नोटिस जारी करते हुये उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित करते हुये आगामी बैठक में अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि के साथ ही प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गया।

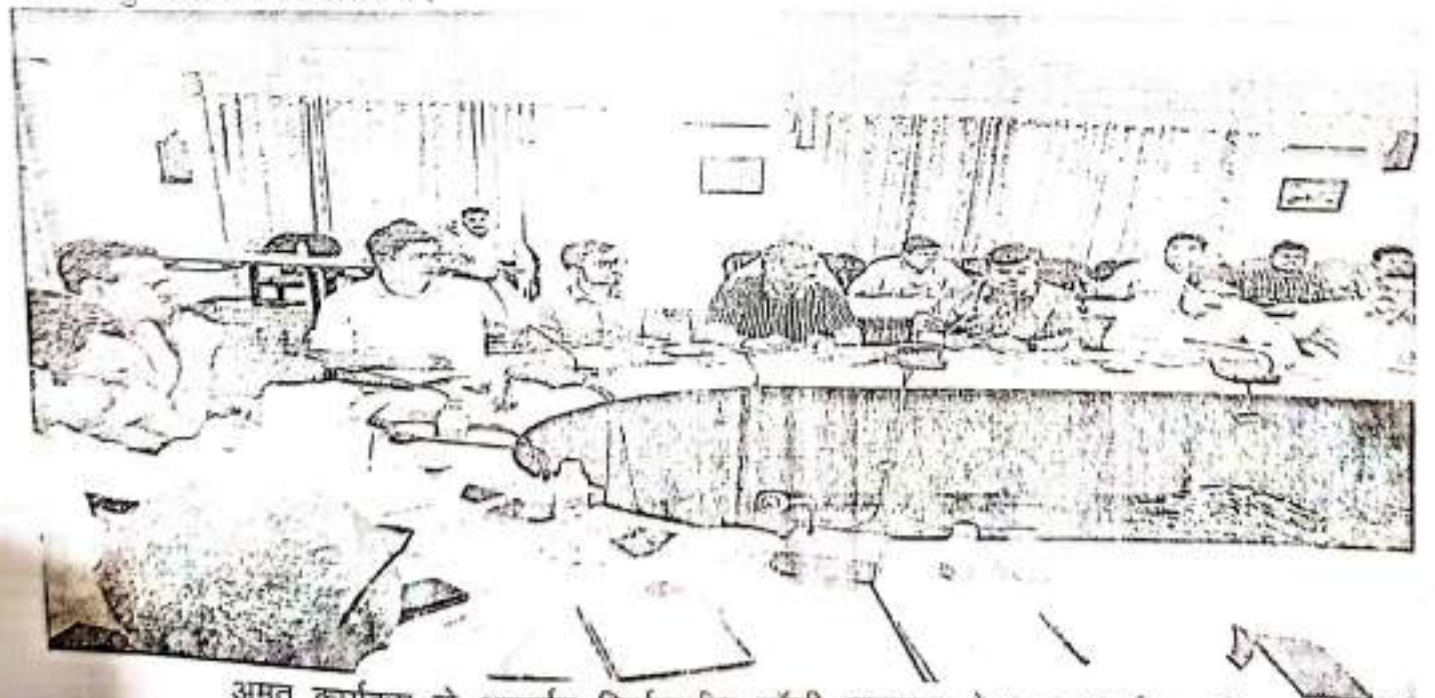

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन झोंसी महानगर पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिस पर परियोजना प्रबन्धक, अतिरिक्त निर्माण इकाई, जल निगम, झोंसी

अवगत कराया गया कि प्रथम फेज में प्रस्तावित समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत प्रस्तावित 26000 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 18000 गृह संयोजन किये जाने का पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष 8000 नग गृह संयोजनों के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, अतिरिक्त निर्माण इकाई, जल निगम, झॉंसी द्वारा अवगत कराया गया कि शेष गृह संयोजनों को जल संस्थान, झॉंसी द्वारा सिविल लाईन जोन एवं मिशन कम्पाउण्ड जोन में प्रस्तावित पाईप लाइन को इन्डेक्स मैप पर इंगित करते हुये उपलब्ध कराने के उपरान्त उपरोक्त शेष 8000 नग गृह संयोजनों का कार्य करा दिया जायेगा। (कार्यवाही- परियोजना प्रबन्धक, अतिरिक्त निर्माण इकाई, जल निगम (नगरीय) / अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, झॉंसी)

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झॉंसी द्वारा अवगत कराया गया कि इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल का कार्य जल भराव के कारण बन्द है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजना पर कार्यों को कराने हेतु लगाये गये श्रमिकों की जानकारी चाही गई, जिस अपर जिलाधिकारी, झॉंसी द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबन्धित फर्म द्वारा वर्तमान में मात्र 27 श्रमिकों के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, जिससे योजना की प्रगति अत्यन्त धीमी है। इसी प्रकार विकास खण्ड गुरसराय में निर्माणाधीन बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना, जिसमें 92 ग्राम सम्मिलित है योजना के कार्यों को मात्र 93 श्रमिक एवं टेहरका ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट पर मात्र 75 श्रमिकों द्वारा ही कार्यों को कराया जा रहा है।

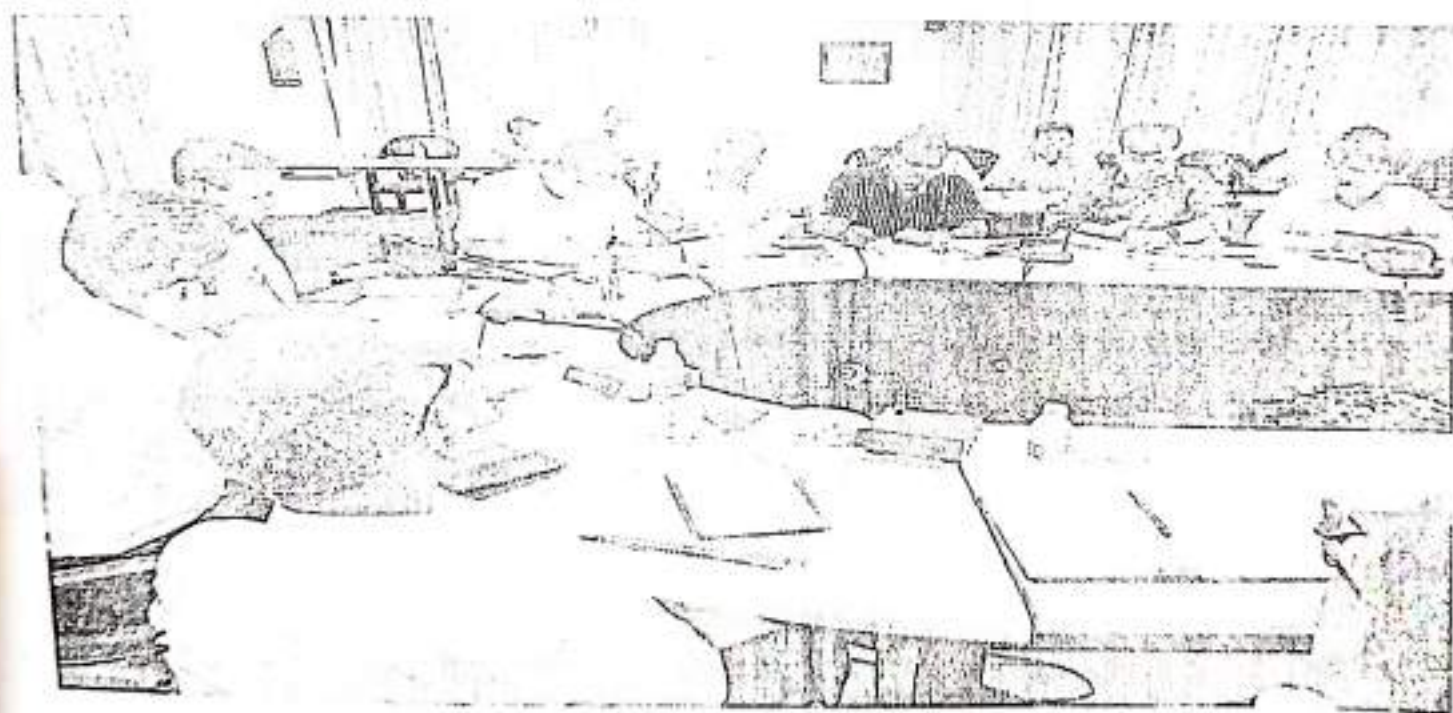

कुरेछा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा करने पर अनुबन्धित फर्म के ए.जी. एम. श्री ओ.वी.एस.एस. मूर्ति द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत 84 ग्राम सम्मिलित है। योजनान्तर्गत निर्माणाधीन 14 नग ओवर हैड टैंको में से 12 नग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट के सिविल कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, विद्युत/यॉंत्रिक सम्बन्धी कार्य अवशेष है। योजना के समस्त कार्य को माह दिसम्बर-2022 तक पूर्ण करते हुये योजना को पूर्ण क्षमता पर चालू करते हुये पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। इसी प्रकार अनुबन्धित फर्म मैसर्स द्वारा इंजीनियरिंग के

परियोजना प्रबन्धक श्री नारायण द्वारा अवगत कराया गया कि शितम्बर-2022 तक योजना में आंशिक जलापूर्ति चालू करते हुये योजना को माह नवम्बर 2022 तक पूर्ण क्षमता पर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी।

बरवार ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा करने पर कर्मा हेतु अनुबन्धित फर्म मैसर्स यूनिप्रो देवनों इन्फ्राटेक के प्रतिनिधि श्री निशाज द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दो जोन (खिरिया एवं बका पहाड़ी) में 25 अक्टूबर, 2022 तक आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगा।

गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि माह फरवरी-2022 में योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इन्टेक वेल 70 सेमी. नदी की ओर झुक गया था, जिसे अनुबन्धित फर्म द्वारा अभी सीधा नहीं किया जा सका। अनुबन्धित फर्म द्वारा उक्त इन्टेक वेल के स्थान पर दूसरे इन्टेक वेल के निर्माण हेतु महमति व्यक्त की गयी है, जिसके निर्माण हेतु जल निगम द्वारा भूमि चिन्हित करते हुये उपप्लॉट कराई जा चुकी है। परन्तु अनुबन्धित फर्म द्वारा वर्तमान तक दूसरे इन्टेक वेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिस पर अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री विजय लोखण्डे द्वारा अवगत कराया गया गया है कि मुद प्रौक्षण कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही दूसरे इन्टेक वेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जिन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झोंसी का निर्देशित किया गया कि अनुबन्धित फर्म से लिखित रूप से यह प्राप्त कर लिया जाये कि उनके द्वारा दूसरे इन्टेक वेल का कार्य किस तिथि से प्रारम्भ किया जायेगा।

तिलैथा ग्राम समूह पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा करने पर अनुबन्धित फर्म के डी.जी.एम. श्री विजय लोखण्डे द्वारा अवगत कराया गया गया है कि माह नवम्बर-2022 में योजना में गृह संचयनों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

वैठक के दौरान जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन समस्त 10 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों को गुणवत्तापूर्वक एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सम्पन्न कर मशीनरी की संख्या बढ़ाते हुये तीव्र गति से कराने हेतु समस्त अनुबन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया तथा उन्हें यह भी निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत ग्रामों में खोदी गई लडकों एवं गलियों को गड़ें लड्डन बिछाने के उपरान्त शीघ्र मॉन्टरेविल करना सुनिश्चित करें ताकि ग्रामवासियों को आसम्भन में किसी प्रकार की गड़नाई न हो।


(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झोंसी/अधि. अभि. जल निगम (ग्रामीण)/समस्त कार्यदायी संस्था)

योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता/विश्लेषण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा अर्द्ध वार्षिक इन्स्पेक्शन (डी.पी.आई) हेतु वरिष्ठ मैसर्स बी.एल.जी. के डी.पी.एम. श्री राजेश सटार से योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांचनरी माही गई, जिस पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब न दिये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रीप व्यक्त किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि आंशिक जलापूर्ति प्रारम्भ किये गये ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुचारु बनाये रखने एवं आवश्यक कार्रवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें।

(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/अधि.अभि. जल निगम (ग्रामीण)/समस्त कार्यदायी संस्था)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी को अवगत किया गया, कि योजनाओं के कार्यों को गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा अनुबन्धित पीएमसी एवं टीपीआई के टीम लीडर/डिप्टी टीम लीडर को पृथक-पृथक नियुक्त करते हुये उनके द्वारा किये जा रहे समस्त क्रियाकलापों से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी/अधि. अभि. जल निगम (ग्रामीण)।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।


(संजय कुमार पाण्डेय)

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
झाँसी।

अनुमोदित


जिलाधिकारी
झाँसी।

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, झाँसी।

पत्रांक- 1808/एसटी0/नमामि गंगे, लखनऊ, 2022/एम-28 दिनांक 19/9/2021

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाएँ एवं अवगतगर्ण प्रेषित। /151

- 1- मा0 प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ0 प्र0 लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी।
- 4- सभी सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार पाण्डेय)

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
झाँसी।
