

—: टीप एवं आख्याएं :-

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल" उपलब्ध कराने के क्रम में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा जनपद-बलरामपुर में पाइप पेयजल योजना के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक 21.02.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की आयोजित बैठक की कार्यवृत्त का पत्रालेख पत्रावली में दायीं ओर रक्षित है।

कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।


अधिसासी अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
बलरामपुर।



जल जीवन मिशन—“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत दिनांक 21.02.2025 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम—“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत जनपद—बलरामपुर में नामित एजेन्सी— मे. लारसेन एण्ड टूब्रो चेन्नई एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) द्वारा पाइप पेयजल योजना के कार्यों की प्रगति एवं आई०एस०ए० द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार, बलरामपुर में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. जिला पंचायती राज अधिकारी, बलरामपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद—बलरामपुर।
4. परियोजना प्रबन्धक मे० लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
5. उप परियोजना प्रबन्धक, मे० दारा इन्जीनियरिंग, बलरामपुर।
6. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बलरामपुर।
7. टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), देवीपाटन ब्लस्टर, गोण्डा।
8. डिप्टी टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), बलरामपुर।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा जनपद—बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी— मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, (J/V) मेसर्स इको प्रोटेक्शन द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं पर किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में पी०पी०टी० के माध्यम से अवगत कराया गया।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि० को आवंटित 199 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 113 नग योजनाओं पर ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 86 नग योजनाओं पर ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था द्वारा 199 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 199 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 185 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 14 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 199 नग योजनाओं के सापेक्ष 181 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 96 नग सोलर पैनल संचालित है। शेष 18 नग सोलर पैनल अधिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 2103 कि०मी० के सापेक्ष 2095 कि०मी० बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 8 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। 109694 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 82950 नग पेयजल कनेक्शन लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा 295 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 161 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत “हर घर जल” प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 128 नग राजस्व ग्राम को “हर घर जल” प्रमाणित किया गया है। फर्म 154 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है। 96 नग पाइप पेयजल योजनाओं में ओ०एच०टी० के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि० द्वारा ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गृह जल संयोजन की ग्राउटिंग एवं वितरण प्रणाली का कार्य पुलिया क्रासिंग में मानक अनुसार नहीं किया गया है।

निर्देश:

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे० लारसेन एण्ड टूब्रो के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि अवशेष 86 नग ओ०एच०टी० का शत प्रतिशत कार्य मार्च, 2025 तक कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पिछली बैठक के सापेक्ष आगामी बैठक में कार्यों की तुलनात्मक स्थिति से अवगत करायें। फर्म द्वारा दिये जा रहे गृह जल संयोजन की ग्राउटिंग का कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही— अधि० अभि०, जल निगम(ग्रामीण)/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे0वी0) को आवंटित 430 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 67 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष 363 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था द्वारा 430 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 361 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। शेष 69 नग ट्यूबवेल का कार्य प्रगति पर है। 430 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 252 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 178 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 430 नग योजनाओं के सापेक्ष 261 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 119 नग सोलर पैनल संचालित है। शेष 169 नग सोलर पैनल अधिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 4558 कि0मी0 के सापेक्ष 4515 कि0मी0 बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 43 कि0मी0 पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। 177424 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 165874 नग पेयजल कनेक्शन लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा 595 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 103 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत "हर घर जल" प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 68 नग राजस्व ग्राम को "हर घर जल" प्रमाणित किया गया है। फर्म 185 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा मात्र 57 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं पर पर्याप्त मैनपावर न उपलब्ध हो पाने के कारण निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी है। जबकि सदस्य सचिव द्वारा फर्म को विभिन्न पत्रों के माध्यम से मैनपावर की वृद्धि एवं कार्यों में अपेक्षित प्रगति के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता रहा है।

निर्देश:

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे0 मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन (जे0वी0) के कार्यों की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अधि0अभि0 जल निगम ग्रामीण अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रमुख सचिव नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ को पत्र प्रेषित कराएं। निर्देशित किया गया कि योजना के सभी घटकों पर आवश्यक मैनपावर की वृद्धि करते हुए योजना के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- अधि0 अभि0, जल निगम(ग्रामीण)/ मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0।

निर्देश:

अधोहस्ताक्षरी द्वारा मे0 सेन्सिस टेक लि., (टी.पी.आई.) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की प्रयोगशाला में नियमित जांच कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही फर्मों द्वारा जिन पेयजल योजनाओं पर जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी गयी है वहां टीम के माध्यम से स्थलीय सत्यापन कराकर आगामी बैठक में रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- जनपदीय टीम लीडर, मे0 सेन्सिस टेक लि., (टी.पी.आई.)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



अधिशाली अभियन्ता भूगर्भ जल
(सदस्य)

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

(संदीप सिंह)

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

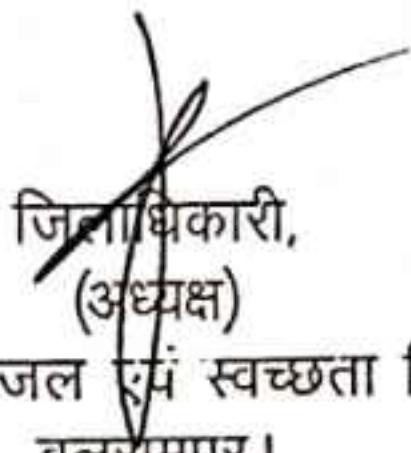
जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।


प्रभागीय वन अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।


जिला पंचायती राज अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।


जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बलरामपुर।

पत्रांक : ५६९ / २१०-१ / २८३ दिनांक- ३/३/२०२५

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
7. उप परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग जे०वी० इको प्रोटेक्शन, बलरामपुर।
8. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता
