


जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 21.05.2026 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त—

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 21.05.2026 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया—

1. श्री सुमित राजेश महाजन, मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
2. मो० हाशिम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
3. श्री राम दत्त, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
4. श्री दुष्यन्त कुमार, अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
5. श्री पंकज कुमार, अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
6. श्री अमित कुमार, अवर अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर।
7. श्री शरद अग्रहारी, उप परियोजना प्रबन्धक, मै० आरबी एसोसिएट्स (TPI), सहारनपुर।
8. श्री सचिन कुमार, परियोजना प्रबन्धक, मै० बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सहारनपुर।
9. श्री शिवम अग्रवाल एवं अनुराग कुमार मै० जी०ए० बाबा इन्फ्रा (जे०वी०), सहारनपुर।
10. मै० आकिब खान, परियोजना प्रबन्धक, मै० जी०ए० बाबा इन्फ्रा (जे०वी०), सहारनपुर।

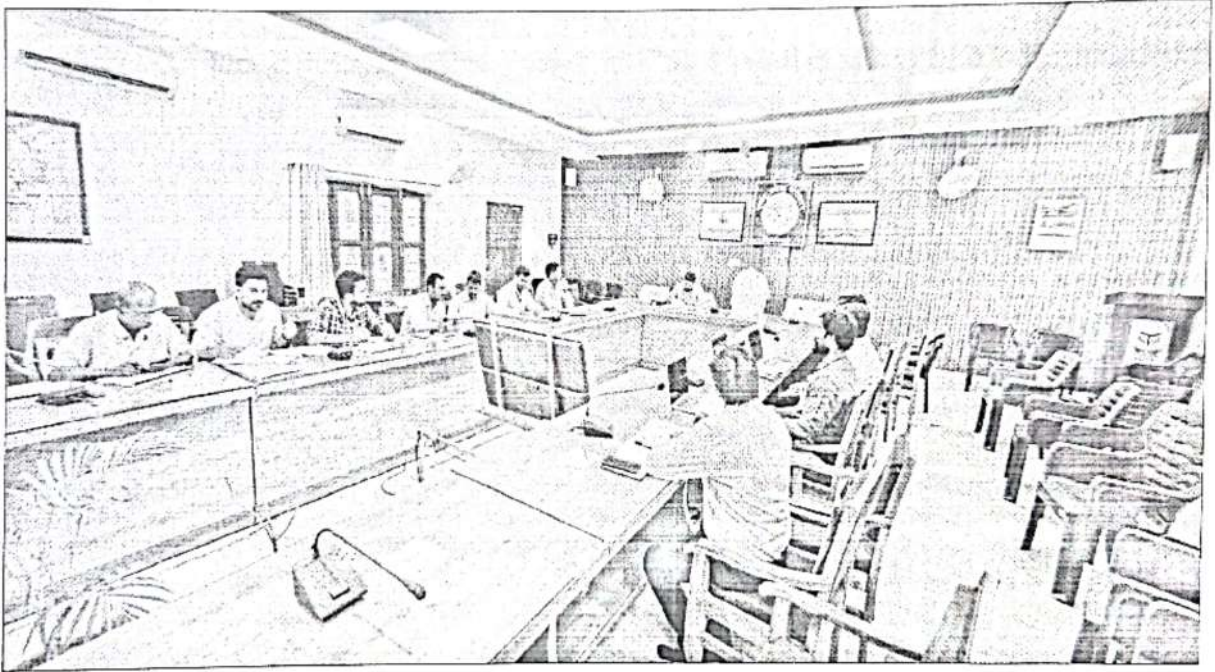

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 21.05.2026 को आहूत की गयी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा सभी फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त बैठक में प्रतिभाग किया गया। सर्वप्रथम मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद सहारनपुर में आवंटित धनराशि के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में मै० बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को रू० 2.50 करोड़, मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा को कुल रू० 26.00 करोड़ (20.00 करोड़ जी०ए० इन्फ्रा एवं रू० 6.00 करोड़ मै० बाबा जेवी०) की धनराशि अवमुक्त करायी गयी है। उक्त अवमुक्त धनराशि रू० 2.50 करोड़ का व्यय करते हुये मै० बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 09 योजनाओं (सूची संलग्न) तथा अवमुक्त धनराशि रू० 26.00 करोड़ का व्यय करते हुये मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा द्वारा 43 नग योजनाओं (सूची संलग्न) के समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए (O&M) ओपरेशन एवं मैनटेनेन्स में ले जाया गया है। मै० एन०के०जी० प्राइमस (जेवी०) के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, सहारनपुर को निर्देश दिये गये कि मै० एन०के०जी०

MS/D:\SRE Of. Wo./Le.23/DM.M.11

[Signature]
DM, DPM, TPI. K

[Signature]
AE JE

[Signature]

प्राईमस (जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में उपस्थित नही होने के सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर के माध्यम से पत्र प्रेषित कराया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राईमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 119 योजनाओं जिनमें निर्माण कार्य 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण है, अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कर O&M (अनुरक्षण एवं संचालन) में ले जाने हेतु कितना समय लगेगा, की कार्य योजना तैयार कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राईमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा O&M (अनुरक्षण एवं संचालन) में ले जायी गयी योजनाओं तथा हर-घर-जल प्रमाणीकरण करायी गयी योजनाओं में गिनता होने के विषय में जानकारी ली गयी जिसमें फर्म प्रतिनिधि मो0 आकिब खान मै0 बाबा-जी0 इन्फ्रा के द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष योजनाओं के ग्राम प्रधानों द्वारा पेयजल योजनाओं के हर-घर-जल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नही किये जा रहे है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय से जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से हर-घर-जल प्रमाणीकरण करने हेतु ग्राम पंचायतों को पत्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राईमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी0।)


मै0 बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0

अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में मै0 बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 को 127 नग पेयजल योजनाये (184 राजस्व ग्राम) के कार्य आवंटित किये गये है। फर्म द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 73399 नग गृह संयोजन प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 66503 नग गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं। 113 नग ग्रामों में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण करते हुए 64 ग्रामों में अवर जलाशय एवं डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 49 पेयजल योजनाओं जिनमें पाईप लाईन एवं गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिये गये है उन योजनाओं में 02 सप्ताह में जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये है। पाईप लाइन बिछाने हेतु कुल 556.07 किमी0 सड़कें तोड़ी/काटी गयी है, जिसके सापेक्ष 465.95 किमी0 सड़कों के पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अवशेष 90.12 किमी0 सड़क पुर्नस्थापन कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। 29 नग पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये है जिसमें से 09 पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण कर O&M (अनुरक्षण एवं संचालन) में ले जाया गया है तथा 09 ग्रामों को हर-घर-जल प्रमाणीकरण कराया गया है। निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अवशेष 20 पेयजल योजनाएं जिनके कार्य 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर लिये गये है, के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर, योजनाओं को हर-घर-जल प्रमाणीकरण कराते हुये O&M में ले जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/मै0 बुडहिल इन्फ्रा0 लि0)

मै0 एन0के0जी0 प्राईमस जेवी

अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में मै0 एन0के0जी0 प्राईमस जेवी को 328 नग पेयजल योजनाये (534 राजस्व ग्राम) के कार्य आवंटित किये गये है। फर्म द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 163729 नग गृह संयोजन प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 153040 नग गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं। 187 नग ग्रामों में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण करते हुए 57 ग्रामों में अवर जलाशय एवं डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। 130 पेयजल योजनाओं जिनमें पाईप लाईन एवं गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिये गये है उन योजनाओं

As   

में नियमित जलापूर्ति 02 सप्ताह में प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है। पाईप लाइन बिछाने हेतु कुल 1041.95 किमी० सड़कें तोड़ी/काटी गयी है, जिसके सापेक्ष 703.00 किमी० सड़कों के पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अवशेष 338.95 किमी० सड़क पुर्नस्थापन कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। 27 पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पूर्ण है परन्तु किसी भी योजना को O&M (अनुरक्षण एवं संचालन) में नहीं ले जाया गया है एवं निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उक्त 27 पेयजल योजनाएं जिनके कार्य 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये हैं, उनमें शत प्रतिशत कार्य पूर्ण योजनाओं को हर-घर-जल प्रमाणीकरण कराते हुये O&M में ले जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/
मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०)

मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)

अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) को 251 नग पेयजल योजनाये (387 राजस्व ग्राम) के कार्य आवंटित किये गये हैं। फर्म द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 143480 नग गृह संयोजन प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक कुल 137753 नग गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं। 199 नग ग्रामों में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण करते हुए 134 ग्रामों में अवर जलाशय एवं डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। 65 पेयजल योजनाओं जिनमें पाईप लाईन एवं गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं उन योजनाओं में नियमित जलापूर्ति 02 सप्ताह में प्रारम्भ करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। पाईप लाइन बिछाने हेतु कुल 1289.51 किमी० सड़कें तोड़ी/काटी गयी है, जिसके सापेक्ष 1081.59 किमी० सड़कों के पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अवशेष 207.92 किमी० सड़क पुर्नस्थापन कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। 115 नग पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये हैं जिसमें से 43 पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण कर O&M (अनुरक्षण एवं संचालन) में ले जाया गया है तथा 11 ग्रामों को हर-घर-जल प्रमाणीकरण कराया गया है। निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अवशेष 20 पेयजल योजनाएं जिनके कार्य 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर लिये गये हैं, के अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर, योजनाओं को हर-घर-जल प्रमाणीकरण कराते हुये O&M में ले जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/
मै० बाबा जी०ए० इन्फ्रा० जे०वी०।)



(सचिन कुमार)

मै० बुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०
सहारनपुर



(शिवम अग्रवाल)

मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)
सहारनपुर




(अरिफ खान)

मै० बाबा-जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)
सहारनपुर



मै० आरवी एसोसिएट टी०पी०आई०
सहारनपुर



(दुष्यन्त कुमार)

जूनियर इंजीनियर
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर



(रामदत्त)

सहायक अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर



(मो० हाशिम)

अधिशासी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
सहारनपुर



(सुमित राजेश महाजन)
मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर



(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
सहारनपुर

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में दिनांक
21.05.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक की
उपस्थिति**

क्र०स०	नाम	पदनाम	मोबाईल न०	हस्ताक्षर
1	श्री अरविन्द कुमार चौहान	जिलाधिकारी	9454417575	
2	श्री सुमित राजेश महाजन	मुख्य विकास अधिकारी	9454465211	
3	मो० हाशिम	अधिशारी अभियन्ता	9151919328	
4	रामदेव	सहायक अभियन्ता	9151919330	
5	पंकज चव्वा	जूनियर इंजी०	7988942764	
6	आमित कुमार	जूनियर इंजी०	9119083603	
7	विनीत क. भार्गव	QA/QC Eng./TPI	9009608189	
8	शरद अग्रवाल	Dy.P.M., TPI.	9415770804	
9	SHIVAM AGARWAL	GA INFRA PROJ	7014070456	
10	Seelin kumar	Pm, watershed	9084448444	
11	Anurag	Dy.P.M.	9348771912	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
