

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) शाहजहाँपुर।

ए-16, गार्डन स्टेट (साउथ सिटी के सामने), निकट बरेली मोड़, शाहजहाँपुर-242001
दूरभाष संख्या-7068698568 Email- ee.upjngramin.spn@gmail.com

पत्रांक 2777 / W.S.17 / 1995 दिनांक : 05/06/2025

निरीक्षण आख्या

दिनांक 04.05.2025 को मा० विधान सभा सदस्य 136-ददरौल, श्री अरविन्द कुमार सिंह जी द्वारा जनपद शाहजहाँपुर के जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत विकास खण्ड ददरौल की इटौरा, दुधौना, सिसनई एवं कारी-मकुआपुर पाइप पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अघोहरस्ताक्षरी सहित, श्री सौरभ पाठक, सहायक अभियन्ता, जल निगम, श्री रंजन कुमार, जूनियर इंजीनियर, श्री लक्ष्यदीप त्यागी (डी०पी०एम०), श्री अंजिल शुक्ला, श्री हरेन्द्र, टी०पी०आई०ए०, श्री दीपेन्द्र सिंह (डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर), श्री पुष्पेन्द्र पचौरी (सी०वी०एण्ड टी० कोऑर्डिनेटर), मै०मेघज (डी०पी०एम०यू०), फर्म मै०एन०सी०सी० लिमिटेड के श्री कृष्णनम राजू (डी०पी०एम०) एवं सम्बन्धित साईट इंजीनियर, एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नानुसार है-

1- इटौरा पेयजल योजना, ब्लाक ददरौल-

कार्य	प्रस्तावित	प्रगति
1-ट्यूबवेल	1 No.	100%
2-एफ०एच०टी०सी०	378 Nos.	380 Nos.
3-पाइप लाइन	4.697 Km	4.697 Km
4-पम्प हाउस	1 No. (10 HP)	100%
5-शिरोपरि जलाशय	1 No. (150 KI/12 M)	100%
6-सोलर पैनल	15 KW	100%
7-बाउण्ड्रीवॉल	118.2 M	100%

निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी-

1. निरीक्षण के दौरान योजनान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण पाये गये। वर्तमान में योजना में ओ०एच०टी० के माध्यम से क्लोरीनयुक्त जल की नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
2. मा० विधायक जी द्वारा ग्रामीणों से वार्ता के दौरान उनके द्वारा अवगत कराया गया कि योजना से सुचारू रूप से जलापूर्ति हो रही है तथा योजनान्तर्गत सड़क पुर्नस्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।
3. मा० विधायक जी द्वारा ओ०एच०टी० कैम्पस में फलदार एवं छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण करने का सुझाव दिया गया।
4. मौके पर दो ग्रामीणों द्वारा दिये गये कनेक्शन में टॉटी नही लगे होने सम्बन्धित शिकायत तथा एक व्यक्ति द्वारा नया कनेक्शन लिए जाने की इच्छा की गयी। जिस पर मा० विधायक जी द्वारा उक्त शिकायत के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये गये।

फोटोग्राफ-



2- दुधौना पेयजल योजना, ब्लाक ददरौल-


कार्य	प्रस्तावित	प्रगति
1-ट्यूबवेल	1 No.	100%
2-एफ0एच0टी0सी0	487 Nos.	462 Nos.
3-पाइप लाइन	1.128 Km	100%
4-पम्प हाउस	1 No. (10 HP)	100%
5-शिरोपरि जलाशय	1 No. (125 KI/12 M)	100%
6-सोलर पैनल	16 KW	100%
7-वाउण्ड्रीवॉल	140 M	100%

निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी-

1. निरीक्षण के दौरान योजनान्तर्गत समस्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण पाये गये। वर्तमान में योजना में ओ0एच0टी0 के माध्यम से क्लोरीनयुक्त जल की नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
2. मा0 विधायक जी द्वारा ग्रामीणों के साथ जन चौपाल की गयी जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि योजना से सुचारु रूप से जलापूर्ति हो रही है। राजस्व ग्राम दुधौना के एक मोहल्ले के लगभग 25 घरों में दिये गये कनेक्शन का मरम्मत कार्य अवशेष है तथा कुछ नये इच्छुक परिवारों को कनेक्शन दिये जाने हैं। श्री जगदीश प्रसाद के बाग के पास मेन पाइप लाइन में ज्वाइंटिंग की गयी

जगह पर लीकेज हो रही है। जिस पर मा0 विधायक जी द्वारा उक्त शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

फोटोग्राफ-

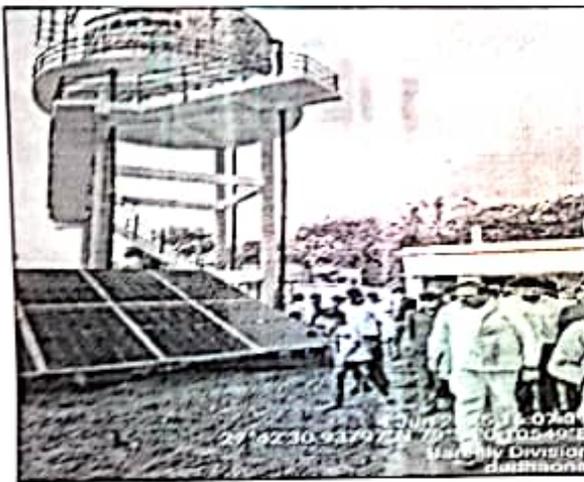

3- सिसनई पेयजल योजना, ब्लाक ददरौल-

कार्य	प्रस्तावित	प्रगति
1-टयूबवेल	1 No.	100%
2-एफ0एच0टी0सी0	442 Nos.	429 Nos.
3-पाइप लाइन	4.991 Km	100%
4-पम्प हाउस	1 No. (10 HP)	100%
5-शिरोपरि जलाशय	1 No. (150 KI/12 M)	100%
6-सोलर पैनल	12 KW	100%
7-बाउण्ड्रीवाल	129.2 M	100%

निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी-

1. निरीक्षण के दौरान योजनान्तर्गत समस्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण पाये गये। वर्तमान में योजना में ओ0एच0टी0 के माध्यम से क्लोरीनयुक्त जल की नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
2. मा0 विधायक जी द्वारा ग्रामीणों के साथ जन चौपाल की गयी जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा अबगत कराया गया कि योजना से सुचारु रूप से जलापूर्ति हो रही है। राजस्व ग्राम सिसनई के एक मोहल्ले के लगभग 25 घरों में दिये गये कनेक्शन का मरम्मत कार्य अवशेष है तथा कुछ नये इच्छुक परिवारों को कनेक्शन दिये जाने हैं। जिस पर मा0 विधायक जी द्वारा उक्त शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।



4- कारी मकुआपुर पेयजल योजना, ब्लाक ददरौल-


कार्य	प्रस्तावित	प्रगति
1-ट्यूबवेल	1 No.	100%
2-ओएचटीसी	365 Nos.	362 Nos.
3-पाइप लाइन	6.081 Km	100%
4-पम्प हाउस	1 No. (7.5 HP)	100%
5-शिरोपरि जलाशय	1 No. (100 KI/12 M)	100%
6-सोलर पैनल	11 KW	100%
7-वाउण्ट्रीवॉल	125.2 M	100%

निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी-

1. निरीक्षण के दौरान योजनान्तर्गत समस्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण पाये गये। वर्तमान में योजना में ओएचटीसी के माध्यम से क्लोरीनयुक्त जल की नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
3. मा० विधायक जी द्वारा ग्रामीणों के साथ वार्ता की गयी जिसमें ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि योजना से सुचारु रूप से जलापूर्ति हो रही है।
4. मौके पर ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि ओएचटीसी तालाब के अत्यन्त पास होने के कारण कैम्पस में जल भराव की समस्या बनी रहती है। जिस पर मा० विधायक जी द्वारा तालाब को पास के नाले में पाइप और चैम्बर के माध्यम से जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे अतिरिक्त जल भराव की समस्या न होने पाये।
5. फर्म, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड के डी०जी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि आए दिन योजनाओं के ओएचटीसी कैम्पस से सामान चोरी हो जाने की समस्याएं बनी रहती हैं, जिस पर मा० विधायक जी द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के ओएचटीसी कैम्पस को सी०सी०टी०बी० कैमरे से लेस कराने का

सुझाव दिया गया, जिससे कि ओ०एच०टी० कैंम्पस में हो रही चोरी को रोका जा सके तथा आस पास के क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

फोटोग्राफ-

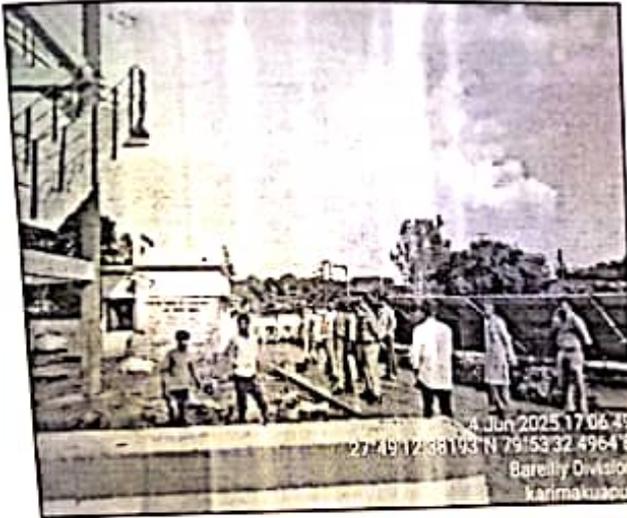

(सनी सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक :

- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निजी सचिव, श्रीमती सुलोना कुशवाहा, मा० विधान सभा सदस्य 133-तिलहर, शाहजहाँपुर।
 2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
 3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बरेली।
 4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर।
 5. मै० वी०एल०जी० (टी०पी०आई०ए०), शाहजहाँपुर।
 6. मै०एन०सी०सी० लिमिटेड, शाहजहाँपुर।

अधिशाली अभियन्ता
