



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।



✉ eeryfalkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक 2664 कोप-21, 1681

दिनांक: 04/08/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 01.07.2026 का शीर्षक "परवरपार में जल जीवन मिशन की सड़के, मरम्मत नहीं: पाइप लाइन बिछाने के बाद ग्रामीण परेशान, बढ रहे हादसे" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड रामकोला के अन्तर्गत निर्माणाधीन परवरपार ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 500 किली०/14 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य फाउन्डेशन तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, 18.24 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य 16.00 किमी० पूर्ण है एवं 1186 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य 60 प्रतिशत हुआ है, तथा शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये मार्गों के पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है जिसे आगामी 15 दिवस में पूर्ण करा लिया जायेगा।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।



✉ eeruralkushinagar@gmail.com ☎ 05564 297311

पत्रांक 2664 / काप-2 / 1681

दिनांक: 04/08/2026

सेवा में,

द्वारा ई-मेल

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय- ई-पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर दैनिक भास्कर के प्रकाशन दिनांक 01.07.2026 का शीर्षक "परवरपार में जल जीवन मिशन की सड़के, मरम्मत नहीं: पाइप लाइन बिछाने के बाद ग्रामीण परेशान, बढ़ रहे हादसे" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकाशन के माध्यम से विकास खण्ड रामकोला के अन्तर्गत निर्माणाधीन परवरपार ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। उक्त योजना का निर्माण कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक अदद ट्यूबवेल, पम्पिंग प्लान्ट, सोलर सहित प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद शिरोपरि जलाशय क्षमता 500 किली०/14 मी० स्टेजिंग का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य फाउन्डेशन तक हुआ है, एक अदद पम्प हाउस का कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, एक अदद बाउन्ड्रीवाल गेट सहित का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसका कार्य पूर्ण है, 18.24 किमी० वितरण प्रणाली कार्य प्रस्तावित था जिसका कार्य 16.00 किमी० पूर्ण है एवं 1186 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित था, जिसका कार्य 60 प्रतिशत हुआ है, तथा शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये मार्गों के पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है जिसे आगामी 15 दिवस में पूर्ण करा लिया जायेगा।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैय।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड कुशीनगर।


अधिशासी अभियन्ता



Latitude: 26.819192
Longitude: 83.828042
Elevation: 94.01±2.5 m
Accuracy: 3.302 m
Time: 01-08-2026 13:38
Note: block-Ramkola
scheme-parwarpar



Powered by Mapbox



Latitude: 26.820645
Longitude: 83.827363
Elevation: 93.97±2.5 m
Accuracy: 3.055 m
Time: 18-07-2026 10:56
Note: block-Ramkola
scheme -parwarpar



Latitude: 26.821426
Longitude: 83.82511
Elevation: 101.11±9.23 m
Accuracy: 10.24 m
Time: 27-07-2026 11:47
Note: Block - Ramkola
scheme -
Parwarpar

Powered by NoteCam



Powered by NoteCam

Latitude: 26.820619
Longitude: 83.830475
Elevation: 84.72±3.01 m
Accuracy: 10.32 m
Time: 22-07-2026 12:04
Note: block-Ramkola
scheme -parwarpar



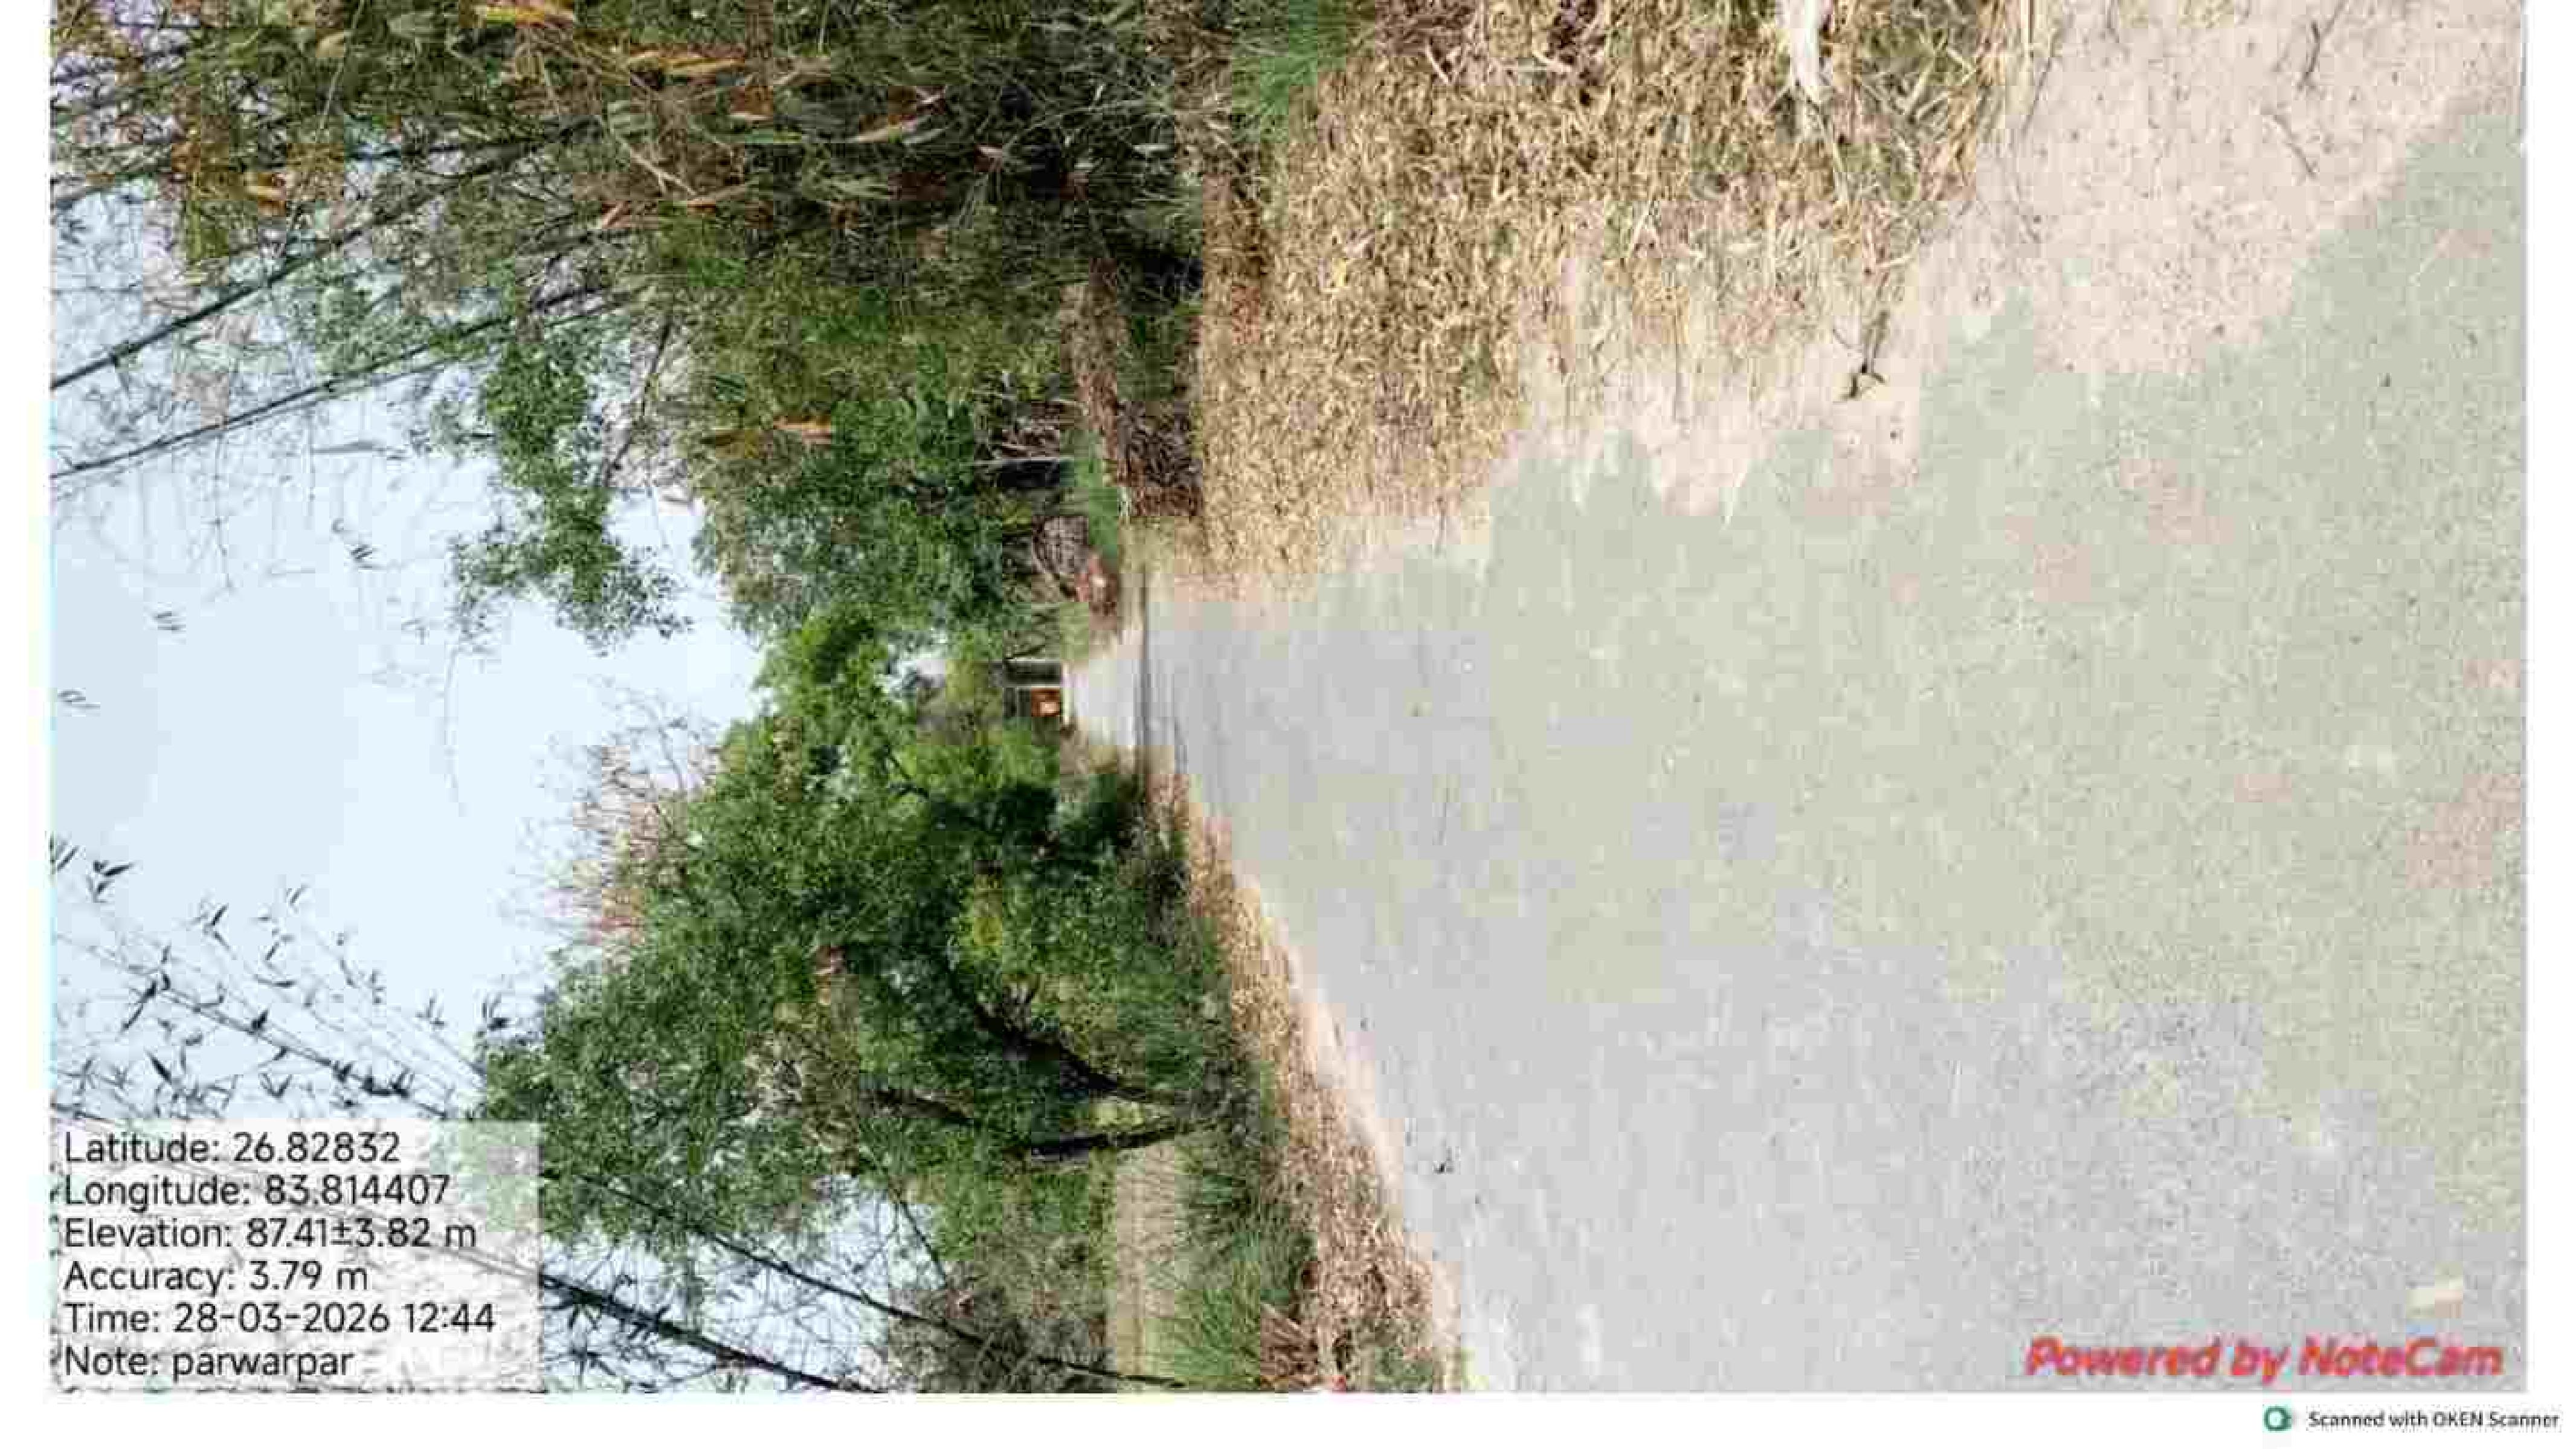
Latitude: 26.821176
Longitude: 83.824875
Elevation: 88.37±3.51 m
Accuracy: 3.881 m
Time: 26-07-2026 11:06
Note: Block - Ramkola
scheme -
Parwarpar

Powered by NoteCam



Latitude: 26.829472
Longitude: 83.814634
Elevation: 86.36±5.24 m
Accuracy: 3.79 m
Time: 28-03-2026 12:44
Note: parwarpar

Powered by NoteCam

A photograph of a paved road, likely a residential street, with a large, leafy tree on the left side. In the background, a small building with a dark roof is visible. The road is light-colored and appears to be made of concrete or asphalt. The sky is overcast and grey. The image is oriented horizontally but appears to be a vertical shot rotated 90 degrees clockwise.

Latitude: 26.82832
Longitude: 83.814407
Elevation: 87.41±3.82 m
Accuracy: 3.79 m
Time: 28-03-2026 12:44
Note: parwarpar

Powered by NoteCam



Latitude: 26.819475
Longitude: 83.820663
Elevation: 83.52±3.7 m
Accuracy: 3.0 m
Time: 17-06-2026 14:33
Note: Block-Ramkola
Scheme -Parwarpar

Powered by Suno AI
