



अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।

साई आर्शावाद भवन केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, E-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 7772 / M-16 / 203

दिनांक: 27 / 08 / 2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:-

दैनिक भास्कर न्यूज पोर्टल में "अकबरपुर रेवान में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी" शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर न्यूज पोर्टल में "अकबरपुर रेवान में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी" शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रकाशित खबर विकास खण्ड सिधौली की ग्राम पंचायत अकबरपुर रेवान पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

प्रश्नगत खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड सिधौली की ग्राम पंचायत अकबरपुर रेवान पाइप पेयजल योजना का कार्य मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत में 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल 16.71 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 630 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 13.66 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 390 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कराकर योजना पर आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान बी0ओ0ई0 रोड 5.05 किमी0 एवं इण्टरलॉक रोड 1.10 किमी0 तोड़ी गई थी। जिसके सापेक्ष बी0ओ0ई0 रोड 4.90 किमी0 एवं इण्टरलॉक रोड 1.10 किमी0 का स्थायी पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है।

योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। दिसम्बर 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

संलग्नक-

फोटोग्राफ संलग्न।

भवदीय,

(ए0के0 त्रिपाठी)
अधिशाली अभियन्ता

पु0सं0 एवं दिनांक यथोपरि:-

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
- 6- मेसर्स सिन्सेस टेक, लि0, सीतापुर।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एल0 एण्ड टी0 सीतापुर।

अधिशाली अभियन्ता



अधिशालसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।

साइ आर्शावाद भवन केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, E-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 7772 / M-16 / 203

दिनांक: 27/08 / 2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:-

दैनिक भास्कर न्यूज पोर्टल में "अकबरपुर रेवान में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी" शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर न्यूज पोर्टल में "अकबरपुर रेवान में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी" शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रकाशित खबर विकास खण्ड सिधौली की ग्राम पंचायत अकबरपुर रेवान पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

प्रश्नगत खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड सिधौली की ग्राम पंचायत अकबरपुर रेवान पाइप पेयजल योजना का कार्य मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत में 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 1 नग शिरोपरि जलाशय, 1 नग बाउण्ड्रीवाल 16.71 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 630 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 1 नग नलकूप, 1 नग पम्पहाउस, 1 नग सोलर सिस्टम, 13.66 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 390 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण कराकर योजना पर आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान बी0ओ0ई0 रोड 5.05 किमी0 एवं इण्टरलॉक रोड 1.10 किमी0 तोड़ी गई थी। जिसके सापेक्ष बी0ओ0ई0 रोड 4.90 किमी0 एवं इण्टरलॉक रोड 1.10 किमी0 का स्थायी पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है।

योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। दिसम्बर 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

संलग्नक- फोटोग्राफ संलग्न।




भवदीय,

(ए0के0 त्रिपाठी)
अधिशालसी अभियन्ता

पु0सं0 एवं दिनांक यथोपरि:-


- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
- 6- मेसर्स सिन्सेस टेक, लि0, सीतापुर।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एल0 एण्ड टी0 सीतापुर।

अधिशालसी अभियन्ता

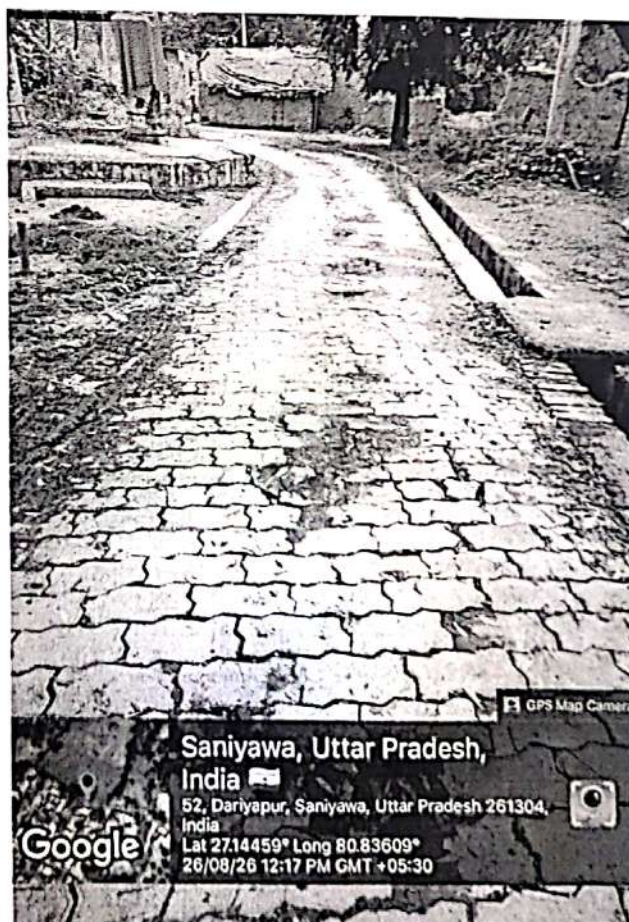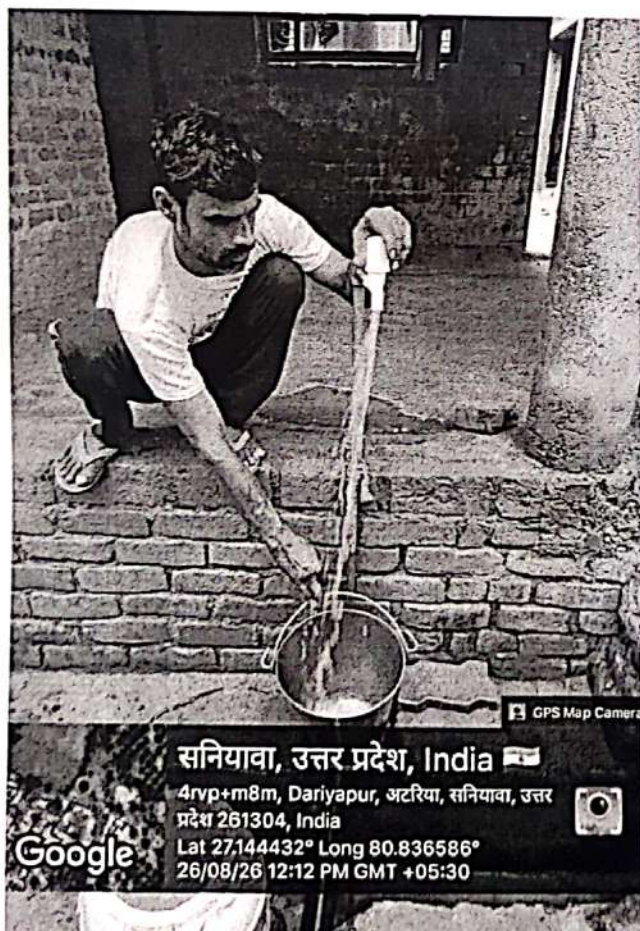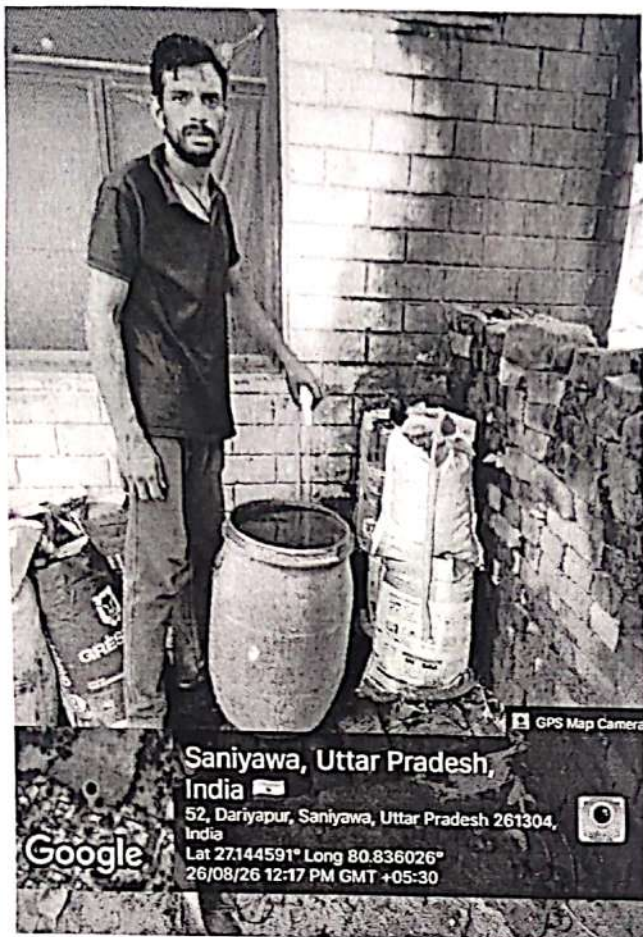

अकबरपुर रिवान में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: निर्माण कार्य अधूरा, स्थानीय ग्रामीण परेशान; सड़कें भी प्रभावित

महेंद्र अरिदमन सिंह | अटरिया (सिधौली), सीतापुर | 22/08/26

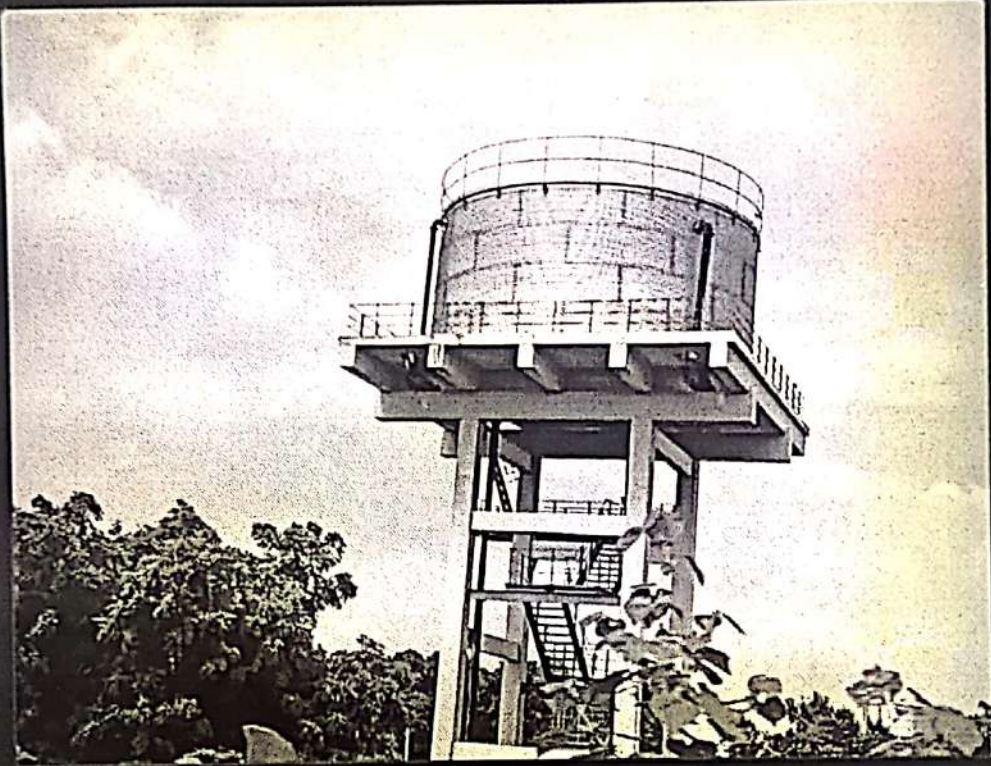

शेयर

जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी।

अटरिया थाना क्षेत्र के अकबरपुर रिवान गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीणों को घर-घर पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन कार्य पूरा न होने से ग्रामीण लाभ से वंचित हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में पाइपलाइन बिछाने के लिए कई स्थानों पर खुदाई की गई है। इस खुदाई के कारण सड़कें और रास्ते बरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन
