



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जलनिगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009

दूरभाष: 9473942735
Email ID: ee2pdjainigamknp@yahoo.in

पत्रांक: 1741 / W-13 / 2026

दिनांक 13/05/2026

सेवा में,



मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन के लाखों डकार गए जिम्मेदार, डेढ़ साल पहले बनी टंकी और सोलर पैनल" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 12 मई 2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन के लाखों डकार गए जिम्मेदार, डेढ़ साल पहले बनी टंकी और सोलर पैनल" चौबेपुर ब्लॉक के पेम गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी और सोलर सिस्टम डेढ़ साल से बेकार पड़े हैं। लाखों के खर्च के बावजूद ग्रामीणों को आज तक पानी की आपूर्ति नसीब नहीं हुई है, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आंवटित फर्म M/s Vindhya Telelinks Ltd.- Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV), Noida द्वारा पेयजल योजना निर्माण का कार्य दिनांक 26.05.2023 से प्रारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत ओ०एच०टी०, पम्पहाउस तथा सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाइप लाइन का कार्य 13627 मी० के सापेक्ष 12718 मी० का कार्य पूर्ण है तथा गृह संयोजन का कार्य 1146 नग के सापेक्ष 650 नग का कार्य पूर्ण है। दिनांक 14.09.2025 से योजना का ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु पी०डब्ल्यू०डी० विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के दौरान लगभग 2696मी० पाइपलाइन सड़क चौड़ीकरण के दौरान छतिग्रस्त कर दिया गया। जिससे योजना के ट्रायल एण्ड रन का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। पी०डब्ल्यू०डी० विभाग से पुनः पाइप लाइन डालने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा कर जलापूर्ति प्रारम्भ करायी जायेगी।

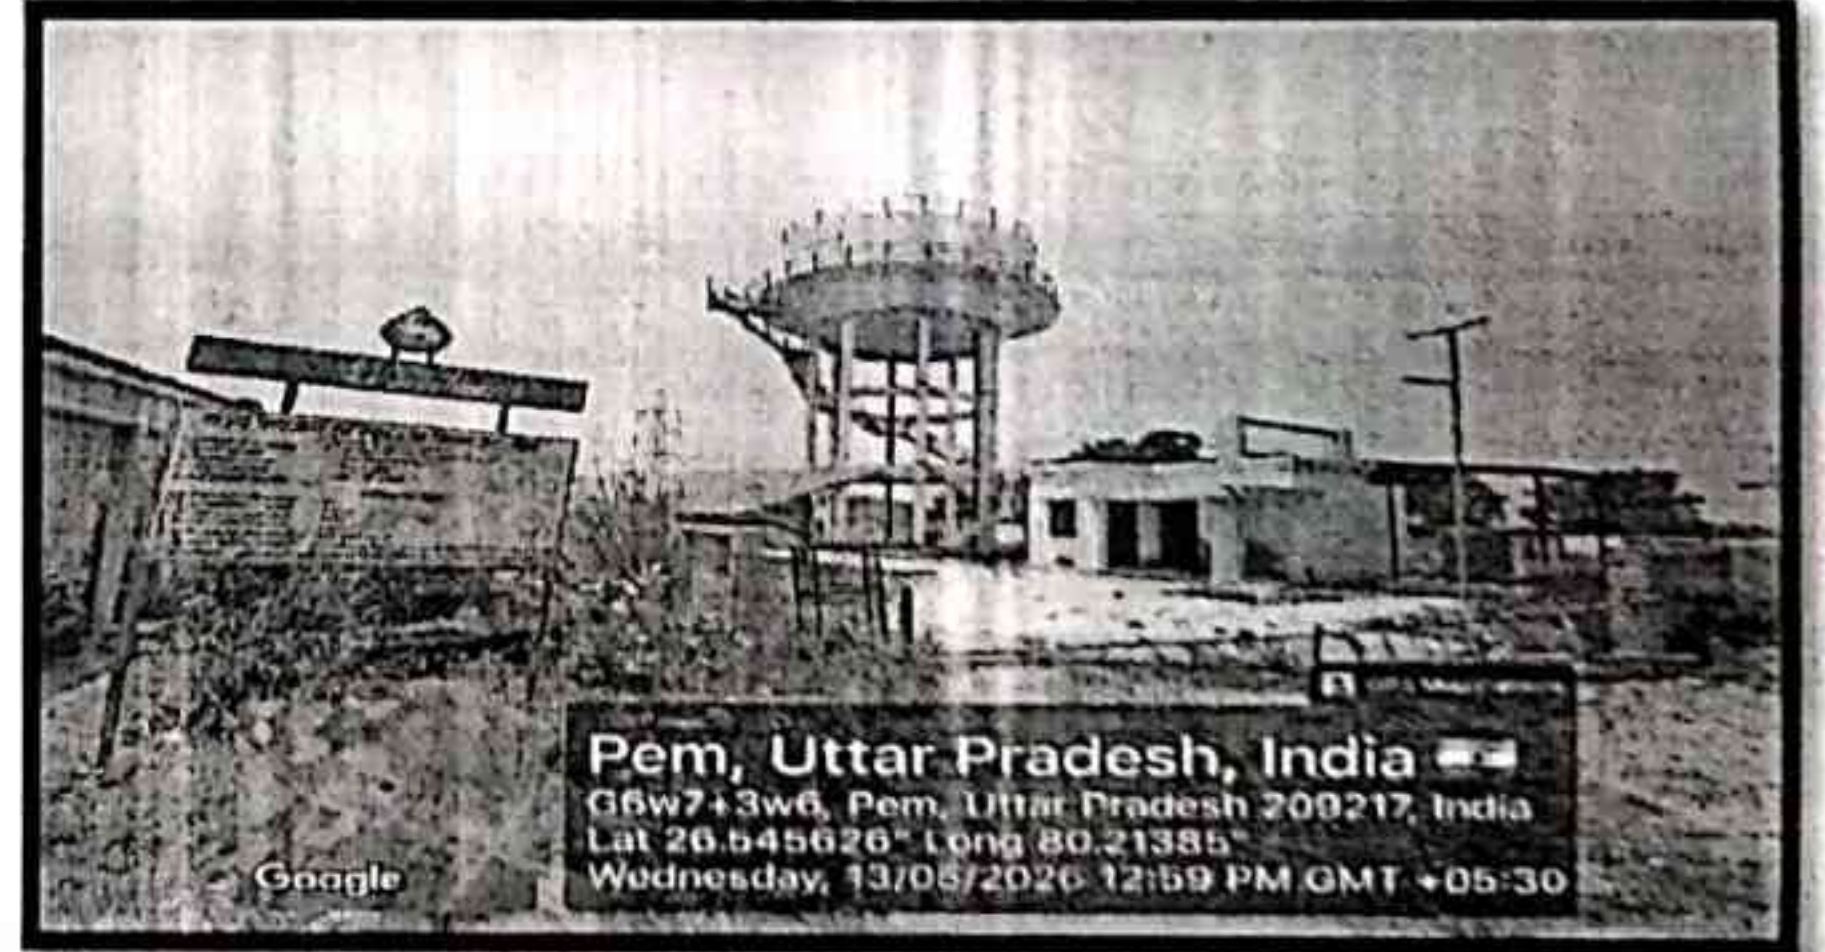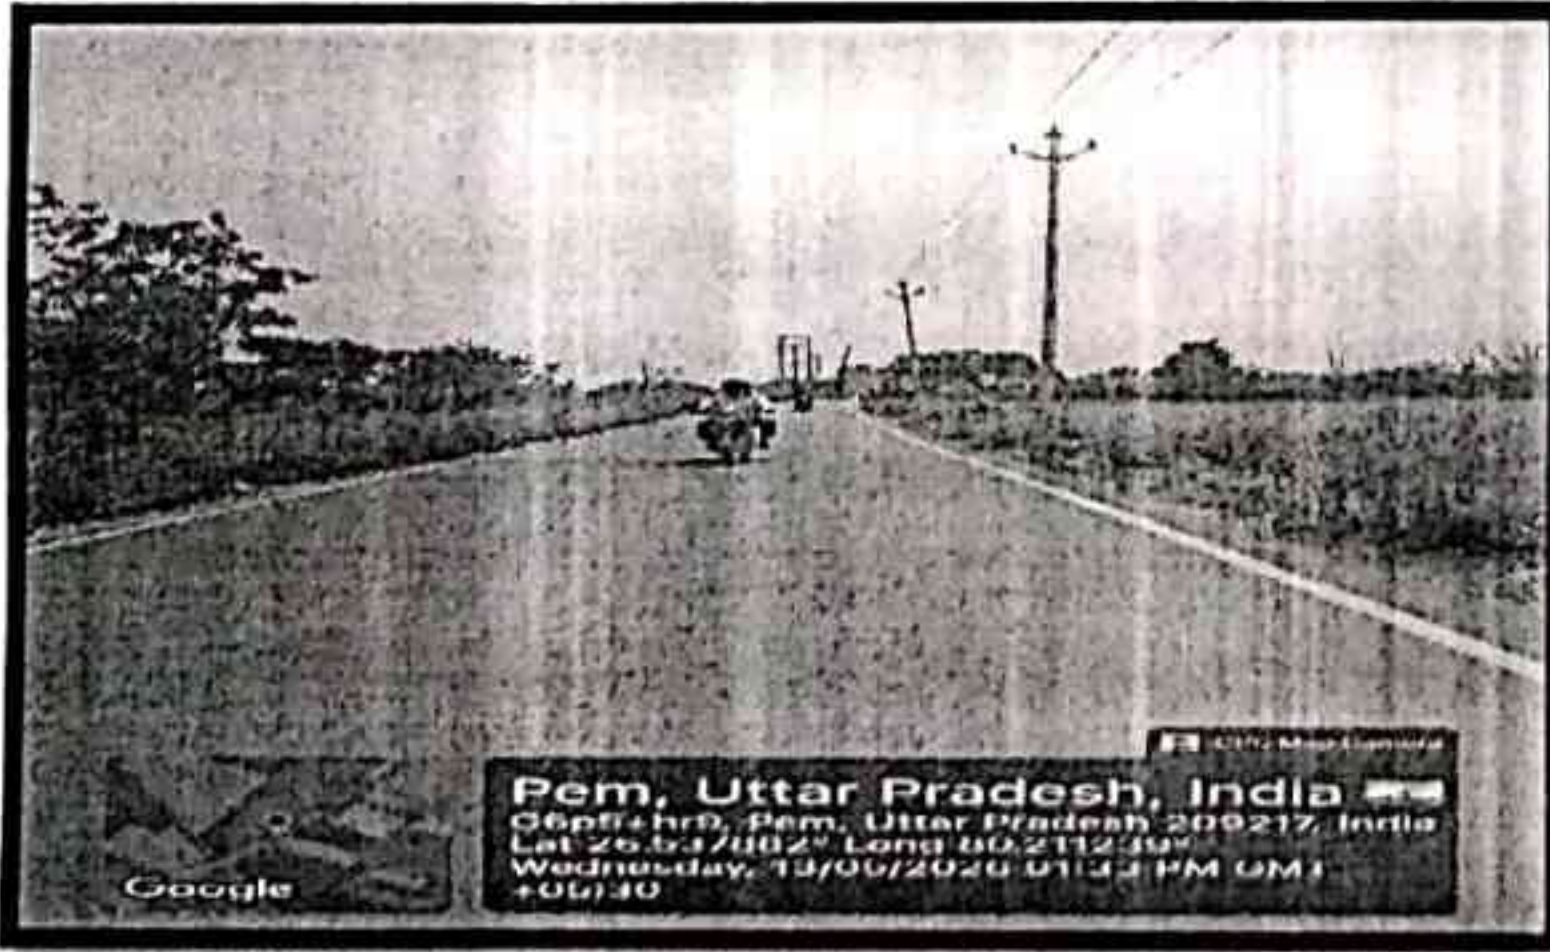

भवदीय

(एम० के० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता



Scanned with OKEN Scanner



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जलनिगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009

दूरभाष: 9473942735
Email ID: ee2pdjainigamknp@yahoo.in

पत्रांक: 1741 / W-13 / 2026

दिनांक 13/05/2026

सेवा में,


मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन के लाखों डकार गए जिम्मेदार, डेढ़ साल पहले बनी टंकी और सोलर पैनल" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 12 मई 2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन के लाखों डकार गए जिम्मेदार, डेढ़ साल पहले बनी टंकी और सोलर पैनल" चौबेपुर ब्लॉक के पेम गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी और सोलर सिस्टम डेढ़ साल से बेकार पड़े हैं। लाखों के खर्च के बावजूद ग्रामीणों को आज तक पानी की आपूर्ति नसीब नहीं हुई है, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आंवटित फर्म M/s Vindhya Telelinks Ltd.- Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV), Noida द्वारा पेयजल योजना निर्माण का कार्य दिनांक 26.05.2023 से प्रारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत ओ०एच०टी०, पम्पहाउस तथा सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाइप लाइन का कार्य 13627 मी० के सापेक्ष 12718 मी० का कार्य पूर्ण है तथा गृह संयोजन का कार्य 1146 नग के सापेक्ष 650 नग का कार्य पूर्ण है। दिनांक 14.09.2025 से योजना का ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु पी०डब्ल्यू०डी० विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के दौरान लगभग 2696मी० पाइपलाइन सड़क चौड़ीकरण के दौरान छतिग्रस्त कर दिया गया। जिससे योजना के ट्रायल एण्ड रन का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। पी०डब्ल्यू०डी० विभाग से पुनः पाइप लाइन डालने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा कर जलापूर्ति प्रारम्भ करायी जायेगी।

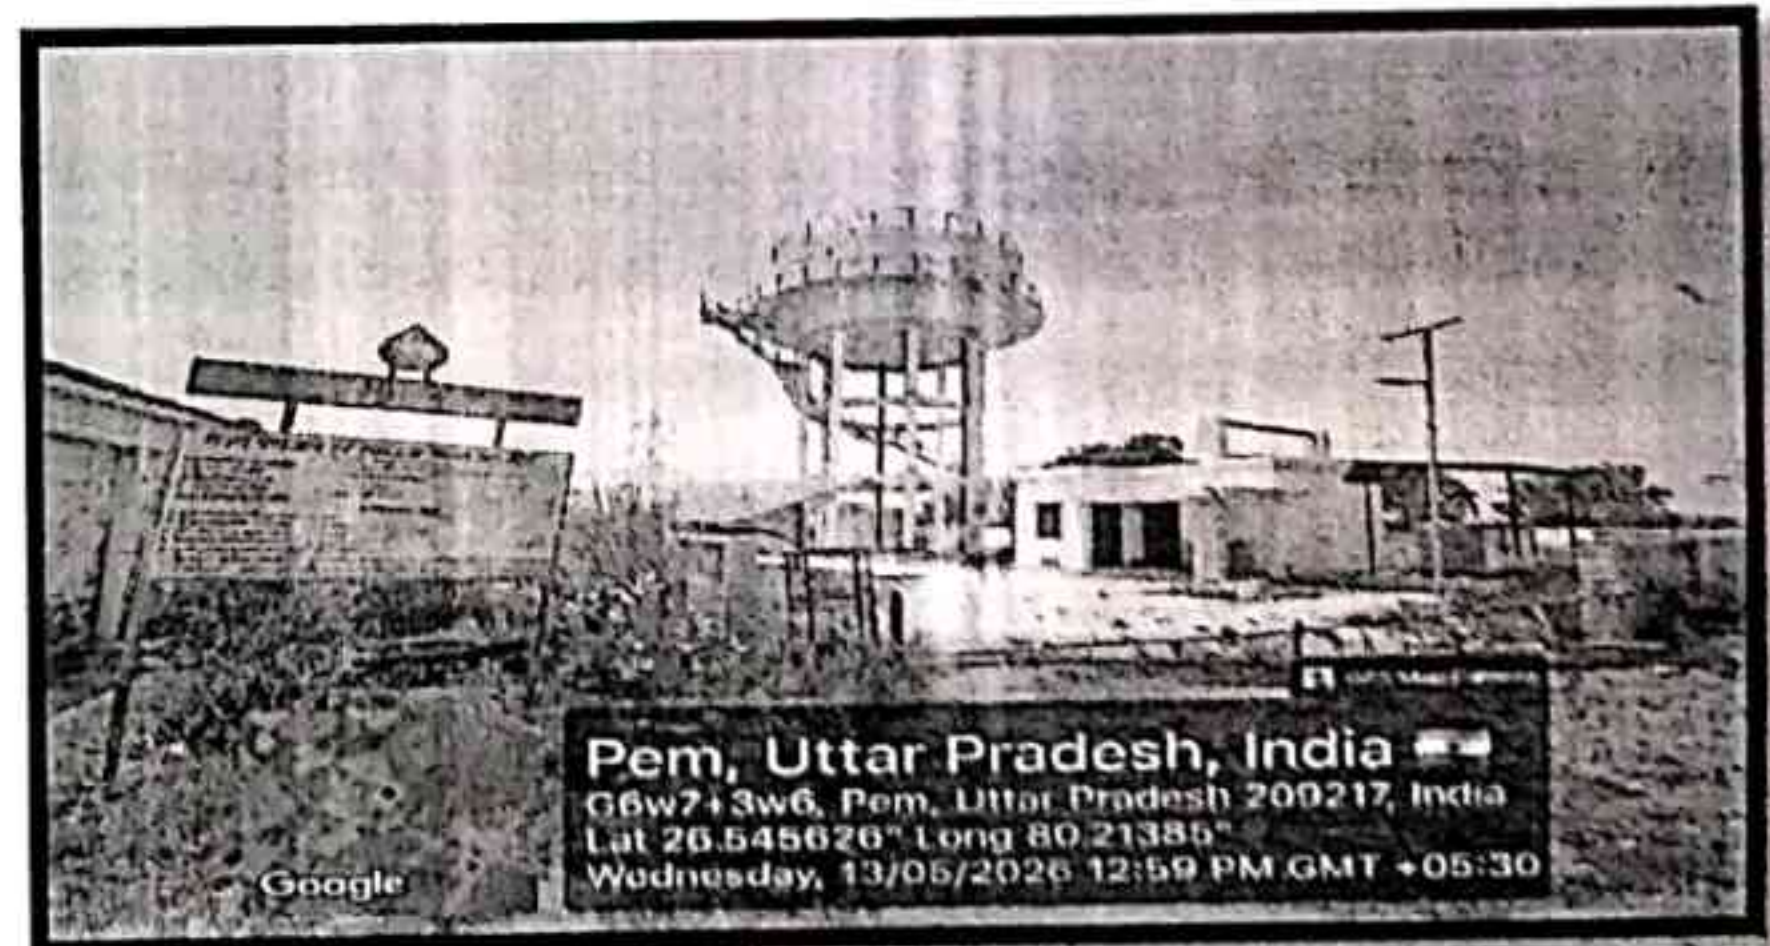

भवदीय

(एम० के० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता
