



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जलनिगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009

दूरभाष: 9473942735
Email ID: ee2pdjainigamknp@yahoo.in

पत्रांक: 1912/W-13 / 243

दिनांक 30/05/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर " गजना में दो साल से पानी की टंकी अधूरी जल जीवन मिशन योजना ठप आठ दिन से पेयजल संकट" के सम्बन्ध में।

महोदय,



उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 29 मई 2026 को प्रकाशित खबर "गजना में दो साल से पानी की टंकी अधूरी जल जीवन मिशन योजना ठप आठ दिन से पेयजल संकट" विकासखण्ड बिल्हौर के गजना गांव में जल जीवन मिशन योजना की स्थिति बदहाल है। यहां करीब दो साल से पानी की टंकी का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आवंटित फर्म M/s Vindhya Telelinks Ltd.- Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV), Noida द्वारा पेयजल योजना निर्माण का कार्य दिनांक 09.02.2023 से प्रारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत ओ०एच०टी०, 175KL/16m स्टेजिंग का निर्माण कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है। पम्पहाउस का निर्माण पूर्ण है तथा सोलर फाउडेशन का कार्य पूर्ण है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य 5555 मी० के सापेक्ष 5610 मी० पूर्ण है तथा गृह संयोजन 518 नग के सापेक्ष 564 नग MDPE लगाने का कार्य पूर्ण है। साथ ही अवगत कराना है कि पिछले 01 वर्ष से जलापूर्ति सीधे नलकूप से सम्बन्धित ग्रामवासियों को दी जा रही थी परन्तु दिनांक 21.05.2026 को मोटर की वाइरिंग एवं आटोमेशन पैनल की एम०सी०बी० खराब हो जाने से वर्तमान में जलापूर्ति प्रभावित हुई है अतः योजनान्तर्गत परिलक्षित कमियों का निराकरण 03 कार्य दिवसों में पूर्ण कर जलापूर्ति बहाल करायी जायेगी। भारत सरकार से विगत लगभग 18 माह से धनावंटन न होने के कारण योजना के निर्माण की प्रगति प्रभावित हुई है साथ ही अवगत कराना है कि भारत सरकार की इस योजना को पूर्ण करने की



तिथि दिसम्बर 2028 तक विस्तारित की गयी है। जनपद अन्तर्गत जिन योजनाओं की भौतिक प्रगति 90% या उससे अधिक है उन योजनाओं को अनुरक्षण मद में लिये जाने पर वरीयता दी जा रही है। इन परियोजनाओं को पूर्णता की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। भारत सरकार से जैसे ही धनावंटन होगा तो गजना पेयजल योजना को शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

उपरोक्त ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर के सन्दर्भ में सम्बन्धित फर्म M/s Vindhya Telelinks Ltd.- Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV), Noida को समस्त अवशेष कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है जिससे समस्त ग्रामवासियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

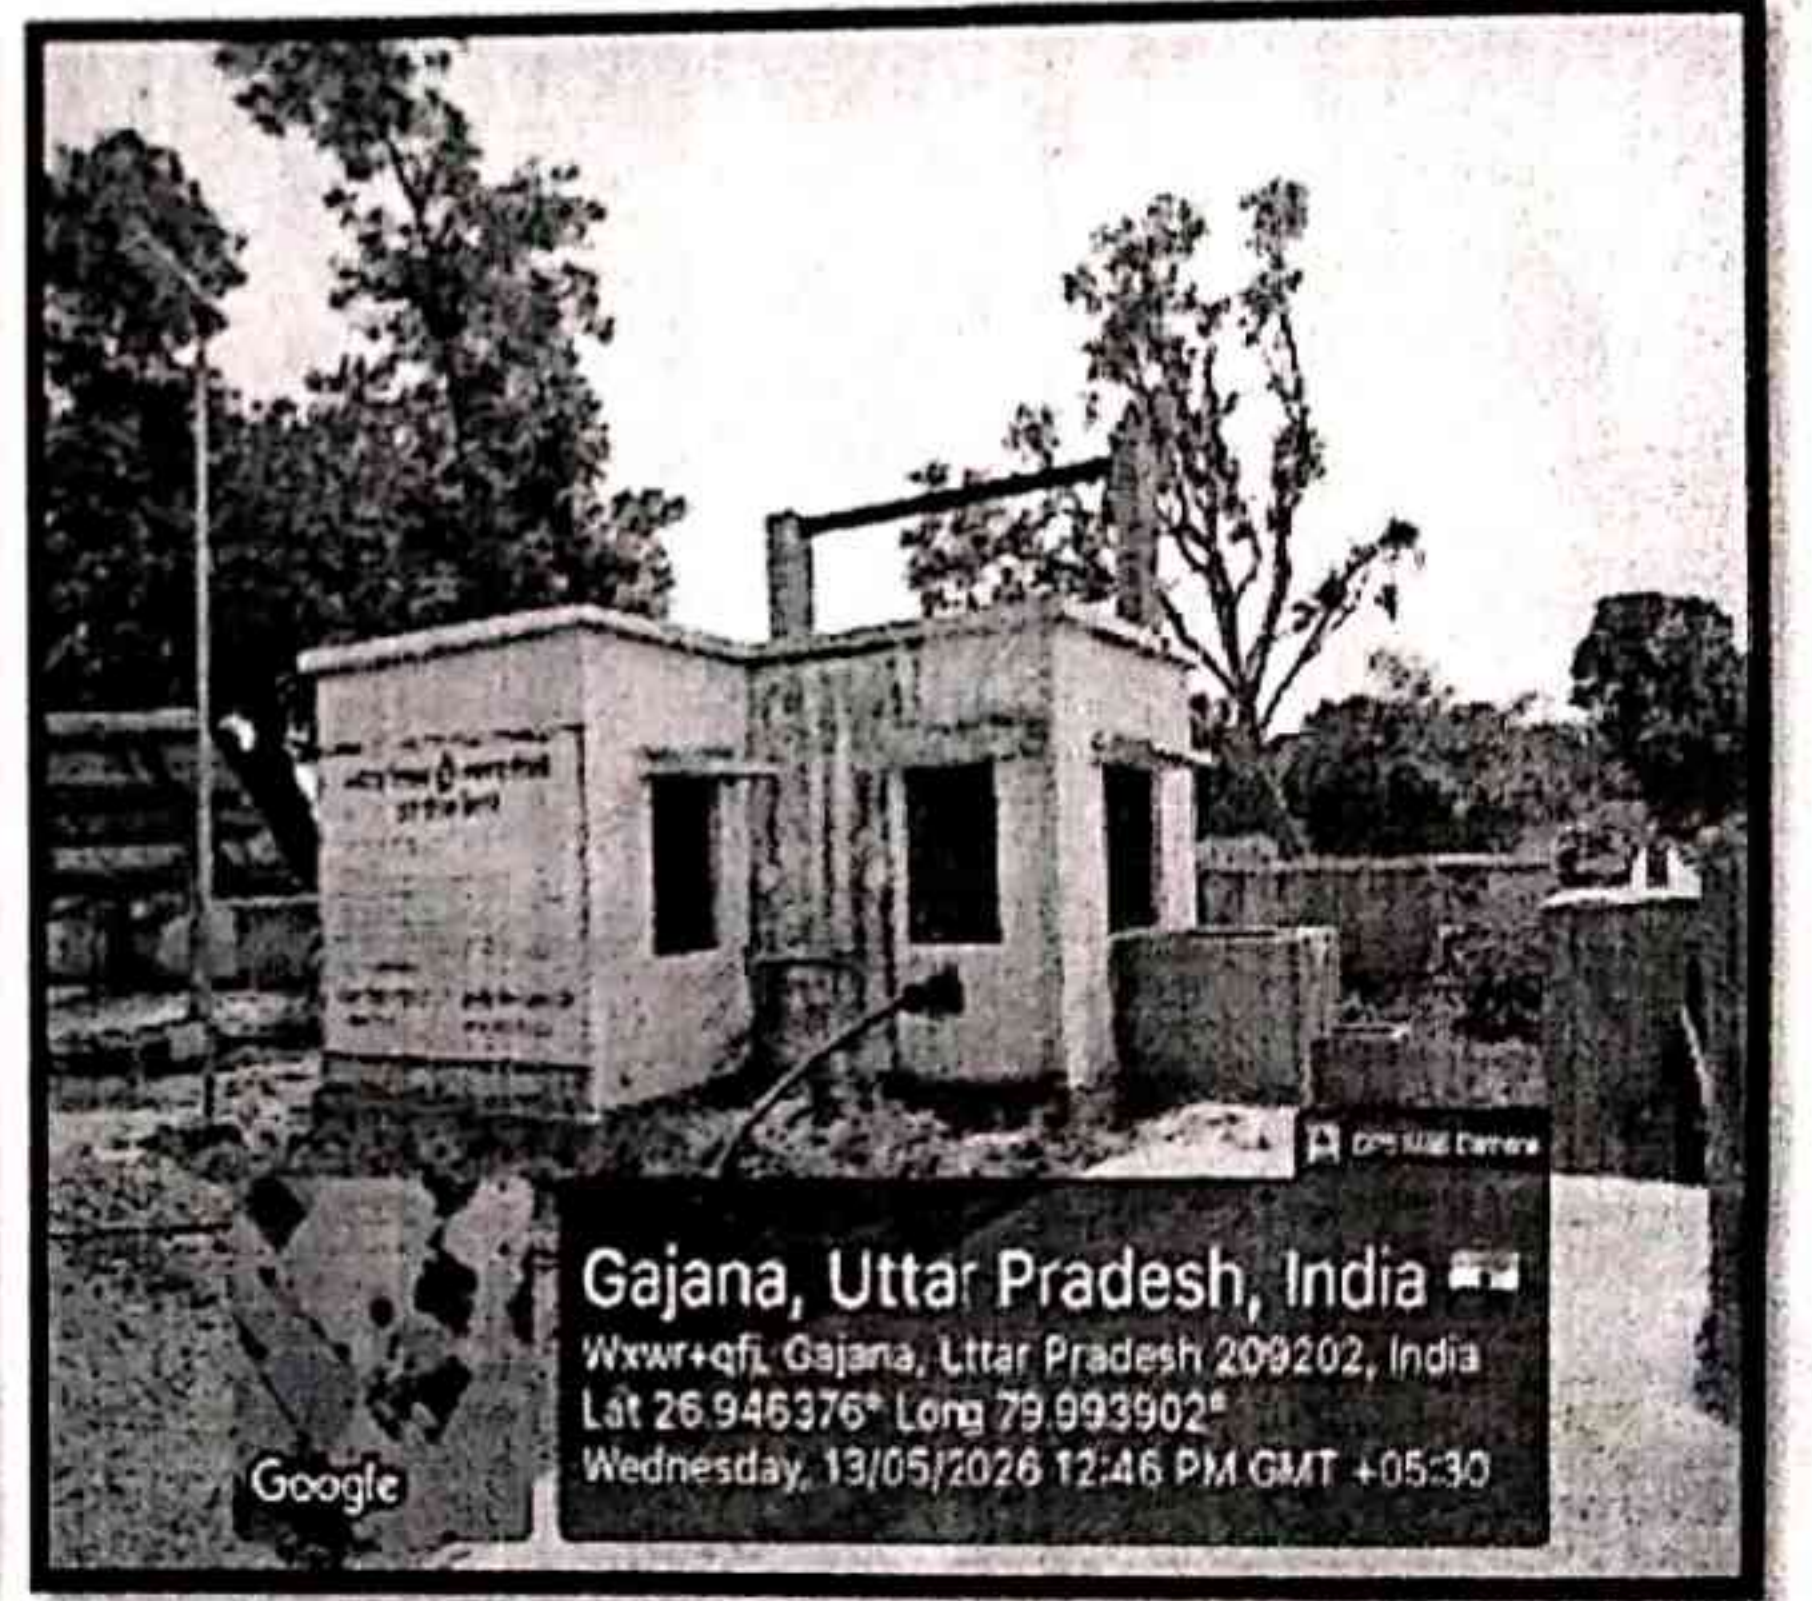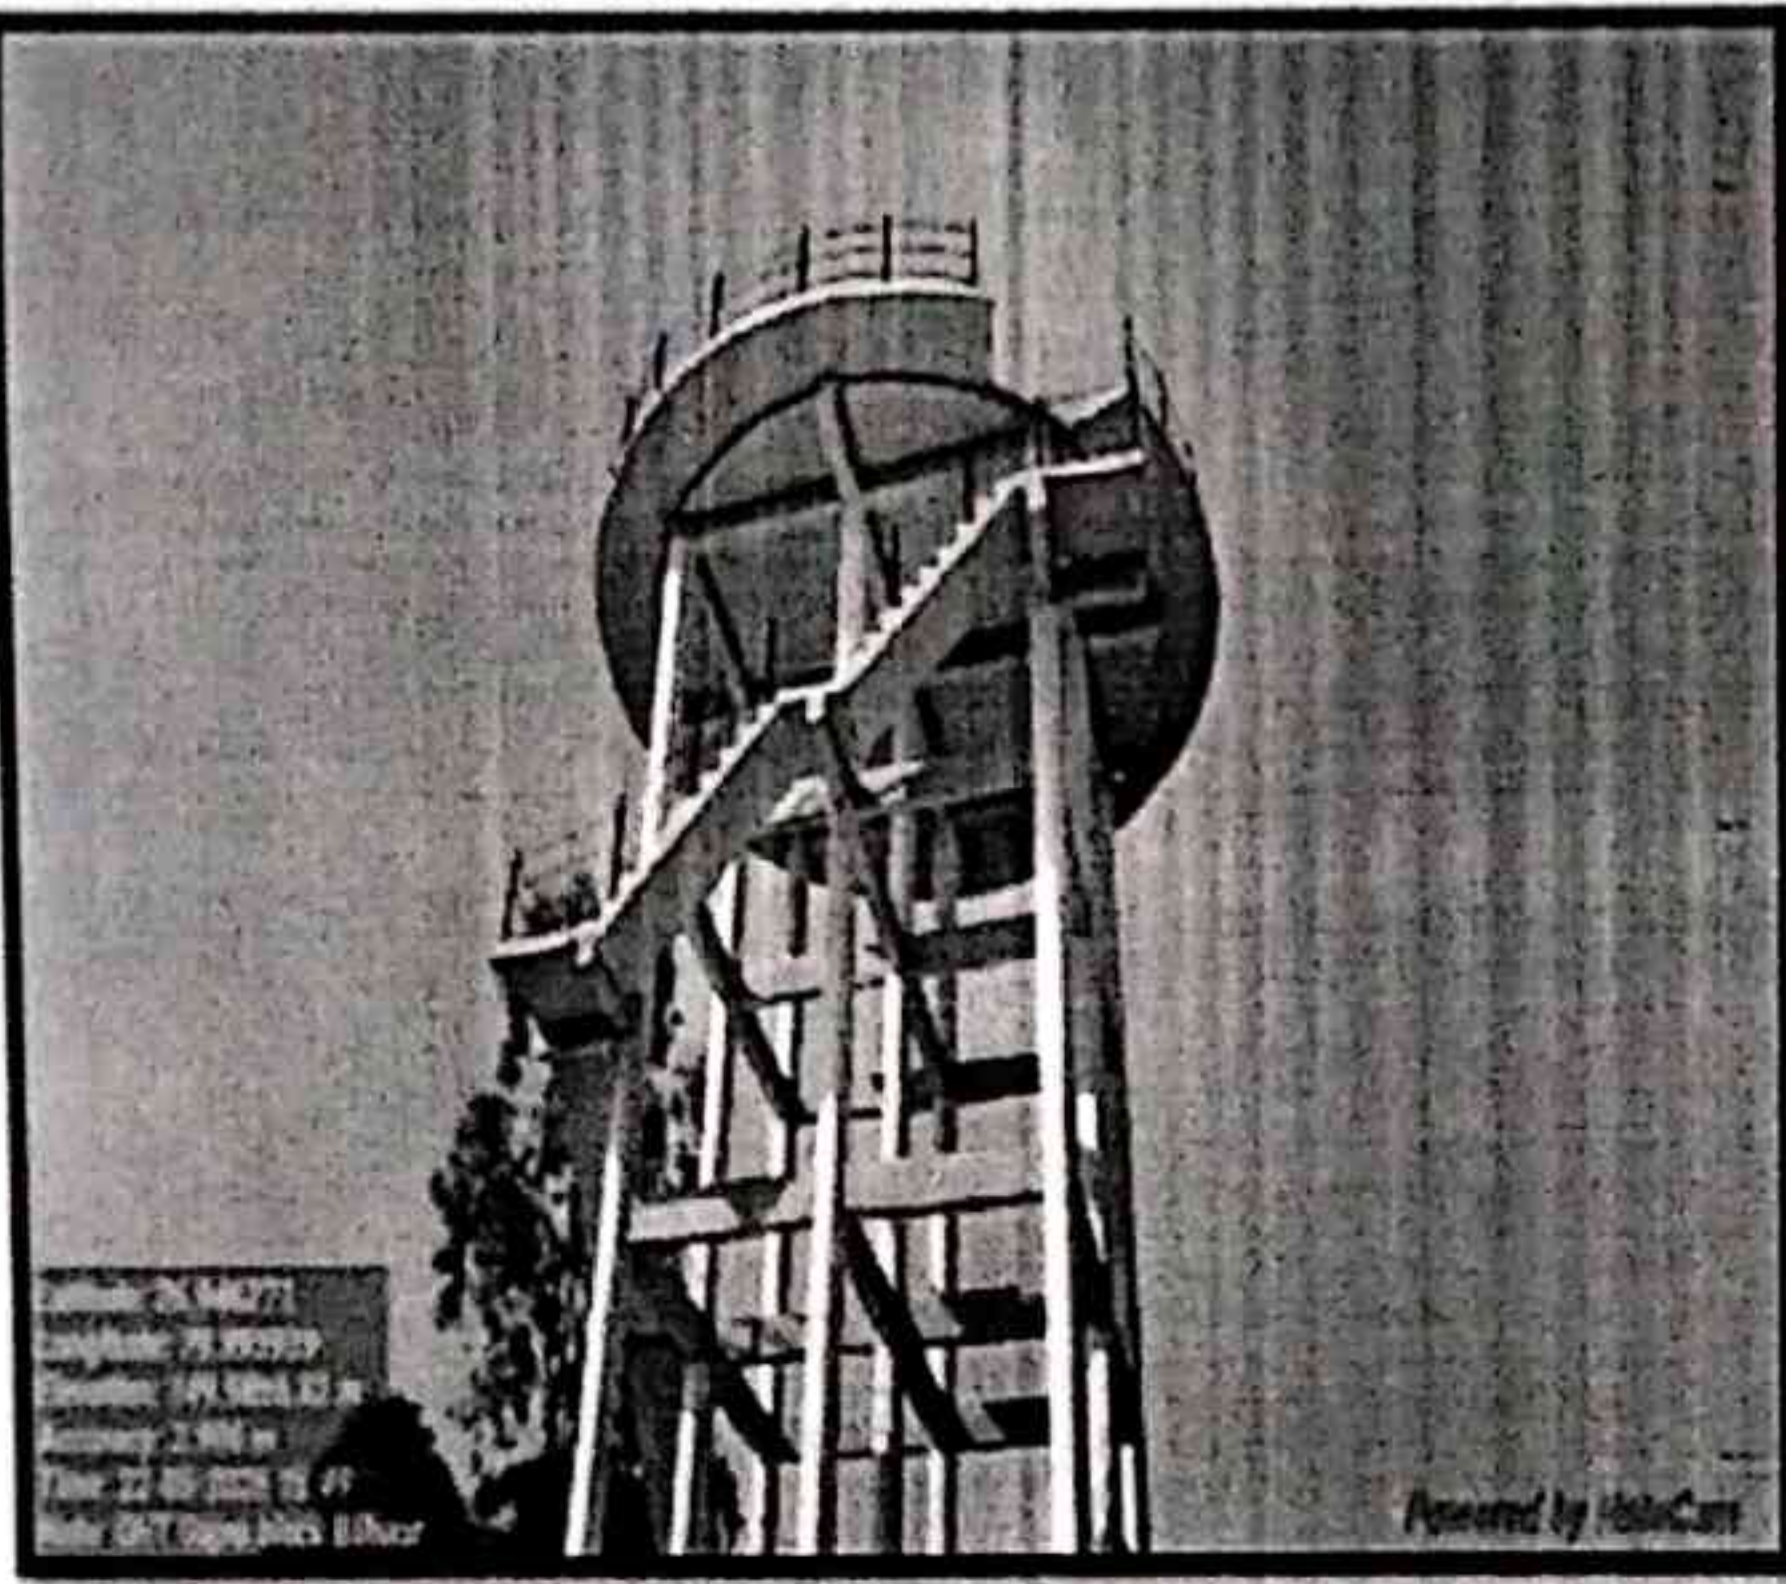

भवदीय

(एम० के० सिंह)

अधिशायी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
4. मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।

अधिशायी अभियन्ता
