



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।

चरित्र विकास भवन साबुल गली अकबरपुर-224122

eeupjn.cdambedkarnagar@gmail.com

पत्रांक:- 2845

विषय-09

53

दिनांक-08.05.2026

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

विषय:- दै० समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक-08.05.2026 में प्रकाशित शीर्षक "पानी टंकी का निर्माण बंद शुद्ध पेयजल का इंतजार" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में दिनांक-08.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक " पानी टंकी का निर्माण बंद शुद्ध पेयजल का इंतजार" की आख्या निम्नवत है-

क्र०सं०	प्रकाशित खबर	आख्या
1.	जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में पानी टंकी का निर्माण अधर में लटका हुआ है। ठेकेदार निर्माण कार्य छोड़ कर बीते तीन वर्ष से फरार है। इस पानी टंकी का निर्माण वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। ग्राम पंचायत रसूलपुर दियरा में पेयजल योजना की खिल्ली उड़ रही है। यहां योजना के तहत 197.11 लाख की लागत से परियोजना का कार्य पूरा किया जाना था। कार्यवाही संस्था वेल्सपन कम्पनी द्वारा वर्ष 2021 में कार्य प्रारम्भ किया गया। परियोजना का कार्य 10 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाना था। इसमें कुल 401 घरों को योजना से आच्छादित कराना था लेकिन परियोजना का कार्य अधर में लटका हुआ है। सभी घरों में अभी तक टोटियां नहीं लग सकी हैं। जहां पानी की टोटियां लगी थीं, उसमें अधिकतर टोटी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ग्रामीण पेयजल की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं लेकिन यहां तो ठेकेदार ही कार्य छोड़ कर तीन वर्ष से फरार हो गया है। हालात यह हैं कि पानी टंकी के निर्माण में प्रयुक्त बांस बलियां सड़क पर गिर रही हैं। पाइप लाइन के लिए गांव में खोदे गए रास्ते बदहाल हैं उसकी मरम्मत की सुविधा जिम्मेदारों को नहीं है। परियोजना का कार्य बंद रहने से ग्रामीणों में निराशा व्याप्त है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेन्द्र कुमार ने कहा कि जल निगम की उदासीनता के चलते जहां ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है, वहीं राजस्व की क्षति हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बंद पड़े परियोजना के कार्य को शुरू कराने की मांग की है।	रसूलपुर दियरा पेयजल योजना का श्री धर्मेन्द्र प्रसाद जूनियर इंजीनियर द्वारा दिनांक-08.05.2026 को स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं इनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेयजल योजना में 8700 मी० पाइप लाइन के सापेक्ष 9950 मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है, गृह जल संयोजन का कार्य 401 नग के सापेक्ष 350 नग कार्य पूर्ण है, शिरोपरी जलाशय का कार्य 90% पूर्ण कर लिया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत डायरेक्ट नलकूप के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही थी। वर्तमान में सोलर पैनल लगे VFD खराब होने कारण डायरेक्ट नलकूप के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति बाधित है। सोलर पैनल में लगे VFD का मरम्मत कार्य दिनांक-10.05.2026 तक पूर्ण कराकर डायरेक्ट नलकूप के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जाएगी। योजना के समस्त कार्यों को माह-जुलाई-2026 तक पूर्ण कराकर शिरोपरी जलाशय के माध्यम से सभी मजरो में नियमित जलापूर्ति की जाएगी। उक्त योजना के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार द्वारा भी जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उनको भी योजना से कब तक जलापूर्ति की जाएगी अवगत करा दिया गया है।

संलग्न-स्थलीय निरीक्षण फोटो ग्राफ संलग्न

भवदीय

(कमला शंकर)

अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक यथोपरि:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 3- मुख्य अभियन्ता(ल०क्ष०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अयोध्या।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।

परिव्र विकास भवन साबुन गली अकबरपुर-224122

eeupjn.cdambedkarnagar@gmail.com

पत्रांक:- 2845

विषय - 09

53

दिनांक- 08-05-2026

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

विषय:- द० समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक-08.05.2026 में प्रकाशित शीर्षक "पानी टंकी का निर्माण बंद शुद्ध पेयजल का इंतजार" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में दिनांक-08.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक " पानी टंकी का निर्माण बंद शुद्ध पेयजल का इंतजार" की आख्या निम्नवत है-

क्र०सं०	प्रकाशित खबर	आख्या
1.	जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में पानी टंकी का निर्माण अधर में लटका हुआ है। ठेकेदार निर्माण कार्य छोड़ कर बीते तीन वर्ष से फरार है। इस पानी टंकी का निर्माण वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। ग्राम पंचायत रसूलपुर दियरा में पेयजल योजना की खिल्ली उड़ रही है। यहा योजना के तहत 197.11 लाख की लागत से परियोजना का कार्य पूरा किया जाना था। कार्यदायी संस्था वेल्सपन कम्पनी द्वारा वर्ष 2021 में कार्य प्रारम्भ किया गया। परियोजना का कार्य 10 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाना था। इसमें कुल 401 घरों को योजना से आच्छादित कराना था लेकिन परियोजना का कार्य अधर में लटका हुआ है। सभी घरों में अभी तक टोटिया नहीं लग सकी है। जहां पानी की टोटियां लगी थी, उसमें अधिकतर टोटियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ग्रामीण पेयजल की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं लेकिन यहां तो ठेकेदार ही कार्य छोड़ कर तीन वर्ष से फरार हो गया है। हालात यह है कि पानी टंकी के निर्माण में प्रयुक्त बांस बल्लियां सड़क पर गिर रही है। पाइप लाइन के लिए गांव में खोदे गए रास्ते बदहाल हैं उसकी मरम्मत की सुविधा जिम्मेदारों को नहीं है। परियोजना का कार्य बंद रहने से ग्रामीणों में निराशा व्याप्त है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेन्द्र कुमार ने कहा कि जल निगम की उदासीनता के चलते जहां ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है, वहीं राजस्व की क्षति हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बंद पड़े परियोजना के कार्य को शुरू कराने की मांग की है।	रसूलपुर दियरा पेयजल योजना का श्री धर्मेन्द्र प्रसाद जूनियर इंजीनियर द्वारा दिनांक-08.05.2026 को स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं इनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेयजल योजना में 8700 मी० पाइप लाइन के सापेक्ष 9950 मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है, गृह जल संयोजन का कार्य 401 नग के सापेक्ष 350 नग कार्य पूर्ण है, शिरोपरी जलाशय का कार्य 90% पूर्ण कर लिया गया है उक्त योजना के अन्तर्गत डायरेक्ट नलकूप के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही थी वर्तमान में सोलर पैनल लगे VFD खराब होने कारण डायरेक्ट नलकूप के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति बाधित है। सोलर पैनल में लगे VFD का मरम्मत कार्य दिनांक-10.05.2026 तक पूर्ण कराकर डायरेक्ट नलकूप के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जाएगी। योजना के समस्त कार्यों को माह-जुलाई-2026 तक पूर्ण कराकर शिरोपरी जलाशय के माध्यम से सभी मजरो में नियमित जलापूर्ति की जाएगी। उक्त योजना के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार द्वारा भी जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उनको भी योजना से कब तक जलापूर्ति की जाएगी अवगत करा दिया गया है।

संलग्न-स्थलीय निरीक्षण फोटो ग्राफ संलग्न

भवदीय

(कमला शंकर)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यद्योपरि:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 3- मुख्य अभियन्ता(ल०क्ष०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अयोध्या।

अधिशासी अभियन्ता

अकबरपुर विकास खंड के रसूलपुर दियरा में पेयजल योजना का हाल पानी टंकी का निर्माण बंद शुद्ध पेयजल का इंतजार

अनदेखी

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में पानी टंकी का निर्माण अधर में लटका हुआ है। ठेकेदार निर्माण कार्य छोड़ कर बीते तीन वर्ष से फरार है। इस पानी टंकी का निर्माण वर्ष 2021 में शुरू किया गया था।

ग्राम पंचायत रसूलपुर दियरा में पेयजल योजना की खिल्ली उड़ रही है। यहां योजना के तहत 197.11 लाख की लागत से परियोजना का कार्य पूरा किया जाना था। कार्यदायी संस्था वेल्सपन कम्पनी द्वारा वर्ष 2021 में कार्य प्रारम्भ किया गया। परियोजना का कार्य 10 अप्रैल 2023 तक पूरा किया जाना था। इसमें कुल 401 घरों को योजना से आच्छादित कराना था लेकिन परियोजना का कार्य अधर में लटका हुआ है। सभी घरों में अभी तक टोटियां नहीं लग सकी हैं। जहां पानी की टोटियां लगी थी, उसमें अधिकतर टोटी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ग्रामीण पेयजल की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं लेकिन यहां तो ठेकेदार ही कार्य छोड़ कर तीन वर्ष से फरार हो गया है। हालात यह हैं कि पानी टंकी के निर्माण में प्रयुक्त बांस बल्लियां



रसूलपुर दियरा में बंद पड़ा पानी टंकी का निर्माण

जहां परियोजनाओं का कार्य पूरा नहीं है वहां शीघ्र ही पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं। कार्य में शिथिलता बरतने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अकबरपुर विकास खंड के रसूलपुर दियारा में पेयजल परियोजना का कार्य ठप होने के संबंध में जांच करा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कमला शंकर, अधिशासी अभियंता जलनिगम अम्बेडकरनगर

सड़ कर गिर रही हैं। पाइप लाइन के लिए गांव में खोदे गए रास्ते बंदहाल हैं उसकी मरम्मत की सुधि जिम्मेदारों को नहीं है। परियोजना का कार्य बंद रहने से ग्रामीणों में निराशा व्याप्त है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेन्द्र कुमार ने कहा कि जलनिगम की

उदासीनता के चलते जहां ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है, वहीं राजस्व की क्षति हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बंद पड़े परियोजना के कार्य को शुरू कराने की मांग की है।



GPS Map Camera

Rasulpur, Uttar Pradesh, India 

7fph+rh, Rasulpur, Uttar Pradesh 228131, India

Lat 26.285251° Long 82.479755°

Friday, 08/05/2026 03:00 PM GMT +05:30



GPS Map Camera

Rasulpur, Uttar Pradesh, India



7fph+rh, Rasulpur, Uttar Pradesh 228131, India


Lat 26.28526° Long 82.479754°

Friday, 08/05/2026 03:00 PM GMT +05:30

Google



Scanned with OKEN Scanner

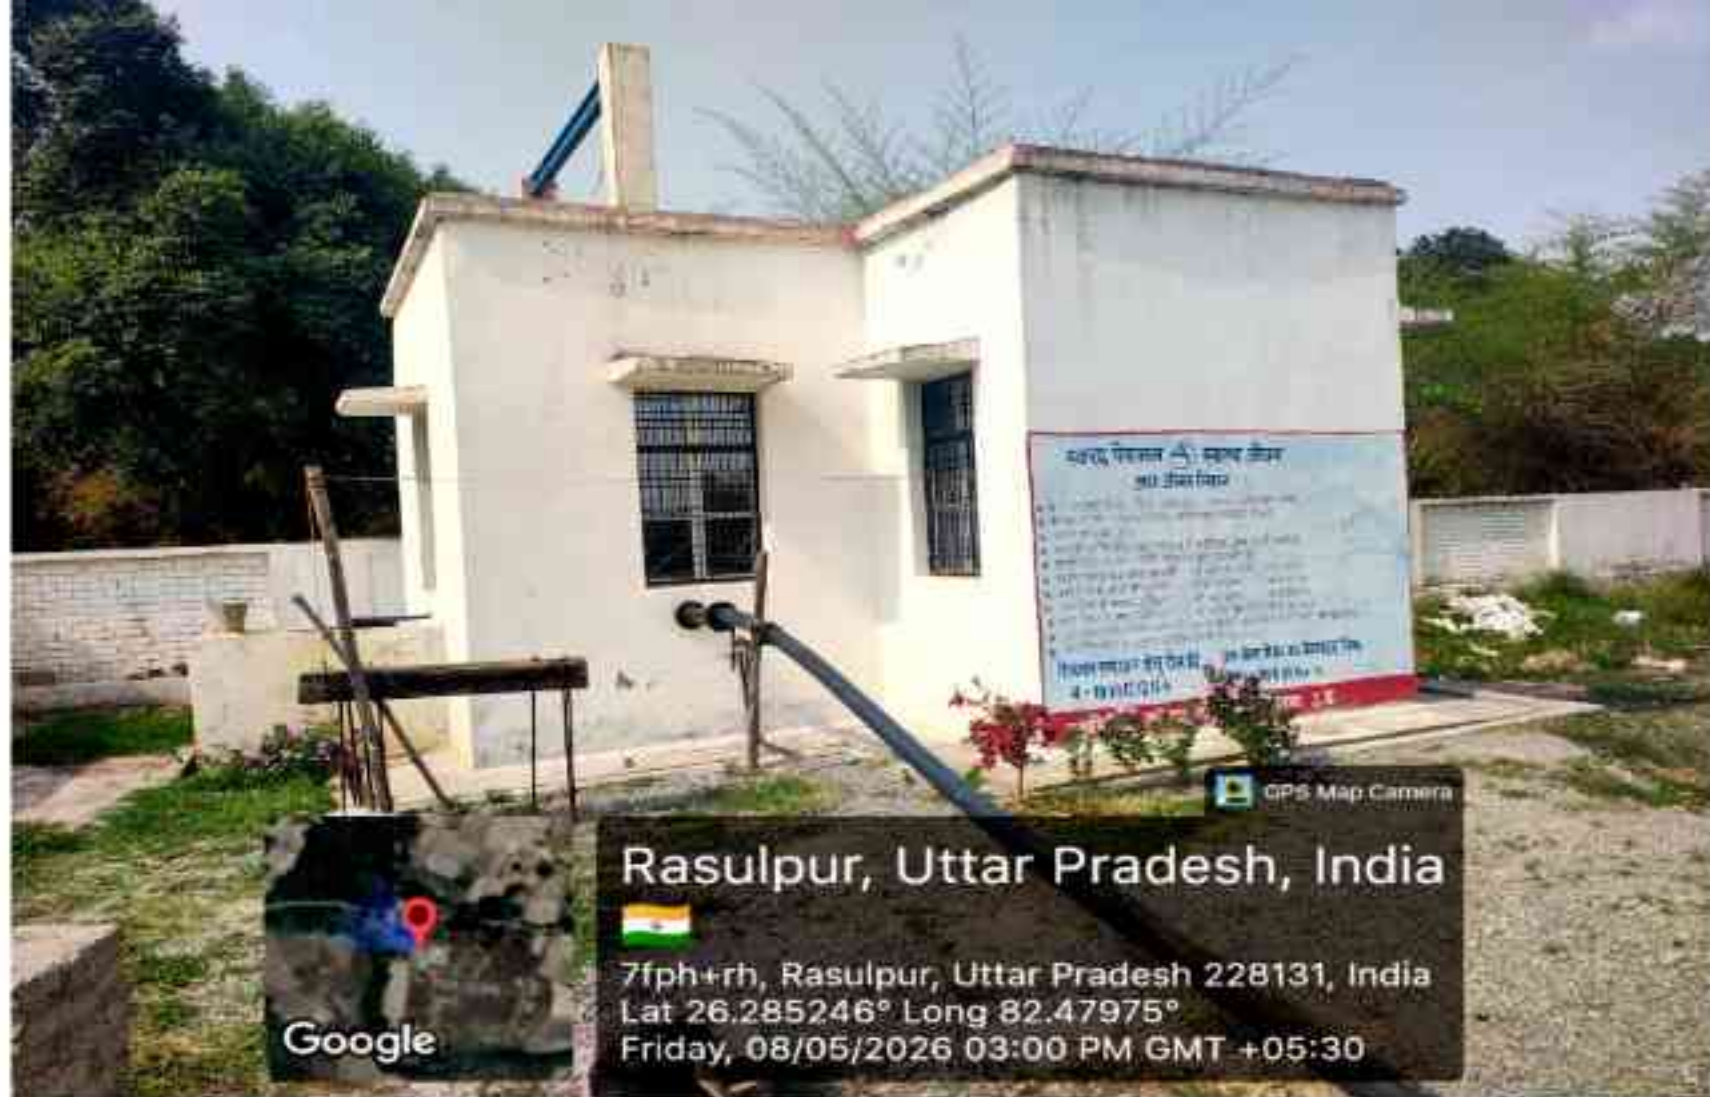

GPS Map Camera

Rasulpur, Uttar Pradesh, India




7fph+rh, Rasulpur, Uttar Pradesh 228131, India

Lat 26.285246° Long 82.47975°

Friday, 08/05/2026 03:00 PM GMT +05:30

Google



Lat 26.285278° Long 82.479754°

Google
