



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
विनोवापुरी (लोलेपुर), निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E-mail:- exenjn_sultanpur@yahoo.com

पत्रांक
सेवा में,

1886 /

W-19

/ 81

दिनांक 08/05/2026

जिलाधिकारी
सुलतानपुर।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 08.05.2026 को प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 08.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक "पांच करोड़ 51 लाख खर्च, तीन साल में पांच प्रतिशत टंकी बनी" के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद सुलतानपुर के विकासखण्ड-भदैया के अन्तर्गत अभियाकला पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, उच्च जलाशय (275 किली०/16मी०)-01 नग, पाइप लाइन-28.05 किमी०, बाउन्ड्रीवाल-01 नग, एफ०एच०टी०सी०-891 नग, सोलर-01 नग है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, उच्च जलाशय 01 नग प्रथम ब्रेस के ऊपर कॉलम तक कार्य (25%) पूर्ण, पाइप लाइन-20.50 किमी० पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, एफ०एच०टी०सी०-150 नग पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण हो चुका है। योजना की कार्यलागत रु० 551.50 लाख के सापेक्ष कार्यदायी फर्म को रु० 176.90 लाख का भुगतान हो चुका है।

कार्यदायी फर्म को पेयजल योजनाओं के धीमी प्रगति होने के कारण अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 2862/W-22 (Vindhya-GAJA (JV)/ (Sultanpur) Tech-05/ 2024-25 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 द्वारा 1% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

समाचार में पत्र में प्रकाशित खबर कि योजना पर पांच करोड़ 51 लाख खर्च एवं तीन साल में पांच प्रतिशत टंकी बनी के संदर्भ में अवगत कराना है कि योजना की कार्यलागत रु० 551.50 लाख के सापेक्ष कार्यदायी फर्म को वर्तमान तक रु० 176.90 लाख का भुगतान हुआ है तथा उच्च जलाशय का कार्य प्रथम ब्रेस के ऊपर कॉलम कास्टिंग तक पूर्ण है जो उच्च जलाशय की भौतिक प्रगति का 25% है।

वर्तमान में योजना के उच्च जलाशय का कार्य प्रगति पर (फोटोग्राफ संलग्न) है तथा शेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए दिसंबर 2026 तक योजना से जलापूर्ति प्रारंभ/सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अतः प्रकरण को निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Ramod
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण/ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-सुलतानपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
6. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री धर्मनाथ यादव, जूनियर इंजीनियर।
7. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंग-गाजा जेवी, नोएडा को इस निर्देश के साथ कि योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता


कार्यालय जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर

समाचार पत्र का नाम : दैनिक ज्ञान प्रकाशन स्थल : सुलतानपुर दिनांक : 08/05/2026

पांच करोड़ 51 लाख खर्च, तीन साल में पांच प्रतिशत टंकी बनीं

संसू जगमग • भदवा (सुलतानपुर) : हर घर तक पानी पहुंचाने की सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना जल्द में दम तोड़ती नजर आ रही है। जल्द मुख्यमंत्रालय के करीब डेढ़ दर्जन गांवों में योजना अभी भी अधूरी है। वहीं पानी की टंकी का निर्माण अधूरा है तो कहीं पाइपलाइन बिछाने की लेकर आए दिन विवाद हो रहा है। अभियांत्रिकी गांव में पाइप तो बिछ चुकी है, लेकिन टंकी का निर्माण केवल पांच प्रतिशत हो सका है और पांच करोड़ 51 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इस बार गांवों में भी प्राथमिकी को छोटी से शुद्ध जल मिलाने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है।

अभियांत्रिकी गांव में जल जीवन मिशन योजना तीन वर्ष पहले शुरू हुई थी। यहां खोरींग का कार्य तो पूरा

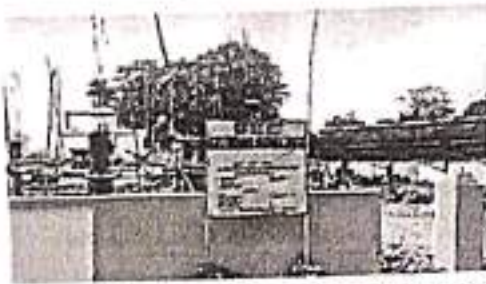

अभियांत्रिकी में पानी टंकी का अधूरा निर्माण व गांव में सड़क किनारे खुली पड़ी पाइप • जगमग

कर लिया गया, लेकिन पानी की टंकी का निर्माण महज पांच प्रतिशत ही हो सका है। इसके बाद ठेकेदार ने कार्य रोक दिया, जिससे पूरी योजना अधर में लटक गई। इस टंकी से सिन्धुपुर और टोडरपुर ग्रावों समेत कुल दो गांवों को लगभग 4629 लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। योजना पर

गांव में पांच करोड़ 51 लाख रुपये खर्च किए जाने का दावा किया गया है। दो गांवों में 28.05 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी थी। अधिकारियों के अनुसार अधिकतर गांवों में पाइप बिछाने का कार्य पूरा भी कर लिया गया है। कई जगहों पर घर-घर कनेक्शन के लिए टॉटिंग (कनेक्शन प्वाइंट) भी लगा

दी गई हैं, लेकिन मुख्य टंकी का निर्माण ठप होने से पूरी व्यवस्था बेकार साबित हो रही है।

जल्द पूरा होगा काम: अवर अभियंता जल जीवन मिशन धर्मनाथ यादव का कहना है कि अभियांत्रिकी, हनुमानगंज, सहित कई गांव में जल्द ही पानी टंकी का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

जिलाधिकारी महोदय की सेवा में,
अवलोकनार्थ प्रेषित

जिला सूचना अधिकारी
सुलतानपुर

जिलाधिकारी
सुलतानपुर

Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: gpc.upjal@vtlrewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/25

Date: 08.05.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject :- Submission of Completion Plan of Abhiyakala (Block Bhadaiya).

Dear Sir,

With Reference to above subject, We are hereby submitting to you updated progress and Completion plan of Abhiyakala (Block Bhadaiya). Total Estimate Cost Rs 551.5 Lakhs & Net Payment Received Rs 176.9 Lakhs. The last Payment was received in March 2025.

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	
5	Distribution(Kms)	28.05	20.50	7.55	25 Oct. 2026
6	FHTC(Nos)	891	150	741	10 Nov. 2026
7	Solar(Kw)	1	1	0	
8	Regular Water Supply	891	0	891	18-Nov.2026
9	OHT(275 KL 16M Staging)-Job	1	0.2	0.8	20 Dec. 2026

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.



For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV
(Authorized signatory)

विकासखण्ड-भदैया के अन्तर्गत अभियाकला पाइप पेयजल योजना के उच्च जलाश का कार्य प्रगति पर, का फोटोग्राफ

