



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
विनोवापुरी (लोलेपुर), निकट वर्मा उपवन, जनपद-सुल्तानपुर
Email ID- exenjn_rsultanpur@yahoo.com

पत्रांक 1952 / W-19 / 82

दिनांक : 12/05/2026

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर "हसनपुर में पानी की टंकी का निर्माण ठप: टोटियां भी नहीं लगी, जेई ने दिया निर्माण का आश्वासन" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-दूबेपुर में हसनपुर पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्च्या टेलीलिंक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-02 नग, पम्पहाउस-02 नग, बाउन्ड्रीवाल-02 नग, उच्च जलाशय (850 किली०/12 मी०)-01 नग, पाइप लाइन-46.40 किमी०, एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन-2683 नग, सोलर-02 नग हैं। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-02 नग पूर्ण, पम्पहाउस-02 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-02 नग पूर्ण, वितरण प्रणाली-32.80 किमी० पूर्ण, एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन-160 नग पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग (60%) पूर्ण है।

कार्यदायी फर्म अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/29 दिनांक 12.05.2026 (संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के समस्त कार्यों को दिनांक 10 दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराकर ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

सुवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) अयोध्या कैम्प-सुल्तानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) अयोध्या।
6. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री गौरव प्रकाश शर्मा, जूनियर इंजीनियर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स विन्च्या टेलीलिंक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: epc.upiaj@vtirewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/29

Date: 12.05.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject: - Submission of Completion Plan of Hasanpur (Block Dubepur).

Dear Sir,

With Reference to above subject, We are hereby submitting to you updated progress and Completion plan of Hasanpur (Block Dubepur).

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	2	2	0	
2	OP & Compressor(Nos)	2	2	0	
3	Pump House(Nos)	2	2	0	
4	BW(Nos)	2	2	0	
5	Distribution(Kms)	46.4	32.8	13.6	20 Sept.26
6	FHTC(Nos)	2683	160	2523	28 Nov.26
7	Solar(Kw)	2	0	2	25 Oct.26
8	Regular Water Supply	2683	0	2683	10 Dec.26
8	OHT(850 KL 12M Staging)-Job	1	0.6	0.4	26 Sept.26

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.




For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV
(Authorized signatory)

- टॉप न्यूज़
- राज्य-शहर
- चुनाव 2026
- IPL 2026
- भास्कर खास
- DB ओरि...
- स्पोर्ट्स
- बॉली...
- जॉब - एजु...
- बिज...
- लाइ...

Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Palhipur / Hasanpur
Water Tank Construction Stalled | JE Assures Completion

हसनपुर में पानी की टंकी का निर्माण ठप: टोटियां भी नहीं लगी, जेई ने दिया निर्माण का आश्वासन

अम्बरीश अग्रहरी |
पलहीपुर(सदर तहसील), सुलतानपुर
22 घंटे पहले

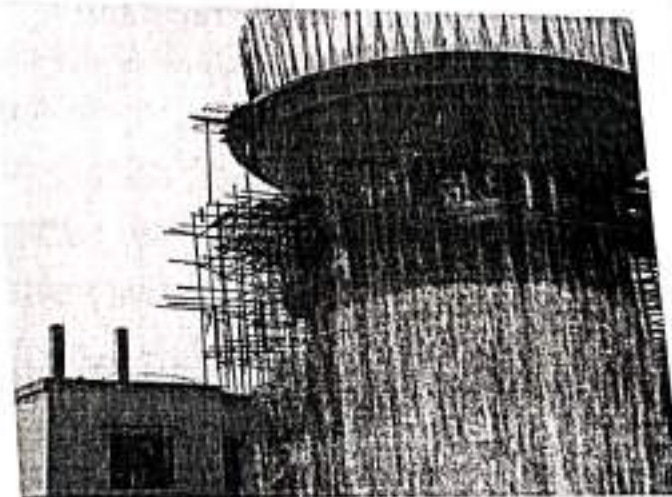


पानी की टंकी

दैनिक
भास्कर
को
Google
पर
पसंदीदा
सोर्स
बनाएं
→

+Follow us

फॉलो करें





होम



वीडियो



सर्च

वेब
स्टोरीज

ई-
पेपर

उत्तर...

देश

विदेश

राशि...

टेक -
ऑटो

फेक
न्यूज...

ओ...

मधु...

मेग...

यूटि...

लाइफ
...

मध्य
प्रदेश

उत्तर...

राज...

बिहार

हसनपुर में 'जल जीवन मिशन' के तहत पानी की टंकी का निर्माण महीनों से रुका हुआ है। बजट आवंटित होने के बावजूद गांव में न तो टंकी बन पाई है और न ही घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू हो सकी है।

निर्माण कार्य ठप होने के कारण ग्रामीण और पशु पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र के छोटे तालाब और पोखर सूख गए हैं, जिससे पशुपालकों को अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए दूर के हैंडपंपों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

ग्रामीणों जबीउल्लाह अंसारी, मोहम्मद इदरीश, मोहम्मद कासिम, रवि कनौजिया, महेश कुमार, पवन कुमार, बृजेश कुमार, विजय मौर्य, शम्सुद्दीन और धीरज प्रजापति ने बताया कि गांव में अभी तक मुख्य पानी की टंकी का निर्माण अधूरा है और स्टैंड पोस्ट पर भी टोटियां नहीं लगाई गई हैं। उनके अनुसार, जब संबंधित इंजीनियरों से संपर्क किया जाता है, तो वे जल्द काम शुरू करने का आश्वासन देते हैं।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विभाग के इंजीनियर और कार्यदायी संस्था केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपये का बजट होने के बावजूद हसनपुर में पीने के पानी की कमी बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय पर पानी की टंकी का निर्माण पूरा कर आपूर्ति शुरू नहीं



वीडियो

आज का राशिफल मेष ✓




मेष | Aries

पोजिटिव- आज किसी खास मुद्दे पर परिवार के लोगों के साथ बातचीत हो सकती है। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वे आपकी सूझबूझ से सहज और आसान तरीके

और पढ़ें

Download App from



होम



वीडियो



सर्च

वेब
स्टोरीज

Download on the
App Store

शर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य जल्द ही शुरू
करवाया जाएगा।

Follow us on



दैनिक भास्कर को Google पर
पसंदीदा सोर्स बनाएं →



खबरें और भी हैं...

सुल्तानपुर में संजय सिंह ने
PM मोदी को दी सलाह:
बोले- रैलियां, रोड शो और
विदेश यात्राएं बंद करें
प्रधानमंत्री, वार्दों को बताया
झूठा



सुल्तानपुर >

शेयर

सुल्तानपुर में बोलेरो की
टक्कर से 2 भाइयों की मौत:
बैड का सामान उतरते समय
हादसा, जौनपुर में शादी
समारोह से लौटे थे



सुल्तानपुर >

शेयर

Rechnowal Policy

Copyright © 2024-25 IRI Corp.

Cookie Policy | Privacy Policy

Our Divisions

DainikBhaskar.com

DivyaBhaskar.com

BhaskarEnglish.in

DivyaMarathi.com

MoneyBhaskar.com

BhaskarAd.com

Copyright © 2024-25 IRI Corp.
All Rights Reserved

This website follows the IRIW
Code of Ethics.

मीडिकेट
