



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम- भन्सरिया, पो०-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक
सेवा में,

3149 / M-48 / 146

दिनांक 03/10/2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन का सोलर प्लांट बदहाल, 8 प्लेटें टूटीं: लखीमपुर खीरी के दुबहा गांव में देखरेख के अभाव में, पानी का संकट" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,


उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन का सोलर प्लांट बदहाल, 8 प्लेटें टूटीं : लखीमपुर खीरी के दुबहा गांव में देखरेख के अभाव में, पानी का संकट" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन०सी०सी० एवं वी०टी०एल० को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जाना लक्षित है। नलकूप-942 नग, पम्प हाउस -942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 14468 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-532669 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1147 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की खबर विकास खण्ड-निघासन की ग्राम दुबहा गांव से सम्बन्धित हैं। जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि दुबहा पाइप पेयजल योजना का कार्य कार्यदायी एजेंसी मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत नलकूप-2 पम्प हाउस-2, वितरण प्रणाली 25.46 किलोमीटर, शिरोपरि जलाशय 400 किलो लीटर 18 मीटर स्टेजिंग व गृह जल संयोजन 1291 नग प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-2, पम्प हाउस-1, वितरण प्रणाली 25 किलोमीटर, शिरोपरि जलाशय 400 किलो लीटर 18 मीटर का कार्य टाप डोम तक व गृह जल संयोजन 734 नग का कार्य पूर्ण है।

उक्त खबर का संज्ञान लेकर जूनियर इंजीनियर श्री अंशू वर्मा द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि दुबहा पाइप पेयजल योजना में पाइपलाइन ज्वाइंटिंग व टेस्टिंग का पूर्ण नहीं है जिससे जलापूर्ति चालू नहीं करायी जा सकी है। उक्त से सम्बन्धित कार्यदायी एजेंसी को शीघ्र अति शीघ्र ज्वाइंटिंग व टेस्टिंग का कार्य पूर्ण करवा कर जलापूर्ति सुचारु रूप से प्रारंभ करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उक्त कार्य को सतत अनुश्रवण करते हुए जलापूर्ति जल्द से जल्द प्रारम्भ करा दी जायेगी। योजना को पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि माह जनवरी 2027 है।

सादर सूचनार्थ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

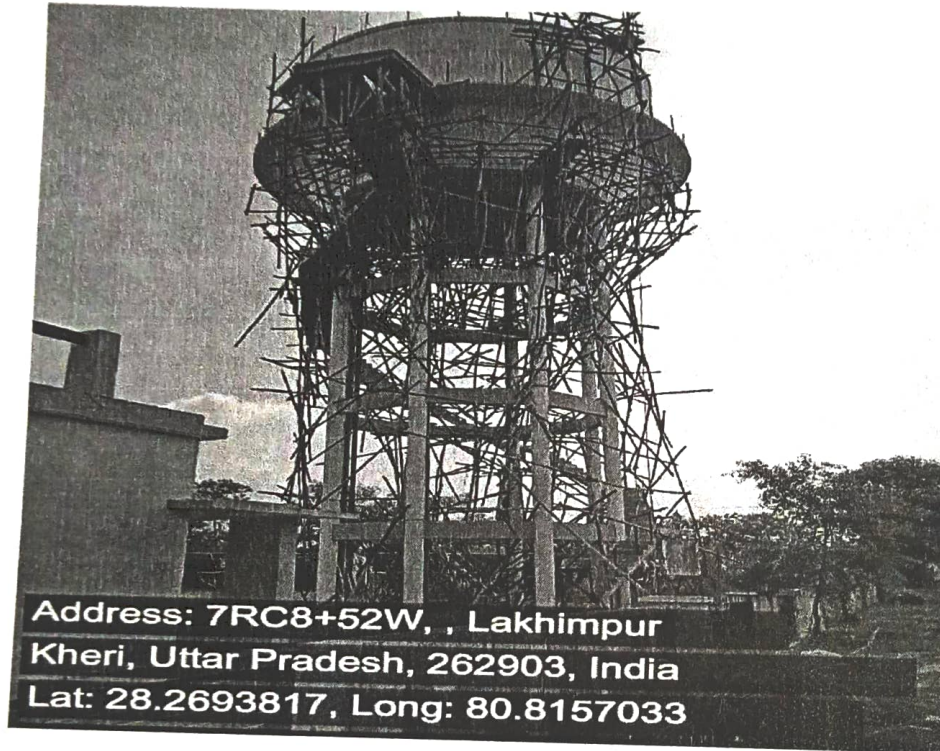

भवदीय

(Signature)

अधिशायी अभियन्ता।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ, उ०प्र०।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (खण्डान्तर्गत)
3. मो० जमाल (डी०पी०एम०), मै० एन०सी०सी० लि० गाजा-लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पाइप पेयजल योजना में शीघ्र-अतिशीघ्र पाइपलाइन ज्वाइंटिंग व टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कराकर सुचारु रूप से जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

अधिशायी अभियन्ता।
