



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),

म0नं0- 596, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़-230001

पत्रांक:- 4602 / स्म - 12 / 87

दिनांक:- 09/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक- 09.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की टंकियां अधूरी, ग्रामीण परेशान" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक- 09.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन की टंकियां अधूरी, ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 3- मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 6- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़।

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का विवरण एवं अद्यतन आख्या

क्र० सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
1	प्रतापगढ़	दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दिनांक- 09.10.2026	जल जीवन मिशन की टंकियां अधूरी, ग्रामीण परेशान	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड- बाबा बेलखरनाथ धाम में चौखड़ा पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 90 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 70 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 70 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 90 प्रतिशत एवं गृह संयोजन 40 प्रतिशत का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त पेयजल योजना से वर्तमान में आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड- बाबा बेलखरनाथ धाम में ग्राम दुलापुर (रूदापुर) पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग- 100 प्रतिशत, पम्प हाउस- 70 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल- 70 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय- 60 प्रतिशत, वितरण प्रणाली- 85 प्रतिशत एवं गृह संयोजन- 30 प्रतिशत का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है। योजना के समस्त निर्माण कार्य दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है, वर्तमान में योजना से वर्तमान में आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। उपरोक्त पेयजल योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने हेतु खोदी गयी सड़कों/मार्गों के मोटरबुल का कार्य प्रगति पर है (फोटोग्राफ संलग्न)। कुछ स्थानों पर वर्षा ऋतु के कारण मिट्टी बैठ जाने से उन स्थानों पर पुनः मोटरबुल का कार्य करा दिया गया है। संलग्नक- फोटोग्राफ।	-


अधिशासी अभियन्ता



GPS Map Camera

Google


Pratapgarh City, Uttar Pradesh, India



W28q+vm5, Pratapgarh City, Uttar Pradesh 230403, India

Lat 25.916778° Long 82.036455°

Friday, 09/10/2026 12:53 PM GMT +05:30

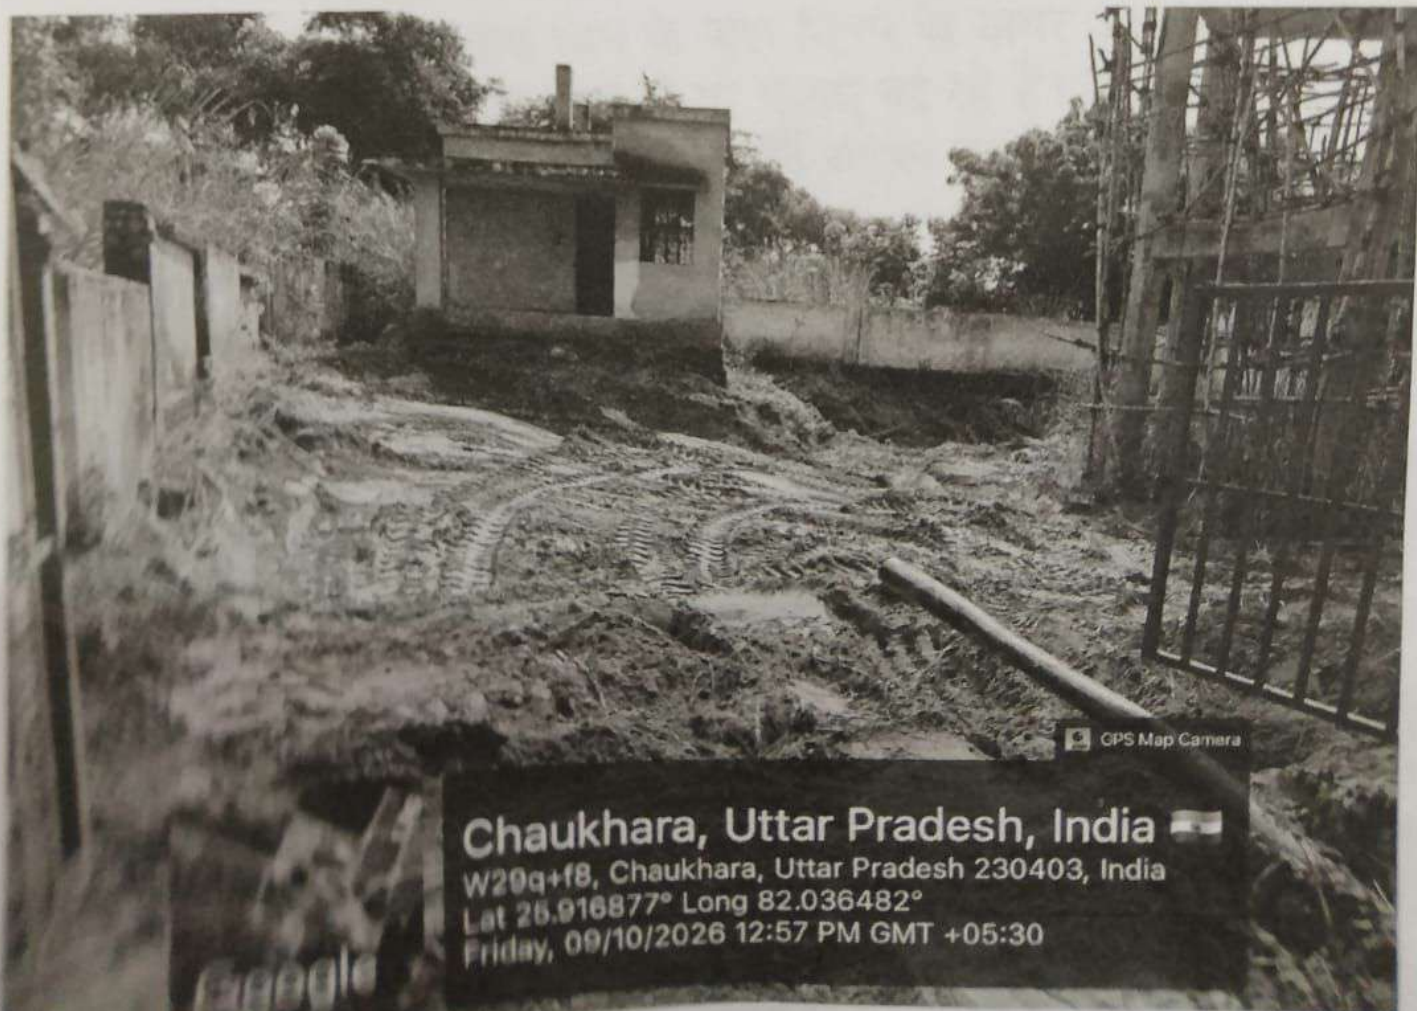

GPS Map Camera

Google

Chaukhara, Uttar Pradesh, India



W29q+f8, Chaukhara, Uttar Pradesh 230403, India

Lat 25.916877° Long 82.036482°

Friday, 09/10/2026 12:57 PM GMT +05:30
