


अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 10 अगस्त, 2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 10.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (JWSM) की बैठक जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमे निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री अनुपम शुक्ला	जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2	श्री आलोक प्रसाद	मुख्य विकास अधिकारी	प्रशासनिक विभाग
3	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	जिला पंचायत राज अधिकारी	पंचायती राज विभाग
4	इ० राजीव कुमार	अधिशाली अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
5	इ० शशिपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
6	इ० शुभम सिंह	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
7	श्री राजा राम सिंह	जिला समन्वयक	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई
8	श्री विजय सेठ	डी०पी०एम०	मेसर्स मेघज-थर्ड पार्टी एजेंसी
9	श्री अभिषेक आनन्द	डी०टी०एल० (ओ० एण्ड एम०)	मेसर्स मेघज-थर्ड पार्टी एजेंसी
10	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स एल० एण्ड टी०
11	श्री नीरज झा	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स वी०एस०ए०
12	श्री अतुल गौड़	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स एच०एफ०सी०एल०

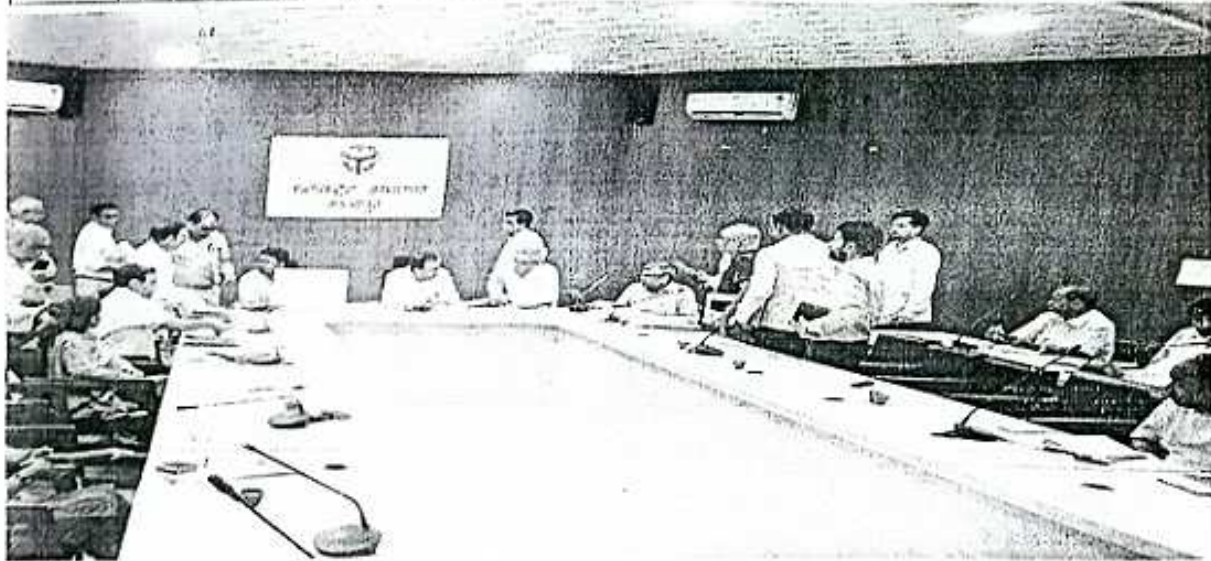

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत :-

Table No.-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
3	16	0	1	2	0	0

Table No.-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशायी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हें माह सितम्बर, 2026 तक एवं शेष पेयजल योजनाओं माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	Fully Functional	RWS Village Status Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
132	464	114	335	15

Table No-1 A के अंतर्गत संचालन एवं अनुस्क्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म मे मेसर्स सरला को०आई०पी०एल० को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुस्क्षण मद में स्वीकृत कार्यो को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजना बद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed/ WIP Schemes	Total No of Village Not Completed/ WIP	No of Financially Not Completed/ WIP Schemes	Total No of Village Financially Not Completed/ WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	80	32	80	8	18	0	0	24	62

Table No- 1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशायी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 32 नग पेयजल योजनाये जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-2: Physical Progress Phase wise

Sr. No.	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress	Direct Purples & Scheme Villages	No RWS Schemes Villages	Villages in O&M	OHT	Completed OHT
				Total RWS Villages	100%, 90% to 99%, < 90%	O&M Scheme Villages	Trail Run Scheme Villages	Schemes Villages			but not RWS	Required OHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JMN] HPCL-JWEL (JV)	412	1047	425	48 75 352	19 43	41 101	352 903	132 313	214 662	0	412	55
2	[JMN] Larsen & Toubro Ltd	176	422	302	196 6 100	83 149	62 153	51 129	15 39	69 114	0	176	115

3	(Jal Nigra) VSA	175	160	315	77 11 231	22 65	22 81	121 625	36 165	101 444	0	247	79
4	(Jal Nigra) Sarala Project Works	132	84	119	114 66 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		803	2702	1501	451 118 952	104 253	123 333	524 1648	183 505	384 1162	0	875	249

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि -

(i) 239 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनायें जो Single-Village Scheme Category में हैं, उन प्रत्येक योजनाओं को माह मार्च 2027 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(ii) मेसर्स एल० एण्ड टी० द्वारा जो 62 नग पेयजल योजनायें (153 राजस्व ग्राम), मेसर्स वी०एस०ए० द्वारा 32 नग पेयजल योजनायें (81 राजस्व ग्राम) एवं मेसर्स एच०एफ०सी०एल० द्वारा 41 नग पेयजल योजनायें (181 राजस्व ग्राम) ट्रॉयल एण्ड रन में हैं, उन्हें ओ० एण्ड एम० में ले जाने हेतु Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को माह सितम्बर, 2026 तक ओ०एण्ड एम० में ले जाने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

(iii) जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

(iv) जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्य योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथा शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-2A: Single Village Scheme Physical Progress

SN O	Type	Total Schemes	Total Village in Covered Village	BWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Village is in O&M but not BWS/ No Disem pation	OIT Requ ired O&M ?	Comple d OIT	Finan cial Detail (Lak h) Esti mated Cost	Expe ndi ture
				Total B WS Villages (BWS%)	100% 99% 90-99 % < 90%	O&M Schemes + Villages	Total BWS Schemes + Villages	Schemes + Villages	Direct Pumping + Schemes + Villages	No BWS Schemes + Villages					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGL E VILLA GE SCHE ME (JRM)	239	239	123 51%	42 9 34	39 39	51 51	149 149	52 52	110 110	0	239	84	64432 86	2544 9.69
2	SINGL E VILLA GE SCHE ME (Jal Nigra)	40	40	38 95%	7 7 29	3 3	8 8	0 0	0 0	0 0	0	0	0	128.8 2	112.2
Total		279	279	161 58%	47 11 103	42 42	51 51	149 149	52 52	110 110	0	239	84	6452 88	2556 1.89

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जन पद में 02 कैटेगरी की योजना यें है, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme) A SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया-

S.NO	Firm Name	Scheme	Village	O&M Scheme	Village	WIP Scheme
1	M/s HFCL	130	130	6	6	115
2	M/s VSA Infra	36	36	5	5	31
3	M/s L&T	73	73	25	25	46
Total		239	239	36	36	192

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/ अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं।

- फर्म मेसर्स एच०एफ०सी०एल० द्वारा 115 जल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- फर्म मेसर्स वी०एस०ए० द्वारा 31 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उन की कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- फर्म मेसर्स एल० एण्ड टी० द्वारा 46 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उन की कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- जिन SVS पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है उन पर यथा शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
- जिन 122 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टि फाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) को दियेगये।

Table No.-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

Sl.No.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tulla Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tulla Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	HFCL-JWIL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Larsen & Toubro Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sarala Project Works(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HFCL- JWIL (JV)(JIM)	1047	14	10	22	7	671
2	Larsen & Toubro Ltd(JIM)	422	106	58	131	82	287
3	VSA(JIM)	769	30	23	54	23	460
4	Sarala Project Works(Jal Nigam)	464	444	4	4	384	0
Total		2702	594	95	211	496	1418

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उपग्राम जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण करा कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A: RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	2769	2745	1	23	99.13%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किशेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5: Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	टयबवेल	1055	1031	97.73
2	पम्प हाउस	1055	935	88.63
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	1055	384	36.4
4	ओवर हेड टैंक (OHT)	875	799/249	91.31
5	पाइप लाइन बिछाने का कार्य (कि०मी०)	11790	10352	87.8
6	सौर ऊर्जा प्लान्ट	578	403	69.72
7	घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)	517490	481700	93.08
9	सड़क मरम्मत का कार्य	3611	3502	96.98
10	वे गॉव जाहें 100 प्रतिशत सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	2238	1418	63.36
11	कमीशनिंग गॉव	2238	676	30.21
12	नियमित जल आपूर्ति	2238	1053	47.05

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि—

- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जार ही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बना कर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- फर्म मेसर्स एच०एफ०सी०एल०, मेसर्स वी०एस०ए० एवं मेसर्स एल० एण्ड टी० को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती हैं तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय /संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Larsen & Toubro Ltd	176	46	0	63	42	0
2	HFCL- JWIL (JV)	412	126	41	19	19	16
3	VSA	175	136	20	22	22	13
Total		763	308	61	104	83	29
1	Jal Nigam	132	0	0	0	0	0
Total		895	308	61	104	83	29

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज को निर्देशित किया गया कि –

- जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
- जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7: Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HFCL- JWIL (JV)	544	532	12	66	64	2
2	Larsen & Toubro Ltd	364	347	17	210	202	8
3	VSA	399	381	18	60	58	2
4	Sarala Project Works(Jal Nigam)	575	555	20	49	48	1
Total		1882	1815	67	385	372	13

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 80 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	21	21	0	100
2	Fluoride	22	22	0	100
3	JE/AES	2	2	0	100

Table No-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड / जेई/ ईई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की जमीनी स्तर पर पहचान करा ले एवं अधोहस्ताक्षरी को सुचित करें।

Table No.-9: Water Quality Testing in HGJ Certified Villages (by FTK)

Sr. No.	District Name	Quarterly planned (No. of test in quarter)	No. of villages	Total achieved in Q1	%age Achieved in Q1	Target for Month (July + August)	%age Achieved in (July + August)	Achievement in Q2 (July+ August)	Total achieved in Q2	%age Achieved in Q2
1	Ghazipur	1.161	387	127	10.94%	774	77.13%	597	597	51.42%

Table No.-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जलनिगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिन में नियमित जलापूर्ति होर ही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-10: Automation Integrated Schemes

S. N	District Name	Agency Name	Total Schemes	Total Subscriptions Lot Hub against JJM Schemes	O&M Schemes	O&M Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EE E&M Scheme	Live connected Scheme	No. of Schemes data not received past two days	Integrated with Automation Scheme	Total Integrated Scheme Status Data Verify by EE E&M Scheme
1	Ghazipur	HFCL	366	179	61	52	10	50	2	70	10
2	Ghazipur	VSA	456	120	162	131	7	45	83	157	7
3	Ghazipur	L&T									
-	Total	-	822	299	223	183	17	95	85	227	17

Table No.-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए SCADA/ Automation Integrated Scheme लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा

फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जलनिगम (ग्रामीण), वाराणसी को निर्देशित किया गया कि सभी ओ० एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation Integrated System कर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु -

1- जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिन स्थानों पर भूमि अभी तक अप्राप्त है, के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 06 ग्रामों में भूमि अप्राप्त है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	फर्म का नाम
1	गाजीपुर सदर	गाजीपुर सदर	गोड़ा पेयजल योजना	मेसर्स एच०एफ०सी०एल०
2	गाजीपुर सदर	गाजीपुर सदर	सोन्हुलिया उर्फ बकुलियापुर पेयजल योजना	मेसर्स एच०एफ०सी०एल०
3	मुहम्मदाबाद	मुहम्मदाबाद	नाथनपुर पेयजल योजना	मेसर्स एच०एफ०सी०एल०
4	मुहम्मदाबाद	मुहम्मदाबाद	हनुमानगंज उर्फ कल्याणपुर (तड़वा)	मेसर्स एच०एफ०सी०एल०
5	जमानियों	रेवतीपुर	गोपालपुर पेयजल योजना	मेसर्स वी०एस०ए०

विशेष निर्देश:-

1- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि मेसर्स एल० एण्ड टी० के एम०डी० को लक्षित 37 नग योजनाएं जो कि 75 प्रतिशत से ऊपर हैं उनको दो माह में पूर्ण कराना, श्रमिकों की संख्या कम होने एवं 25 नग योजनाओं में बैटरी की अनुपलब्धता होने के कारण योजना पूर्ण नहीं हो पा रही है, के कारण नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि मेसर्स वी०एस०ए० एवं मेसर्स एच०एफ०सी०एल० के एम०डी० को लक्षित योजनाओं को समयबद्ध पूर्ण न कराने एवं योजनाओं पर श्रमिकों की संख्या कम होने के कारण नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित करें।

3- 115 नग पेयजल योजनाएं जिसमें ट्रायल एण्ड रन पूर्ण हो चुका है उसका सत्यापन जिला पंचायत राज अधिकारी से कराते हुए उसकी आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि लक्षित योजनाओं में प्रतिदिन श्रमिकों की संख्या अधोहस्ताक्षरी को सुचित करें।

5- पुर्नगठन पेयजल योजनाओं में धन उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त मण्डल, वाराणसी को पत्र के माध्यम से सुचित करें एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा निरंतर समीक्षा करें।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कराते हुए जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, गाजीपुर उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उपरोक्त गठित निरीक्षण समिति को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में खारा पानी प्राप्त हुआ है उनकी विस्तृत रिपोर्ट निर्णय मैट्रिक्स के अनुसार डी०डब्ल्यू०एस०एम०की आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)/
डी०डब्ल्यू०एस०एम०, गाजीपुर

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गाजीपुर

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गाजीपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक: 1558 / D.W.S.M / कार्यवाही / 37 / दिनांक - 01/09/2024
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(वाराणसीक्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
6. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
9. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
10. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
11. समस्त कार्यदायी संस्था, डी०सी०-डी०पी०एम०यू०, डी०पी०एम०-टी०पी०आई०, गाजीपुर।

जिलाधिकारी
गाजीपुर।
