



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

पत्रांक:- 1288 / जल जीवन मिशन / 212 दिनांक 29-9-2026

सेवा में,

ई-मेल

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित "जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज : फिरोजाबाद में एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी, काम में तेजी लाने के निर्देश दिए" खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 29.09.2026 को दैनिक भास्कर आगरा प्रकाशन के समाचार पत्र में प्रकाशित "फिरोजाबाद में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी। यह बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में हुई।"

अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद में फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिये "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम (फेज-4) के अन्तर्गत सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना हेतु अनुबन्धित फर्म मै० एन०सी०सी० लिमिटेड एवं मै० लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड द्वारा क्रमशः पैकेज-1 एवं पैकेज-2 के अन्तर्गत कार्यों का सम्पादन कराया जा रहा है। सतही जल स्रोत आधारित पेयजल योजना से जनपद एटा के परगना- मरहरा, ग्राम भडेरा के पास लोअर गंगा कैनल से कच्चा जल प्राप्त करते हुये जल शोधन उपरान्त जनपद फिरोजाबाद के समस्त 09 विकास खण्डों के 780 राजस्व ग्रामों की कुल जनसंख्या-19,31,000 (वर्ष 2024 के अनुसार) एवं जनपद आगरा के समस्त 15 विकास खण्डों के 899 राजस्व ग्रामों की कुल जनसंख्या-29,95,770 (वर्ष 2024 के अनुसार) को शुद्ध पेयजल से संतृप्त करते हुये "हर घर नल से जल" दिया जाना प्रस्तावित है।

योजना के पैकेज-1 अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य 1 नग Intake/Offtake Arrangement (586 MLD), 01 नग WTP(456 MLD), 157.53 कि०मी० राइजिंग मेन, 02 नग (MIBPS-1 & 2), के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष Intake/Offtake Arrangement (586 MLD) के 90% कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, और Intake पर Valve Chamber के 90% कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, Raw Water Reservoir Cum Pump House के फाउन्डेशन कास्टिंग का कार्य प्रगति पर है, जिनकी भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है। WTP (456 MLD) के अन्तर्गत Cascade Aerator & Inlet Works (86%), 8 नग Clarifocculator (85%), Filter House (52%), Clear Water Reservoir (72%), Chemical House (79%), के यूनिट के कार्य प्रगति पर हैं, जिनकी औसतन भौतिक प्रगति 81 प्रतिशत है। Clear Water Rising Main 157.53 KM के सापेक्ष 157.53 KM पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 125.00 KM पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 78.00 प्रतिशत है। MIBPS-1 (12700 KL) का निर्माण कार्य ग्राम रामगढ़ उमरगढ़ विकास खण्ड टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन है, जिसके अन्तर्गत Clear Water Reservoir के Slab Suttering का कार्य प्रगति पर है, जिनकी औसतन भौतिक प्रगति 82.00 प्रतिशत है। MIBPS-2 (2900 KL) का निर्माण कार्य ग्राम इन्दरई विकास खण्ड हाथवन्त, जनपद फिरोजाबाद में



निर्माणाधीन है, जिसके अन्तर्गत Clear Water Reservoir Cum Pump House के Slab Casting एवं Staff Quarter के कार्य प्रगति पर है, जिनकी औसतन भौतिक प्रगति 81.00 प्रतिशत है। पैकेज-1 की कुल भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत है।

योजना के पैकेज-2 अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य 08 नग IBPS, 249 नग अवर जलाशय, 1332.73 कि०मी० राइजिंग मेन, 5424.70 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 210811 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा प्रस्तावित समस्त 08 नग IBPS (600 KL - 1250 KL) के CWR की Wall Casting, Column Casting, एवं Slab Casting, 8 नग Pump House एवं 6 नग Staff Quarter के कार्य प्रगति पर है, जिनकी औसतन भौतिक प्रगति 72 प्रतिशत है। प्रस्तावित Clear Water Rising Main 1332.73 KM के सापेक्ष 487.00 KM पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 438.00 KM राइजिंग मेन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 32.20 प्रतिशत है। कुल प्रस्तावित 249 नग अवर जलाशयों के सापेक्ष समस्त अवर जलाशयों पर कार्य प्रगति पर है, जिनकी कुल भौतिक प्रगति 37 प्रतिशत है। प्रस्तावित Distribution Network 5424.70 KM के सापेक्ष 4875.00 KM पाइप की आपूर्ति प्राप्त करते हुये 3626.00 KM वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पैकेज-2 की कुल भौतिक प्रगति 64 प्रतिशत है।

पैकेज-1 अन्तर्गत किसानों के खेतों से होकर बिछायी जा रही पाइप लाइन हेतु 482 गाटा हेतु फसल प्रतिकर दिया जाना है, जिसके सापेक्ष 207 गाटा हेतु रू० 11180754.00 का भुगतान सम्बन्धित गाटाधारक को कर दिया गया है।

जल जीवन मिशन(चरण-4) के अन्तर्गत सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु कार्यों को तीव्रगति से पूर्ण कराने हेतु फर्मों को निर्देशित किया जाता रहा है, उक्त कार्यों की समीक्षा जिला प्रशासन एवं कार्यालय स्तर से निरन्तर की जा रही है। परियोजना के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किये जाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं, योजना के समस्त कार्य माह दिसम्बर, 2027 तक पूर्ण होने के उपरान्त जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल से आच्छादित किया जा सकेगा।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार सिंह)
अधिसासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
- 3- मुख्य अभियन्ता(आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
- 5- अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
- 6- समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
- 7- मै० एन०सी०सी० लिमिटेड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त के सम्बन्ध में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों को कराना सुनिश्चित करें।
- 8- मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त के सम्बन्ध में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों को कराना सुनिश्चित करें।

अधिसासी अभियन्ता

दैनिक भास्कर

राज्य-शहर

तेजस्विनी

भास्कर इन्वेस्टिगेशन

क्रिकेट

भास्कर खास

DB ऑरिजिनल

स्पोर्ट्स


बॉलीवुड

जॉब - एजुकेशन

विजनेस

जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज: फिरोजाबाद में एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी, काम में तेजी लाने के निर्देश दिए

सूक्ष्म कुमार बघेल | फिरोजाबाद, फिरोजाबाद 3 दिन पहले

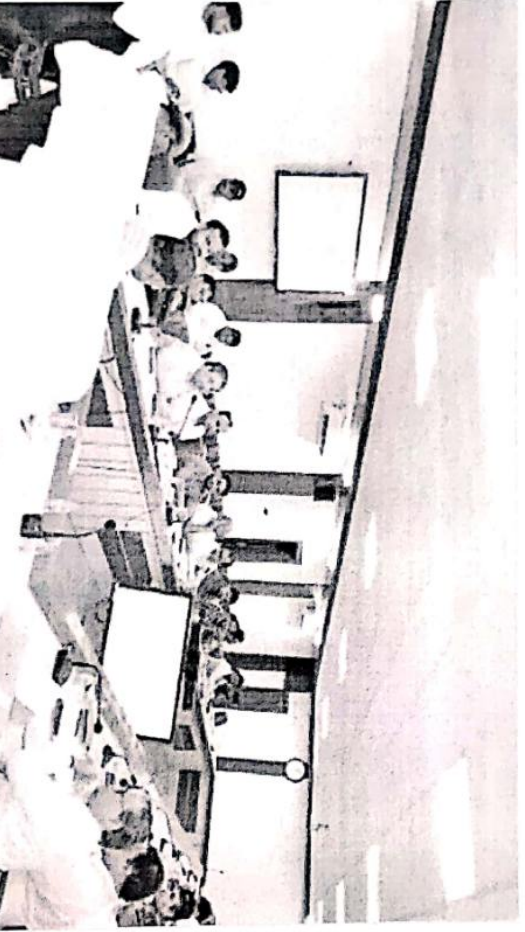

वीडियो

एशियन गेम्स

और देखें
