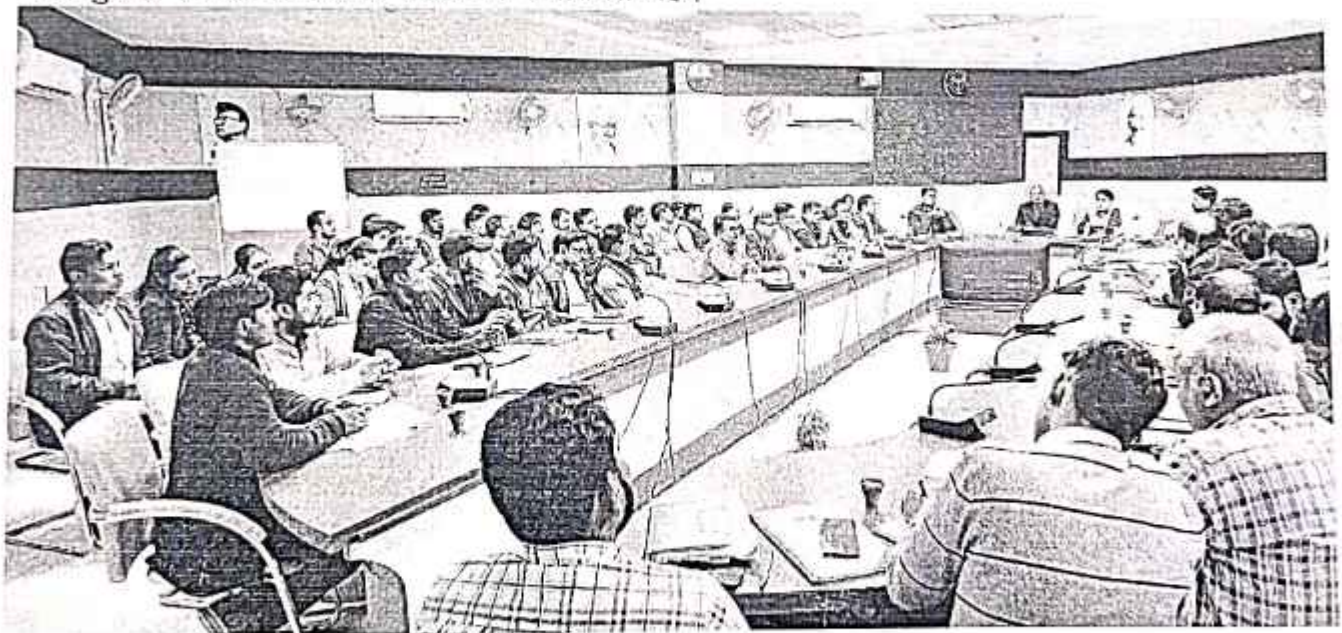


मुख्य विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 15.02.2025 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

- 1- जिला विकास अधिकारी
- 2- जिला प्रबन्धक कौशल विकास मिशन
- 3- जिला कृषि रक्षा अधिकारी
- 4- उपायुक्त, श्रम व रोजगार
- 5- सहायक आयुक्त, सहकारिता
- 6- जिला कृषि अधिकारी
- 7- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
- 8- अवर अभियन्ता भूमि संरक्षण कार्यालय, कृषि
- 9- समस्त खण्ड विकास अधिकारी
- 10- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
- 11- जिला कोऑर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0
- 12- समस्त, अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण
- 13- समस्त नामित आई0एस0ए0
- 14- प्रतिनिधि, एन0सी0सी0
- 15- प्रोजेक्ट मैनेजर, त्रुटि कोया
- 16- टीम लीडर मेधज व अन्य

दिनांक 15-02-2025 को अपरान्ह 3.30 बजे से बैठक आहुत किया गया। बैठक में खण्ड विकास अधिकारी खोराबार बिना सूचना के अनुपस्थित थे, जिस पर काफी नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति प्राप्त किये कोई भी अधिकारी बैठक में अनुपस्थित न रहें। उक्तानुसार समस्त अधिकारी बैठक में उपस्थित रहें।



अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोडल अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित ओवर हेड टैंक एवं अन्य परियोजनाओं तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का किये गये सत्यापन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें पायी गयी विभिन्न कमियों के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी विवरण निम्नवत है :-

जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड खोरावार के ग्राम पंचायत महिमाठ, सोनवे, लालपुर टीकर प्रथम, सेमरा मानिक चक, खिरवलिया, लालपुर टीकर द्वितीय, में ओ०एच०टी० का कार्य, बाउण्ड्रीवाल, सीढ़ी एवं इण्टरलाकिंग का कार्य अपूर्ण है।

इसी प्रकार ब्रम्हपुर में ग्राम पंचायत खैरखुटा, मुण्डेरा, करौता, में हाउस कनेक्शन एवं सड़क मरम्मत का कार्य अपूर्ण है।

बैठक में उपस्थित एन०सी०सी० के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत सोनवे में ज्वाइंट कनेक्शन का कार्य चल रहा है, ग्राम पंचायत जं० गौरी नं० २ में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि १५ दिवस के अन्दर कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी।

बैठक में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पाईप का कनेक्शन करते समय सी०सी०रोड, इण्टरलाकिंग तोड़ दिया जा रहा है तथा उसका मरम्मत सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

निर्देशित किया गया सम्बन्धित संस्था सड़क को सही तरीके से मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, खण्ड विकास अधिकारीगण से अपेक्षा की गयी पाइप कनेक्शन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की सूची बनाकर प्रस्तुत करें, जिसे सम्बन्धित संस्था को मरम्मत हेतु अवगत कराया जा सके।

भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड खजनी के ग्राम पंचायत देवधर तुला, झुड़िया, बहुरीपार बुजुर्ग, कासिमपुर जिगनी, बदरा-२ में ओ०एच०टी० कार्य, पाइप लाइन का कार्य, हाउस कनेक्शन का कार्य एवं सड़क मरम्मत का कार्य अपूर्ण पाया गया है।

संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत बदरा-२ में ०५ कि०मी० पाईप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति पर है शेष ग्राम पंचायत देवधर तुला, झुड़िया, बहुरीपार बुजुर्ग, कासिमपुर जिगनी, में हाउस कनेक्शन का कार्य एवं ओ०एच०टी० का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता, संस्था के प्रतिनिधि, खण्ड विकास अधिकारी, एवं नोडल अधिकारी एक साथ ग्राम पंचायत का भ्रमण कर परियोजना निर्माण में पायी गयी कमियों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिसूची अभियन्ता जल निगम/एन०सी०सी०/ऋत्तिक कोया)

खण्ड विकास अधिकारी बांसगांव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत जिगिना भियांव, अम्बरपुर, फुलहर खुर्द, डाडीरावत, करहल, देवडार खुर्द अम्बरपुर ओ०एच०टी०, स्टाफ क्वार्टर, हाउस कनेक्शन का कार्य अपूर्ण है। सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत जिगिना भियांव में सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत जिगिना भियांव में तिथि निर्धारित कर सम्बन्धित अवर अभियन्ता, सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि, खण्ड विकास अधिकारी एवं नोडल

अधिकारी ग्राम पंचायत का भ्रमण कर पायी गयी कमियों का निराकारण करते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्य पूर्ण का फोटोग्राफ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विगत कई बैठको में सड़क मरम्मत कराने के लिये निर्देशित किया जा रहा है परन्तु सम्बन्धित संस्था सड़क मरम्मत का कार्य नहीं करायी जा रही है जो आपत्तिजनक है। 15 दिवस के अन्दर समस्त क्षतिग्रस्त किये गये सड़को का मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया। अवगत कराया गया कि यदि निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

खण्ड विकास अधिकारी कौड़ीराम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत चिउटहा बसावनपुर, तिघरा खुर्द, चन्दौली बुजुर्ग, डवरपार, भरवल, हरदिया, करिहार, रुदाईन उर्फ मझगाँवा, देवकली बुजुर्ग, मलौली, सोहगौरा में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण एवं सड़क मरम्मत का कार्य अपूर्ण है इस कारण से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित संस्था अपूर्ण कार्यों को 15 दिवस के अन्दर कार्य पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये। आगामी बैठक में उक्त ग्राम पंचायतों का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में जल निगम के अवर अभियन्ताओ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक अवर अभियन्ता को 04-04 विकास खण्ड आवंटित कर दिया गया है। इस कारण से पानी टंकियों के निरीक्षण का कार्य करने में काफी कठिनाई होती है।

उपस्थित सहायक अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि एस0डब्लू0एस0एम0 के अवर अभियन्ता एवं जल निगम के अवर अभियन्ता को एक-एक विकास खण्ड आवंटित करें, किसी कारण वश 02 विकास खण्ड आवंटित किया जाना हो तो एक दूसरे से सटे विकास खण्ड आवंटित करते हुये विवरण उपलब्ध कराये।

बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी टी0पी0आई0ए0 के प्रतिनिधियों द्वारा उनका कार्य का विवरण तथा आवंटित कार्यक्षेत्र का विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

[Signature] 20/2/25
मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

पत्रांक 3120 / तददिनांकित।

20-2-2025



प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर।
- 3- समस्त नामित नोडल अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, दशम खण्ड, जल निगम, ग्रामीण गोरखपुर।
- 6- मेसर्स एन0सी0सी0लि0 / मेसर्स ऋत्विक् कोया, जनपद गोरखपुर।
- 7- मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0 लि0 जनपद गोरखपुर।
- 8- जिला कोआर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0 जनपद गोरखपुर।

[Signature] 20/02/2025
मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत समीक्षा बैठक में
उपस्थिति

दिनांक 15.02.2025 समय 3.30 बजे

क्र०सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	r			
2				
3				
4	AKhil Anand.	Ex EN UPJN (Rural)	9453590179	
5	Fatish Singh	B.O.O. Belghat	9454464897	
6	Garima Singh	B.D.O. Brahmapur	7275554604	
7	Ramesh Shukla	B.D.O. Khajaur	7275554607	
8	Riwakar Singh	BDO Gola	8707057962	
9	MANOJ SINGH	BDO Bhathat	9335733297	
10	Pankaj Singh	D.C. DPMU JIM	941527909	
11	Rajeev Kumar Tripathi	ADD (ISB)	7007130901	
12	Pankaj Lal Kannauiya	JE (UPJN)	9628846930	
13	Anurag Kumar	JE (UPJN)	9415606780	
14	Mishlesh Kumar	JE (UPJN)	8299702808	
15	Nitesh Kumar.	J.E. (SWSM)	911844155	
16	Avadhesh Pr. Singh	J.E. (SWSM)	9399385392	
17	Deepak Kumar	J.E. (UPJN)	9473942861	
18	Ashraf Ali Ansari	ADD (ISB)	9454462443	
19	Prasoon Mishra	ADD ISB	7007146072	



मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत समीक्षा बैठक में
उपस्थिति

दिनांक 15.02.2025 समय 3.30 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
20	श्याम लाल	BDO	9454464889	
21	वित्तास त्रिपाठी	जिला प्रति-पति नगरपालिका	9369930881	
22	Navneet Upadhyay	TP1	9236080878	
23	Dilip Kumar Ray	TP1 (CTL)	9862258859	
24	Shailish Singh	TP1 (Safety Env)	9198888859	
25	Arun Kumar	BDO Bharnahia	8887534435	
26	सुरेश चन्द्र धीवास्तव	BDO, Jungle Kauria	9335929689	
27	Latya Prakash Singh	BDO Bhargawan	7275554602	
28	Azaz Ahmad	BDO Gaganah	9454464895	
29	R.D. Verma	PPO	9839206867	15.02.25
30	D. P. Singh	S.A.O	9919001060	
31	Brijesh Yadav	B.D.O - Pali	9654464882	
32	NEERAJ KUMAR	AR COOPERATION	9305452203	
33	Suman Gauran	CDPO (PDS)	8545962022	
34	Ajeet Pratap Singh	H.O.	9590127117	
35	Sarrah Kumar	MASS ISA Chairman	8574876447	
36	Umesh chandrag Srivastava	ISA SGUS	9838252807	
37	श्यामलाल पांडेय	ISA-SVSS श्रीम लीडर	8317037805	
38	Deepak Kumar	ISA डेटा कोऑर्डिनेटर एम.एस.	8176870684	

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत समीक्षा बैठक में
उपस्थिति

दिनांक 15.02.2025 समय 3.30 बजे

क्र.सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
39	Jai Shankar Kushwaha	J.C. ³ अतिरिक्त कृषि	9455043310	
40	Niraj Gupta	A.D.O. (P)	7880450744	
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
