



खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

पावर हाउस रोड, मैनपुरी

Email ID- tcdupjnmainpuri@gmail.com

पत्र सं०- २५९६/

प्रतिवेदन-७

126



दि० 11-6-2025

निरीक्षण आख्या

योजना का नाम:- बुरा चक सहारा ग्राम पेयजल योजना (वि०ख०-सुल्तानगंज)
कार्यक्रम का नाम:- जल जीवन मिशन
निरीक्षणकर्ता:- मा० श्री रामनरेश अग्निहोत्री, मा० विधायक-भोगाँव विधानसभा।
निरीक्षण दिनांक:- 06.06.2025

बुरा चक सहारा ग्राम पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 06.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री तेजसिंह, जल निगम(ग्रामीण) के सहायक अभियंता श्री नगेन्द्र कुमार, जू०इंजी श्री जगशीन, जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० श्री योगेश कुमार, डी०पी०एम० टी०पी०आई० श्री अनिल शाह एवं एन०सी०सी० लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर-श्रीनिवासउलू सिरजीरेड्डी, उपस्थिति रहे। जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नलिखित है-

1. अवर जलाशय, बाउण्ड्रीवॉल, रीचार्ज पिट, एवं जल कल प्रांगण के कार्यपूर्ण किये जा चुके हैं।
2. पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
3. कुल प्रस्तावित पाइप लाइन 5.63 किमी० के सापेक्ष 5.63 किमी० पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है एवं प्रस्तावित 214 नग गृह पेयजल संयोजन के सापेक्ष 214 नग गृह पेयजल संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं।
4. पाइप लाइन डालने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। जल निगम(ग्रामीण) के सहायक अभियंता श्री नगेन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना से गत 3 माह से क्लोरीन युक्त नियमित जलआपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत बुरा चक सहारा के समस्त मजरो में की जा रही है, उपस्थित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों द्वारा उक्त समस्त कार्यों को मा० विधायक जी के समक्ष पुष्टि की गई व सहमति प्रदान की गई।

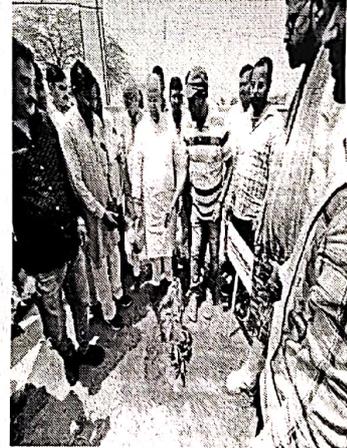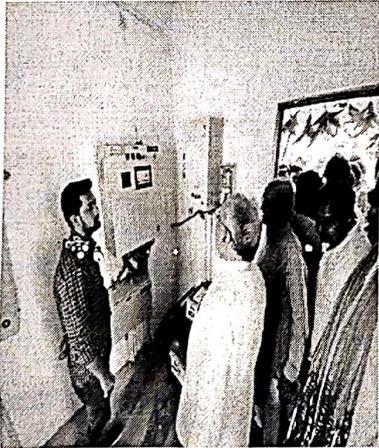



(नगेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
मैनपुरी।



(अंकित यादव)
अधिशासी अभियंता
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
मैनपुरी।
