



कार्यालय अधिशासक

3 Mob. :- 9473942636

न्ता,

खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

पत्रांक:- 2242 / जल जीवन निगम / 284 दिनांक 04-12-2025

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),  
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),  
लखनऊ।

ई-मेल  
दि० ५-१२-२०२५


विषय :- जन प्रतिनिधियों द्वारा जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इ० सचिन यादव, मा० विधायक जसराना, जनपद फिरोजाबाद से जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-4) सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा हेतु समय प्राप्त कर दिनांक 03.12.2025 को मै० एन०सी०सी० लिमिटेड, मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड एवं मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बैठक मा० विधायक जसराना के आवास पर आयोजित करायी गयी। उक्त बैठक में निम्नवत् अधिकारी/फर्म प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
2. श्री विजय लोखण्डे, डी०जी०एम०, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड, फिरोजाबाद।
3. श्री रेड्डी, फर्म प्रतिनिधि, मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
4. श्री अखिलेश सिंह, पी०एम०, मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, फिरोजाबाद।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 अन्तर्गत जनपद आगरा एवं फिरोजाबाद को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद एटा, ग्राम - भडेरा में निर्माणाधीन इनटेक लगभग 85 प्रतिशत, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट (456 MLD) कार्य 50 प्रतिशत, 2 नग एम०आई०बी०पी०एस० के कार्य लगभग 70 प्रतिशत एवं 157 कि०मी० क्लीयर वाटर राइजिंग मेन के सापेक्ष 102 कि०मी० क्लीयर वाटर राइजिंग मेन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, इस प्रकार पैकेज-1 की कुल प्रगति 59 प्रतिशत है। मा० विधायक जी द्वारा कम प्रगति पर प्रश्न किये जाने पर

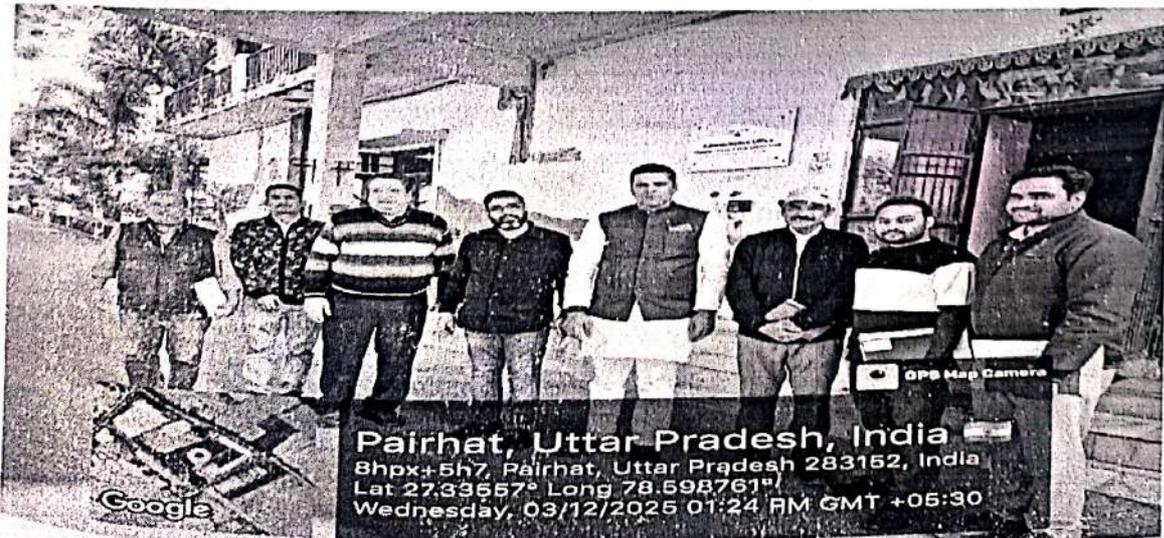

फर्म प्रतिनिधि श्री विजय लोखण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 10 माह से फर्म को भुगतान प्राप्त न होने के कारण कार्यों की प्रगति बाधित है तथा वर्तमान में रू० 170.30 करोड़ की देयता लम्बित है।

अधिसासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-2 अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 8 नग आई०बी०पी०एस० के कार्य लगभग 65 प्रतिशत, 249 के सापेक्ष 235 नग अवर जलाशय के कार्य लगभग 35 प्रतिशत एवं 5425 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 3310 कि०मी० वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पैकेज-2 की कुल प्रगति 58 प्रतिशत है। मा० विधायक जी द्वारा कम प्रगति होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही उनके द्वारा रोड़ पुर्नस्थापना के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।



अधिसासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निर्मित 86 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 106 नग राजस्व ग्रामों में 10 वर्ष के अनुरक्षण एवं संचालन के कार्य मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा कराये जा रहे। इस हेतु समस्त 86 नग पेयजल योजनाओं अनुमानित लागत रू० 51.67 करोड़ की डी०पी०आर० मुख्यालय प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में मै० दारा इंजीनियर द्वारा आंशिक संचालित 57 नग पाइप पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं संचालन का कार्य कराया जा रहा है। डी०पी०आर० की स्वीकृति उपरान्त फर्म द्वारा समस्त 86 नग पेयजल योजनाओं को पूर्ण रूप से संचालित करते हुये उक्त योजनाओं को 10 वर्ष तक संचालित कराया जायेगा। मा० विधायक जी द्वारा विधानसभा जसराना क्षेत्र में मै० दारा इंजीनियरिंग द्वारा अनुरक्षण की जा रही पेयजल योजनाओं की सूची चाही गयी, जो मा० विधायक जी को उपलब्ध करा दी गयी है। मा० विधायक जी द्वारा विधानसभा जसराना क्षेत्र में किसी भी एक योजना पर कार्य पूर्ण कर निरीक्षण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त पर मा० विधायक जी को आश्वासन दिया गया कि डी०पी०आर० स्वीकृति उपरान्त कार्य पूर्ण कराते हुये निर्देशों का अनुपालन पूर्ण किया जायेगा।

अधिकाशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विधानसभा क्षेत्र जसराना में कुल 159 नग टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित है। मा० विधायक जी द्वारा सर्वे कर बन्द पडी टी०टी०एस०पी० को चालू कराये जाने हेतु डी०पी०आर० शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

भवदीय



(देवेन्द्र कुमार सिंह)

O/c अधिकाशासी अभियन्ता

पृ०सं० 2242 / जल जीवन मिशन 284 दिनांक 04-12-2025  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- इं० सचिन यादव, मा० विधायक जसराना, जनपद फिरोजाबाद।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता(आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
- 5- अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
- 6- परियोजना प्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड, फिरोजाबाद।
- 7- परियोजना प्रबन्धक, मै० लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
- 8- परियोजना प्रबन्धक, मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फिरोजाबाद।



O/c अधिकाशासी अभियन्ता
