



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 905 / W-19 / 262 दिनांक 24.04.2026


सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 23.04.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन से खुदी सड़क, धूल से लोग परेशान: मेजा रोड बाजार में आवागमन मुश्किल व्यापारी-राहगीर प्रभावित" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 23.04.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन से खुदी सड़क, धूल से लोग परेशान: मेजा रोड बाजार में आवागमन मुश्किल व्यापारी-राहगीर प्रभावित" जिसमें मेजा रोड बाजार में पटेल नगर चौराहे से सिरसा और मेजा रोड रेलवे स्टेशन तक सड़क क्षतिग्रस्त होने की खबर प्रकाशित की गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग पर जल जीवन मिशन फेज-4 अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से अनुबंधित फर्म मेसर्स गजा-जीएआईपीएल (JV), हैदराबाद द्वारा पाइप लाइन (राइजिंग मेन) बिछाने कार्य कराया गया है। पाइप लाइन बिछाने उपरान्त उक्त मार्ग का मोटोरेबल (अस्थायी पुर्नस्थापन) का कार्य करा दिया गया है। योजना की पाइप लाइन टेस्टिंग सम्बन्धित कार्य कराये जाने उपरान्त ही स्थायी सड़क पुर्नस्थापन का कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

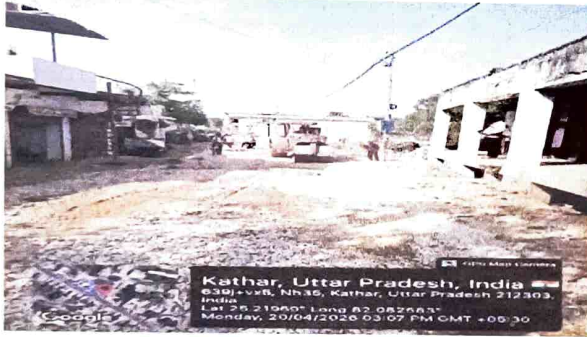

उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन फेज-4 कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील मेजा एवं कोरांव के 03 विकास खण्डों (मेजा, माण्डा एवं कोरांव) के 456 राजस्व ग्रामों में प्रयागराज सतही स्रोत (गंगा) ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा अनुबंधित फर्म मेसर्स गजा-जीएआईपीएल (JV), हैदराबाद द्वारा कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत 456 राजस्व ग्रामों को 115 जोन में विभाजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत एक नग Intake well (112 MLD)-62%, एक नग WTP (90 MLD)-75%, तथा वितरण प्रणाली 4344.00 किमी० के सापेक्ष 4029.00 किमी० एवं 115 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 29 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं अवशेष कार्य प्रगति पर है। अवशेष कार्यों को दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(Signature)

(एस0एस0 परमार)
अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।
- 6- मेसर्स गजा-जीएआईपीएल (JV), हैदराबाद / प्रयागराज।

अधिकासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।

पत्रांक 905 / W-19 / 262 दिनांक 24.04.2026



सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 23.04.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन से खुदी सड़क, धूल से लोग परेशान: मेजा रोड बाजार में आवागमन मुश्किल व्यापारी-राहगीर प्रभावित" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 23.04.2026 को प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन से खुदी सड़क, धूल से लोग परेशान: मेजा रोड बाजार में आवागमन मुश्किल व्यापारी-राहगीर प्रभावित" जिसमें मेजा रोड बाजार में पटेल नगर चौराहे से सिरसा और मेजा रोड रेलवे स्टेशन तक सड़क क्षतिग्रस्त होने की खबर प्रकाशित की गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग पर जल जीवन मिशन फेज-4 अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से अनुबंधित फर्म मेसर्स गजा-जीएआईपीएल (JV), हैदराबाद द्वारा पाइप लाइन (राइजिंग मेन) बिछाने कार्य कराया गया है। पाइप लाइन बिछाने उपरान्त उक्त मार्ग का मोटेरेबल (अस्थायी पुर्नस्थापन) का कार्य करा दिया गया है। योजना की पाइप लाइन टेस्टिंग सम्बन्धित कार्य कराये जाने उपरान्त ही स्थायी सड़क पुर्नस्थापन का कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

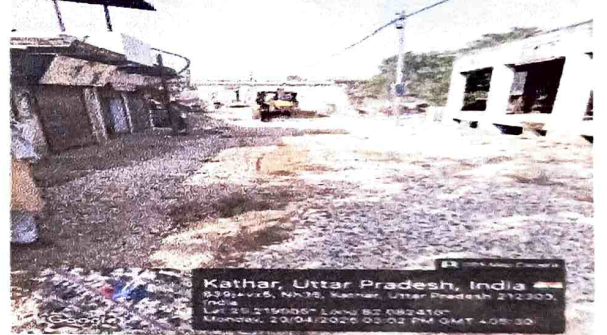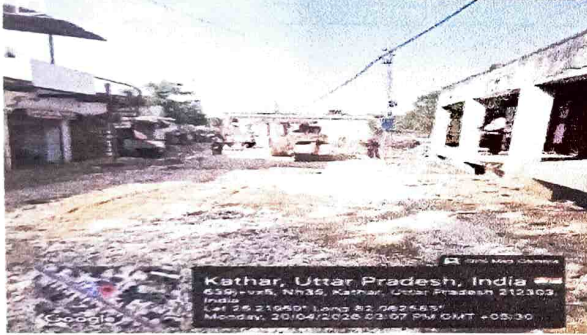

उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन फेज-4 कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील मेजा एवं कोरांव के 03 विकास खण्डों (मेजा, माण्डा एवं कोरांव) के 456 राजस्व ग्रामों में प्रयागराज सतही स्रोत (गंगा) ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा अनुबंधित फर्म मेसर्स गजा-जीएआईपीएल (JV), हैदराबाद द्वारा कार्य कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत 456 राजस्व ग्रामों को 115 जोन में विभाजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत एक नग Intake well (112 MLD)-62%, एक नग WTP (90 MLD)-75%, तथा वितरण प्रणाली 4344.00 किमी० के सापेक्ष 4029.00 किमी० एवं 115 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 29 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं अवशेष कार्य प्रगति पर है। अवशेष कार्यों को दिसम्बर-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(एस0एस0 परमार)
अधिशाली अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- अधीक्षक अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 4- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।
- 6- मेसर्स गजा-जीएआईपीएल (JV), हैदराबाद / प्रयागराज।

अधिशाली अभियन्ता



जल जीवन मिशन से खुदी सड़क, धूल से लोग परेशान: मेजा रोड बाजार में आवागमन मुश्किल, व्यापारी-राहगीर प्रभावित

राजेश कुमार | उरुवा(प्रयागराज), प्रयागराज (इलाहाबाद) |

23/04/26



📺 शेयर

जल जीवन मिशन से खुदी सड़क।

प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र के विकासखंड उरूवा अंतर्गत मेजा रोड बाजार में पटेल नगर चौराहे से सिरसा और मेजा रोड रेलवे स्टेशन तक जाने वाला मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण उड़ रही धूल से स्थानीय व्यापारी और राहगीर खासे परेशान हैं। गुरुवार सुबह एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिरते गिरते बचा।



UPJNR PRAYAGRAJ

(@upjnrprayagraj) on X

🚰 उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की ओर से प्रयागराज जनपद में जल जीवन मिशन की प्रगति पर आधिकारिक सूचना। 👉 जनपद प्रयागराज के कुल 2689 ग्रामों में से 50 ग्राम नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत है, 01 ग्राम 100 से कम जनसंख्या वाली है एवं 569 ग्राम पू...

🔗 x.com

