



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

विनोवापुरी (लोलेपुर) निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E- mail:- upjarsultanpur@upjn.co.in

पत्रांक 4724 / W-19 / 105 दिनांक:- 03/08/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "सुलतानपुर के बालमपुर में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी, ग्रामीण को शुद्ध पेयजल के लिए करना पड़ रहा इंतजार" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-भदैया के अन्तर्गत बालमपुर पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा करवाया जा रहा है। योजना में नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग उच्च जलाशय (275 कि०मी०/18 मी०)-01 नग, सोलर-01 नग, पाइप लाइन-19.30 किमी० तथा गृह जल संयोजन-982 नग प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग (90%) तक पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग (90%) तक पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग स्लैब लेवल (60%) तक पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण, पाइप लाइन-18.80 किमी० तथा गृह जल संयोजन-392 नग पूर्ण है।

योजनाओं को धीमी प्रगति होने के कारण फर्म के विरुद्ध अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/JJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यदायी फर्म द्वारा अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-27/76 दिनांक 03.08.2026(संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है वर्तमान में योजना प्रगति पर है जिसे दिनांक 10 दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

संलग्नक:-कार्यस्थल का फोटोग्राफ।

भवदीय

(वकार हुसैन)

अधिशासी अभियन्ता


पृ०सं० एवं दिनांक :-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-सुलतानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
6. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
7. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री धर्मनाथ यादव, जूनियर इंजीनियर।
8. डी०पी०एम०-मेसर्स फिचनर, टी०पी०आई०, सुलतानपुर।
9. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता

विकासखण्ड-भदैया के अन्तर्गत बालमपुर पाइप पेयजल योजना के कार्यस्थल का फोटोग्राफ

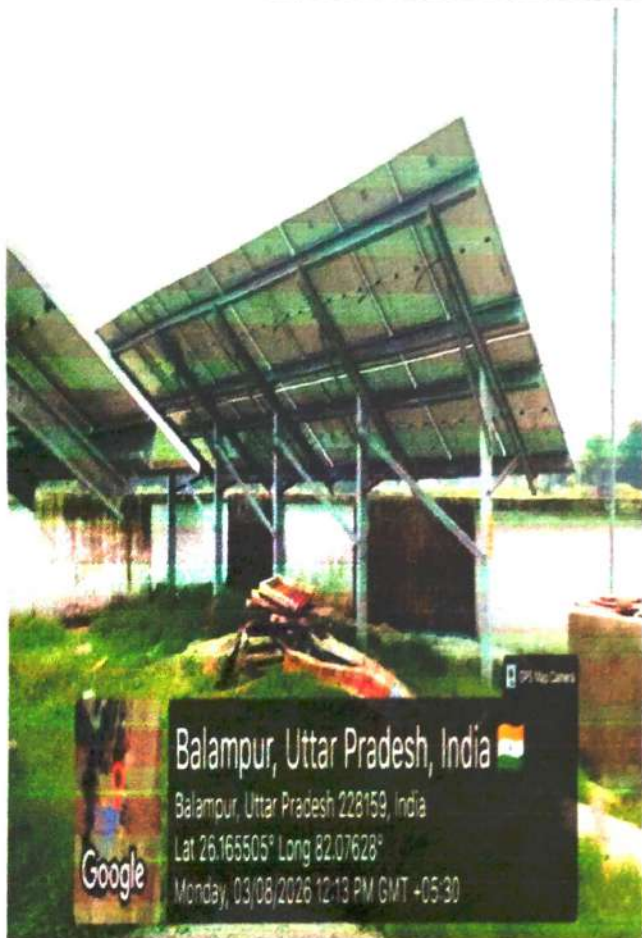

Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: epc.upjal@vtlrewa.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027 /76

Date: 03.08.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P Jal Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject:- Submission of Completion Plan of Balampur (Bhadaiya)

Dear Sir,

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	
5	Distribution(Kms)	19.3	18.8		
6	FHTC(Nos)	982	392	590	20 Nov. 26
7	Solar(Kw)	1	1	0	
8	Regular Water Supply	982	0	982	10 Dec 26
8	OHT(275 KL 18M Staging)-Job	1	0.6	0.4	18 Oct. 26

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,

For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV

(Authorized signatory)



Regional office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment I-A, ShahnaJaf Road, Lucknow U.P-226001

Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Chhatauna / Balampur
Sultanpur: Jal Jeevan Mission Water Tank Construction Delayed

सुलतानपुर के बालमपुर में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी: ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए करना पड़ रहा इंतजार

टॉप न्यूज़

राज्य-शहर

भास्कर
इन्वेस्टिगेशन

क्रिकेट

आज का समाचार

संजय कुमार | छतौना(लम्भुआ),
सुलतानपुर
1 दिन पहले

f X

🏠 होम

▶ वीडियो

🔍 सर्च

📺 वॉच

वेब
स्टोरीज

📰 पेपर

👤

आराजनल

🏆 स्पोर्ट्स

🎬 जंतर-मंतर
Reels

🎬 बॉलीवुड

🎓 जॉब -
एजुकेशन

💰 बिजनेस

👤 लाइफस्टाइल

📖 जीवन मंत्र

🌀 वुमन

🏠 देश

🌐 विदेश

☀️ राशिफल

📱 टेक - ऑटो



जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी।

दैनिक भास्कर को
Google पर पसंदीदा
सोर्स बनाएं →

📧 +Follow us

सोडियम

सुल्तानपुर के भदैया विकासखंड स्थित बालमपुर ग्राम सभा में जल
जीवन मिशन के तहत बन रही पेयजल टंकी का निर्माण कार्य अब तक



होम



वीडियो



सर्च



वॉच

वेब
स्टोरीजई-
पेपर

ओपिनियन



मधुरिमा



मैगजीन



यूटिलिटी



लाइफ - साइस



मध्य प्रदेश



उत्तरप्रदेश



राजस्थान



बिहार



यूपी खास

Download App from



निर्माण स्थल पर बाउंड्री वॉल का काम अधूरा है। साथ ही, जल निकासी के लिए की गई बोरिंग भी सफल नहीं हो पाई है। इन तकनीकी खामियों के कारण टंकी से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।



ग्रामीणों में अभय राज सरोज, अविनाश गिरी, राम राज यादव और सुनील कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि टंकी का निर्माण लंबे समय से चल रहा है, लेकिन काम पूरा न होने से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराकर नियमित जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है।

इस संबंध में जल जीवन मिशन प्रभारी हम्माद बारी ने जानकारी दी कि लगातार बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। इसके अलावा,

वीडियो

आज का राशिफल

मेघ



होम



वीडियो



सर्च



वॉच

वेब
स्टोरीजई-
पेपर

Follow us on

उन्होंने आश्वासन दिया कि आवश्यक तकनीकी सुधार कर बोरिंग का कार्य जल्द ही पूरा कराया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य पूर्ण कर गांव में पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं →



यात्रा-समय-पुष्पा-सुष्मा
कोई पेमेंट फंसी हुई है, तो उसे वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं। भावनाओं के बजाय समझदारी से काम करने पर बेहतर फैसले ले पाएंगे। नेगेटिव-पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान र...

और पढ़ें

खबरें और भी हैं...

जमीन विवाद में किसान की हत्या या साजिश?: सुल्तानपुर रास्ते पर मिला शव, 5 पर केस; परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया



सुल्तानपुर >

मुख्तार अंसारी के भतीजे के गनर का हत्यारोपी तलब: श्रमजीवी एक्सप्रेस में की थी हत्या, सरकारी कार्बाइन लूटने का आरोप



Advertise with Us | DB Reporter | Sitemap |
Terms & Conditions and Grievance Redressal
Policy

Contact Us | RSS | Cookie Policy |
Privacy Policy

Our Divisions

DainikBhaskar.com
