



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
विनोवापुरी (लोलेपुर) निकट वर्मा उपवन, सुलतानपुर।

E-mail:- upjnsultantpur@upjn.co.in

पत्रांक 4875 /
सेवा में

W-19 /

108

दिनांक:- 10/08/2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "जल जीवन मिशन: लोलेपुर में तीन साल बाद भी काम: 3.28 करोड़ की योजना से 595 परिवारों को नहीं मिला शुद्ध पेयजल" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-कूरेभार के अन्तर्गत लोलेपुर पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त योजना में नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग उच्च जलाशय (175 कि०ली०/16 मी०)-01 नग, सोलर-01 नग, पाइप लाइन-15.94 किमी० तथा गृह जल संयोजन-595 नग प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 नग पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग जिक एलम टैंक अधिष्ठापित (80%) तक पूर्ण, सोलर-01 नग पूर्ण, पाइप लाइन-15.20 किमी० पूर्ण, तथा गृह जल संयोजन-257 नग पूर्ण है।

योजनाओं को धीमी प्रगति होने के कारण फर्म के विरुद्ध अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 725/JJM (Sultanpur)/2026-27/Tech-05 दिनांक 27 मई, 2026 द्वारा 1% अतिरिक्त कुल 2% L.D. अध्यारोपित भी किया गया है।

कार्यदायी फर्म द्वारा अपने पत्रांक VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-27/73 दिनांक 10.08.2026(संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है वर्तमान में योजना प्रगति पर है जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को निक्षेपित करवाने की कृपा करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वकार हुसैन)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-सुलतानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (कि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
6. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
7. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री पी०के० छाबड़ा, जूनियर इंजीनियर।
8. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशासी अभियन्ता



Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6th Floor, Tower 'A', Plot No.-3, 44S, Sector 125, Noida-201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: e o a vtlresva.com

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027/73

Date: 10.08.2026

To,
Executive Engineer (Civil)
U.P. Jai Nigam (Rural)
Sultanpur, Uttar Pradesh

Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).

Subject :- Submission of Completion Plan of Lokepur (Block Kurebhar).

Dear Sir,

With Reference to above subject, We are hereby submitting to you updated progress and Completion plan of Lokepur (Block Kurebhar). Total Estimate Cost Rs 328.1 Lakhs.

S.NO	COMPONENTS	SCOPE	COMPLETED	BALANCE	TARGET DAY OF COMPLETION
1	Tubewell (Nos)	1	1	0	
2	OP & Compressor(Nos)	1	1	0	
3	Pump House(Nos)	1	1	0	
4	BW(Nos)	1	1	0	01-Sep-26
5	Distribution(Kms)	15940	15200	740	01-Sep-26
6	FHTC(Nos)	595	257		20-Sep-26
7	Solar(Kw)	1		1	30-Sep-26
8	Regular Water Supply	595	0	595	25-Aug-26
9	OHT(175 KL 16M Staging)-Job	1	0.8	0.2	10-April-26
					10-Sep-26

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,

For Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV
(Authorized signatory)

Regional office Address: top No 201CA 201 D, Pitifloor, COvinda Ag6Pt-ent 1-A, ShahnaJaf Road, Luckaow U.P-22600t




- 📺 टॉप न्यूज
- 📺 राज्य-बाहर
- 📺 भारत
- 📺 इन्टरनेशनल
- 📺 क्रिकेट
- 📺 भारत कला
- 📺 DB ऑरिजिनल
- 📺 स्पोर्ट्स
- 📺 बॉलीवुड
- 📺 जीव - एजुकेशन
- 📺 बिजनेस
- 📺 लाइफस्टाइल
- 📺 जीवन मंत्र
- 📺 दुनिया
- 📺 देश
- 📺 विदेश
- 📺 राशिफल
- 📺 टेक - ऑटो
- 📺 पैका न्यूज एक्सप्लोर्ज़
- 📺 ओपिनियन
- 📺 म्युरिका
- 📺 फैशनी
- 📺 मूविस्ट्री

Headlines / Local / Uttar Pradesh / Saharpur / Kurabhar Saharpur / Jal Jeevan Mission Failure in Kurabhar / Lokapur Water Project Delay

जल जीवन मिशन: लोकपुर में तीन साल बाद भी काम: 3.28 करोड़ की योजना से 595 परिवारों को नहीं मिला शुद्ध पेयजल
 वहींतु है। इलेक्ट्रिकलनपुर,
 1 दिन पहले

लोक भास्कर को Google पर सर्चिंग सेई बनने

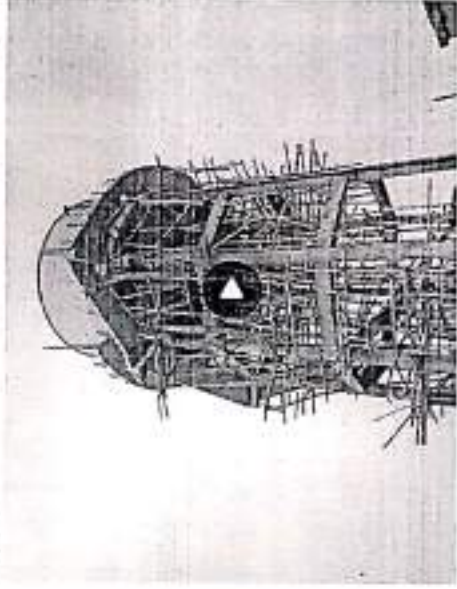

वीडियो

अप डा

सुलतानपुर में कुरेभार ब्लॉक के लोकपुर गांव में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से शुरू की गई पेयजल परियोजना तीन साल बाद भी अधूरी है। इस योजना का लक्ष्य गांव के 595 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन अब तक न तो पानी की टंकी पूरी बन पाई है और न ही पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई जा सकी है।

ग्रामीणों का कहना है कि योजना का लाभ अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। जल जीवन मिशन की पाइपलाइन गांव के आगे हिस्से तक ही पहुंची है, जबकि कई मोहल्लों और बस्तियों में टोटियां तो लग दी गई हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। अधूरे निर्माण और कार्य की भीमी गति से ग्रामीणों में गहरा रही है।

पूर्व प्रधान मंत्री ने कार्यवाही सेवक पर तत्परता की आलोचना लगाए है। उन्होंने बताया कि कई बार ध्यान दिलाने के बावजूद कार्य की प्रगति में सुधार नहीं

आज का लक्ष्य

मे

उत्तरप्रदेश

राजस्थान

बिहार

सूरी खास

Download App from



Follow us on

ग्रामीण राम उज्जगर ने बताया कि क्या शुरू हुए तीन साल बीत गए हैं, लेकिन पानी की टंकी अभी तक पूरी तरह से खड़ी नहीं हो सकी है। टंकी अपूर्ण होने के कारण पाइपलाइन का परीक्षण और जल आपूर्ति शुरू नहीं हो पा रही है। यहाँ, सीटिंग उपाध्याय का कहना है कि अधिकारियों और कार्यदायी संस्था की उदासीनता के कारण यह योजना केवल सगल्लों तक ही सीमित रह गई है।

ग्राम प्रधान रामेश्वराम वर्मा ने बताया कि कार्य की सुलभ रकार को लेकर विभागीय अधिकारियों से ज़िजित और मौखिक रूप से शिकायत की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्य की गति बढ़ाने के लिए उपाधिकारियों को अलग करवा गया है। ग्रामीणों की उम्मीदें अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। लोग चाहते हैं कि जल जीवन मिशन का लाभ जल्द से जल्द हर घर तक पहुंचे और अधूरा कार्य पूरा हो, ताकि पेशजल संकट से निजात मिल सके।

शेनिक बास्कर से Google पर पसंदीदा पोस्ट बनाएं



खबरें और भी हैं...

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी: FCI में सीपी भर्ती का झंसा देकर प्रति अभ्यर्थी 3 लाख सिप, सुल्तानपुर में केस दर्ज

सुल्तानपुर >



सुल्तानपुर में झटका मशीन बन रही जानलेवा: लभुआ में 18 दिन में दूसरी घटना, प्रशासन की उदासीनता पर सवाल

सुल्तानपुर >



सुल्तानपुर में सपा नगर अध्यक्ष पर केस दर्ज: भद्रकांड पोस्ट डालने का आरोप, PM-सोपम की तस्वीरों के इस्तेमाल का दावा

सुल्तानपुर >



जिसने गंदे आरोप लगाए, भाजपा-विधायक ने उसकी सिफारिश की थी: पीएचडी की फीस आधी करने और विधानसभा पास देने को कहा: 2 लेटर सहमने आए

सुल्तानपुर >



बहन के फावदे के लिए जीजा की मला चोटकर हत्या: सुल्तानपुर में ताबाब में लाख फैंकी, जमीन के 48 लाख दिलावा चाहता था

सुल्तानपुर >



Advertise with Us | DB Reporter | Sitemap |
 Terms & Conditions and Privacy Policy |
 Contact Us | RSS | Cookie Policy | Privacy Policy

Our Divisions

DainikBhaskar.com

Divyabhaskar.com

BhaskarEnglish.in

DivyaMarathi.com

Money@baskar.com

BhaskarAd.com

Copyright © 2024-25 DB Corp Ltd. All Rights Reserved

This website follows the DBM Code of Ethics.
