

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
औद्योगिक क्षेत्र संत कबीर नगर। -खलीलाबाद, जनपद,

cdsantkabirnagar@gmail.com -mail I.D:-E, -mail I.D-E eeruralskngmail.com@,

पत्रांक
सेवा में,



619 / 60-05 / 75

दिनांक 14/07/2026


प्रबन्ध निदेशक महोदय,
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय – दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 08.07.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2026 दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर “जल जीवन मिशन का लाभ नहीं मिल रहा संतकबीरनगर के सकूरचक, मटौली में पानी की टंकी अधूरी, मरम्मत की मांग” के संबंध में अवगत कराना है कि वि०ख०- पौली में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत (केश-1) सकूरचक पेयजल योजना के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक का 75 प्रतिशत तक पूर्ण है, पम्प हाऊस एवं बाऊण्डीवाल का कार्य 90 प्रतिशत, वितरण प्रणाली का कार्य 7276 मी० के सापेक्ष 6958 मी० पूर्ण है तथा हाऊस कनेक्शन का कार्य 285 के सापेक्ष 246 नग पूर्ण कर लिया गया है, कराये गये कार्यों का भुगतान काफी समय से लंबित होने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। वर्तमान में पाइपलाइन लेइंग का कार्य प्रगति पर है। जिसे शीघ्र पूर्ण कराते हुये योजना का जनोपयोगी करा दिया जायेगा।

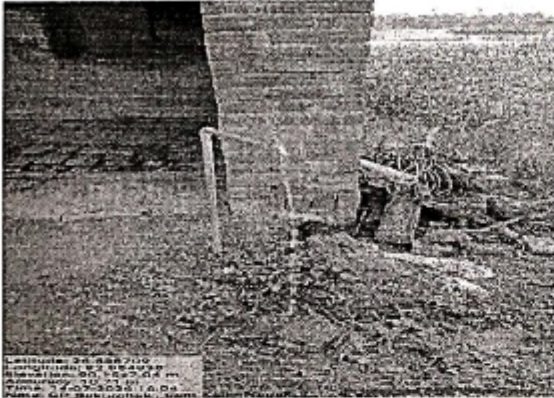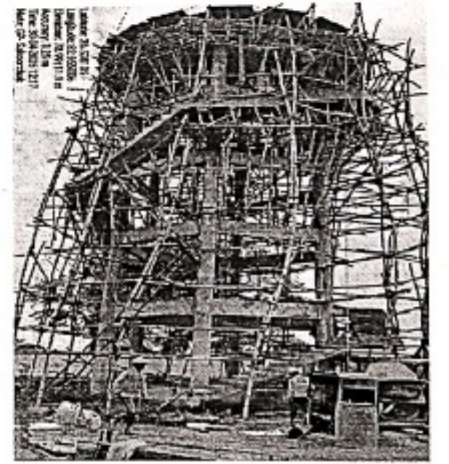

(केश-2) मटौली पेयजल योजना के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक का 80 प्रतिशत तक पूर्ण है, पम्प हाऊस एवं बाऊण्डीवाल का कार्य 80 प्रतिशत, वितरण प्रणाली का कार्य 9965 मी० के सापेक्ष 8149 मी० पूर्ण है तथा हाऊस कनेक्शन का कार्य 239 के सापेक्ष 143 नग पूर्ण कर लिया गया है, ग्राम पंचायत मटौली के अन्तर्गत 02 स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा विवाद होने के कारण पाइप लाइन

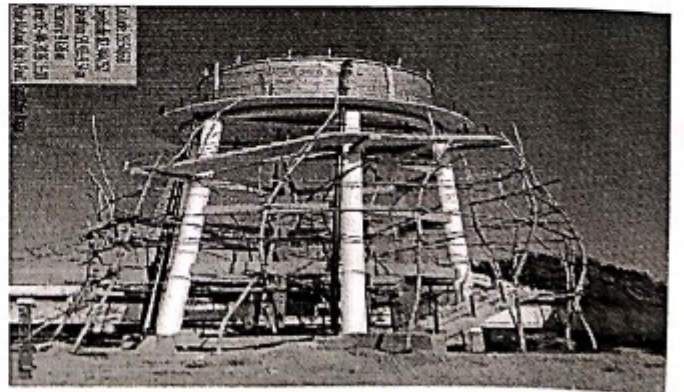

का कार्य बाधित है। विवाद निस्तारण होने के उपरान्त पाइपलाइन लेइंग का शेष कार्य पूर्ण कर योजना को पूर्ण रूप से संचालित करा दिया जायेगा।

भवदीय
ml
(महेन्द्र राम)

अधिशायी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, संतकबीरनगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
5. संबंधित सहायक अभियन्ता / जू०ई०।
6. कार्यदायी फर्म विश्वराज (जे०वी०), संतकबीरनगर।

अधिशायी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)

औद्योगिक क्षेत्र संत कबीर नगर। -खलीलाबाद, जनपद,

edsantkabinagar@gmail.com -mail I.D:-E, -:mail I.D-E eeruralskngmail.com@,

पत्रांक

619

/

10-05

/

75

दिनांक 14/07/2026

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक महोदय,

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),

लखनऊ।

विषय – दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 08.07.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2026 दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर “जल जीवन मिशन का लाभ नहीं मिल रहा संत कबीरनगर के सकूरचक, मटौली में पानी की टंकी अधूरी, मरम्मत की मांग” के संबंध में अवगत कराना है कि वि० ख०- पौली में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत (केश-1) सकूरचक पेयजल योजना के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक का 75 प्रतिशत तक पूर्ण है, पम्प हाऊस एवं बाऊण्डीवाल का कार्य 90 प्रतिशत, वितरण प्रणाली का कार्य 7276 मी० के सापेक्ष 6958 मी० पूर्ण है तथा हाऊस कनेक्शन का कार्य 285 के सापेक्ष 246 नग पूर्ण कर लिया गया है, कराये गये कार्यों का भुगतान काफी समय से लंबित होने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। वर्तमान में पाइपलाइन लेइंग का कार्य प्रगति पर है। जिसे शीघ्र पूर्ण कराते हुये योजना का जनोपयोगी करा दिया जायेगा।



(केश-2) मटौली पेयजल योजना के अन्तर्गत ओवरहेड टैंक का 80 प्रतिशत तक पूर्ण है, पम्प हाऊस एवं बाऊण्डीवाल का कार्य 80 प्रतिशत, वितरण प्रणाली का कार्य 9965 मी० के सापेक्ष 8149 मी० पूर्ण है तथा हाऊस कनेक्शन का कार्य 239 के सापेक्ष 143 नग पूर्ण कर लिया गया है, ग्राम पंचायत मटौली के अन्तर्गत 02 स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा विवाद होने के कारण पाइप लाइन



का कार्य बाधित है। विवाद निस्तारण होने के उपरान्त पाइपलाइन लेइंग का शेष कार्य पूर्ण कर योजना को पूर्ण रूप से संचालित करा दिया जायेगा।

भवदीय

(महेन्द्र राम)

अधिशायी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, संतकबीरनगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।
5. संबंधित सहायक अभियन्ता / जू०इ०।
6. कार्यदायी फर्म विश्वराज (जे०वी०), संतकबीरनगर।

^{ml}
अधिशायी अभियन्ता
