

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)  
विनोवापुरी (लोलेपुर), निकट बर्मा उपवन, जनपद-सुल्तानपुर  
Email ID- exenj\_n\_sultanpur@yahoo.com

पत्रांक : 4138 / व-19 / 98  
सेवा में

दिनांक : 17/07/2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)  
लखनऊ।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल मीडिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित निगेटिव खबर “फूलपुर में जल जीवन मिशन 3 साल बाद भी अधूरा : 2.59 करोड़ की योजना से 470 घरों को नहीं मिला शुद्ध पानी” के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-कूरेभार में फूलपुर पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा कराया जा रहा है। योजना में प्रस्तावित कार्य नलकूप-01 नग, पम्पहाउस-01 नग, बाउन्ड्रीवाल-01 नग, उच्च जलाशय (125 किली०/18 मी०)-01 नग, पाइप लाइन-12.90 किमी०, एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन-470 नग, सोलर-01 नग हैं। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-01 पूर्ण, पम्पहाउस-01 नग पूर्ण, बाउन्ड्रीवाल-01 नग पूर्ण, वितरण प्रणाली-12.10 किमी० पूर्ण, एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन-240 नग पूर्ण, उच्च जलाशय-01 नग जिंक एलम टैंक अधिष्ठापित (80%) पूर्ण है। योजना के अक्शेप पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन एवं उच्च जलाशय का कार्य प्रगति पर है। योजना की कार्य लागत रु० 259.66 लाख के सापेक्ष कार्यदायी फर्म को रु० 138.23 लाख भुगतान किया गया है। कार्यदायी फर्म अपने एकांक भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में देरी कर रहा है।

अवगत कराया गया है कि योजना के समस्त कार्यों को दिनांक 20 नवम्बर, 2026 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा। -

अतः उक्त प्रकरण निक्षेपित करवाने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

सुवदीय  
(विकार हुसैन)  
अधिशाली अभियन्ता


पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (जलक्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) अयोध्या कैंप-सुलतानपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) अयोध्या।
7. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता/श्री पी०के० छाबड़ा, जूनियर इंजीनियर।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा।

अधिशाली अभियन्ता

## विकासखण्ड—कूरेभार में फूलपुर पाइप पेयजल योजना के कार्यस्थल का फोटोग्राफ

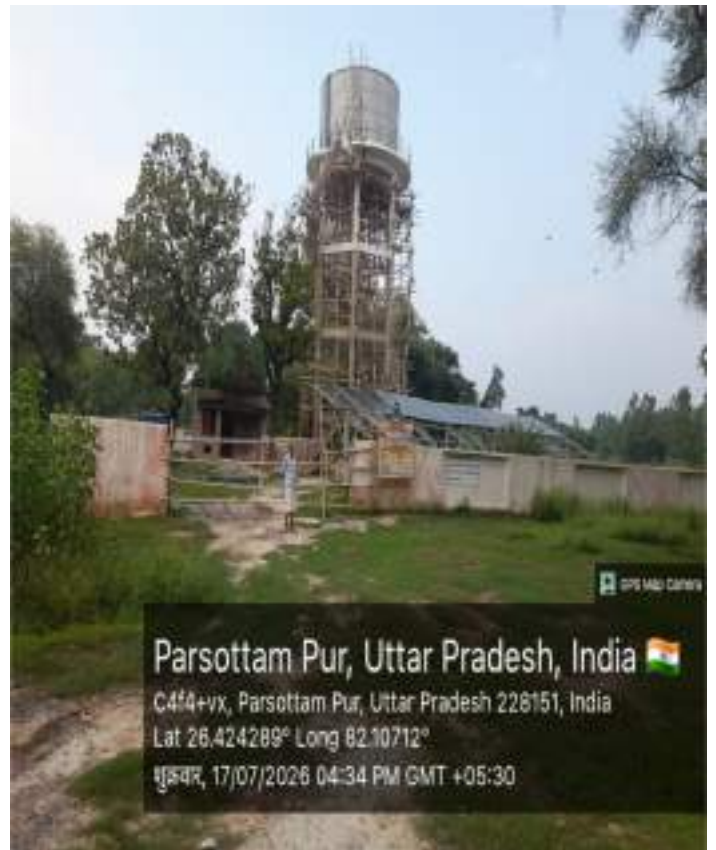

# Vindhya Telelinks Limited - Gaja Engineering Private Limited JV

Club 125, 6<sup>th</sup> Floor, Tower 'A', Plot No.-3,4 & 5, Sector 125, Noida -201301, India

Phone: +91-120-4950200 | Fax: +91-120-4950222 | Email: [epc.upjal@vtlrewa.com](mailto:epc.upjal@vtlrewa.com)

PAN: AAHAV1983F | GSTIN: 09AAHAV1983F1Z4

**Letter No: VTL-GAJA JV/DWSM/SLNP/2026-2027**

**Date: 17.07.2026**

**To,  
Executive Engineer (Civil)  
U.P Jal Nigam (Rural)  
Sultanpur, Uttar Pradesh**

**Reference: Survey, Design, Preparation of DPR, Construction, Commissioning and O&M for 10 Years of Various Rural Water Supply Projects in the State of Uttar Pradesh as per Request for Proposal for Phase-3 Division- Ayodhya(Sultanpur).**

**Subject:- Submission of Completion Plan of Phoolpur(Kurebhar)**

Dear Sir,

Submission of Completion Plan of Phoolpur (Kurebhar) We are hereby submitting to you updated progress and Completion plan of Phoolpur(Kurebhar) Total Estimated Cost Rs. 259.66 lakh and Net Payment Received Rs. 138.23 lakh.

| S.NO | COMPONENTS                   | SCOPE | COMPLETED | BALANCE | TARGET DAY OF COMPLETION                                   |
|------|------------------------------|-------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1    | Tubewell (Nos)               | 1     | 1         | 0       |                                                            |
| 2    | OP & Compressor(Nos)         | 1     | 1         | 0       |                                                            |
| 3    | Pump House(Nos)              | 1     | 1         | 0       |                                                            |
| 4    | BW(Nos)                      | 1     | 1         | 0       |                                                            |
| 5    | Distribution(Kms)            | 12.9  | 12.1      | 0.8     | 2KM PIPELINE AFFECTED DUE RAILWAY OVERBRIDGE CONSTRUCTION. |
| 6    | FHTC(Nos)                    | 470   | 240       | 230     | 25 OCT.26                                                  |
| 7    | Solar(Kw)                    | 1     | 1         |         |                                                            |
| 8    | Regular Water Supply         | 470   | 0         |         | 20 NOV. 26                                                 |
| 8    | OHT( 125 KL 16M Staging)-Job | 1     | 0.8       | 0.2     | 14-AUG.26                                                  |

Thanking you and assuring you of our best services at all the times.

Your Sincerely,

For **Vindhya Telelinks Ltd. - Gaja Engineering Pvt. Ltd. JV**  
(Authorized signatory)



Regional office Address: Shop No 201C & 201 D, First Floor, Govinda Apartment 1-A, Shahnajaf Road, Lucknow U.P-226001

Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Sultanpur / Kurebhar Sultanpur / Phoolpur Jal Jeevan Mission Project Delay | Water Supply Crisis News

## फूलपुर में जल जीवन मिशन 3 साल बाद भी अधूरा: 2.59 करोड़ की योजना से 470 घरों को नहीं मिला शुद्ध पानी

धर्मराज दुबे | कूरेभार, सुलतानपुर  
6 घंटे पहले



दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं →



जल जीवन मिशन 3 साल बाद भी अधूरा।



कूरेभार विकास खंड के फूलपुर गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की प्रगति बेहद धीमी है। लगभग तीन वर्ष पूर्व शुरू हुई इस परियोजना का उद्देश्य गांव के 470 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, लेकिन अब तक ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इस परियोजना की लागत 259.66 लाख रुपये है।

ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदाई संस्था की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है, और कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा नहीं हो सका है। इससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है।

वीडियो

और देखें

टॉप न्यूज़

राज्य-शहर

क्रिकेट

भास्कर खास

DB ओरिजिनल

स्पोर्ट्स

बॉलीवुड

जॉब - एजुकेशन

बिजनेस

लाइफस्टाइल

जीवन मंत्र

वुमन

[🇮🇳 त्वदश](#)
[🏠 राशिकल](#)
[🚗 टेक - ऑटो](#)
[🚗 फेक न्यूज एक्सपोज़](#)
[🗣️ ओपिनियन](#)
[👩‍💻 मधुरिमा](#)
[📖 मैगजीन](#)
[💡 यूटिलिटी](#)
[🗺️ लाइफ - साइंस](#)
[🇮🇳 मध्य प्रदेश](#)
[🇮🇳 उत्तरप्रदेश](#)
[🇮🇳 राजस्थान](#)
[🇮🇳 बिहार](#)
[🇮🇳 यूपी खास](#)
[Download App from](#)

[Follow us on](#)

कहा कि गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को शुद्ध पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कार्य को जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

ओम नारायण पांडेय ने भी कार्य की सुस्ती पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की अच्छी योजना का लाभ ग्रामीणों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। विजय पांडेय ने जोर दिया कि यह परियोजना जनहित से जुड़ी है, अतः विभाग और कार्यदाई संस्था को इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए।

ग्रामीण बिजय पांडेय ने बताया कि यदि योजना के तहत गांव में पानी मिलने लगे तो लोगों को हैंडपंप और अन्य अस्थायी साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे काफी सहूलियत होगी।

इस मामले में ग्राम प्रधान राम चरन ने जानकारी दी कि गांव में कार्य की धीमी प्रगति को लेकर संबंधित विभाग से कई बार शिकायत की गई है और कार्य में तेजी लाने की मांग की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग जल्द ही इस ओर गंभीरता दिखाएगा।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि योजना को शीघ्र पूरा कर गांववासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि जल जीवन मिशन का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंच सके।

दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं →



## खबरें और भी हैं...

**सुल्तानपुर में युवती से घर में घुसकर मारपीट: बचाने पहुंचे शिक्षक पिता का सिर फोड़ा, 11 नामजद पर केस**



सुल्तानपुर >

**सावन और कांवड़ यात्रा के लिए सुल्तानपुर पुलिस अलर्ट: सुल्तानपुर में 400 नए जवान तैनात, मंदिरों-घाटों पर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा**



सुल्तानपुर >

**सुल्तानपुर में निकली पहली जगन्नाथ रथ यात्रा: गाजे-बाजे के साथ नाचते-गाते निकले श्रद्धालु, प्रशासन ने डीजे पर लगाई रोक**



सुल्तानपुर >

**कूड़ेभार में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक: ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा**



कूरेभार(सुल्तानपुर) >



मेष | Aries

पॉजिटिव- कहीं पैसा रुका हुआ है, तो आज उसके वापस मिलने की संभावना है। काम का दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह पूरी कर लेंगे। किसी करीबी रिश्तेदार से चल रहा पुराना विवाद परिवार क...

और पढ़ें

Advertise with Us | DB Reporter | Sitemap |

Terms & Conditions and Grievance Redressal Policy |

Contact Us | RSS | Cookie Policy | Privacy Policy

Our Divisions

DainikBhaskar.com

DivyaBhaskar.com

BhaskarEnglish.in

DivyaMarathi.com

MoneyBhaskar.com

BhaskarAd.com

Copyright © 2024-25 DB Corp Ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.
