



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

गेट न0-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बौदा, पिनकोड-210001

दिनांक :- 20 / 07 / 2026

पत्रांक :- 649 / W-08 / 30

सेवा में,


अपर जिला सूचना अधिकारी,
बौदा।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बौदा/चित्रकूट संस्करण के दिनांक 19.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "कालिंजर में जल जीवन मिशन का बुरा हाल" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बौदा/चित्रकूट संस्करण के दिनांक 19.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "कालिंजर में जल जीवन मिशन का बुरा हाल" के सम्बन्ध में के क्रम में आपके पत्र संख्या-153/उ0नि0सू0/सना0क0/ दिनांक 20.07.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद बौदा में जल जीवन मिशन (फेज-1) में खदान ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड कमासिन, बिसण्डा, महुआ एवं नरैनी में संचालित खदान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 342 राजस्व ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराने हेतु 01 नग इन्टेकवेल क्षमता 158 एम0एल0डी0, 01 नग डब्ल्यू0टी0पी0 क्षमता 158 एम0एल0डी0, 118 नग उर्ध्व जलाशय, 39 नग सी0डब्ल्यू0आर0, 4215 कि0मी0 पाइप लाइन व 127889 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने का कार्य पूर्ण कराते हुए पेयजलापूर्ति संचालित की जा रही है एवं वर्तमान तक 324 नग ग्रामों को हर घर नल प्रमाणीकरण की कार्यवाही भी पूर्ण करायी जा चुकी है, अवशेष कार्यों को अगस्त, 2026 तक पूर्ण कर पेयजलापूर्ति कराया जाना लक्षित है।

1- ग्राम तरहटी कालिंजर :- विकासखण्ड नरैनी में खदान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम बहादुरपुर कालिंजर में निर्मित शिरोपरि जलाशय (450 कि0ली0/25 मीटर) से ग्राम तरहटी कालिंजर में 16783.00 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 1336 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 948 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 5500 मीटर सी0सी0 रोड ट्रेंच के सापेक्ष 5050.00 मीटर सी0सी0 रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम के समस्त अवशेष कार्यों को 15 दिवस में कराते हुए शत-प्रतिशत पेयजलापूर्ति सुचारु किया जाना लक्षित है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, जिसकी फोटोग्राफ निम्नवत् है :-

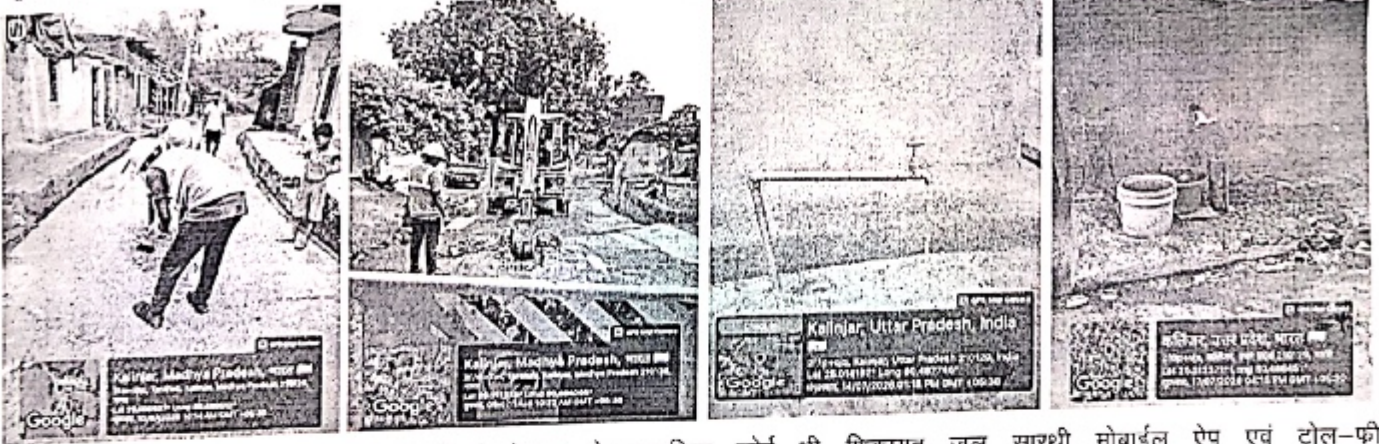

यहाँ यह भी अवगत कराना है कियोजना से सम्बन्धित कोई भी शिकायत जल सारथी मोबाईल ऐप एवं टोल-फ्री नम्बर-1800-1212-164 पर की जा सकती है। विभाग समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय
(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पूरा एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बौदा।
3. अपर जिलाधिकारी (नमागि गंगे), बौदा।
4. जिला सूचना अधिकारी, बौदा।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
6. मैसर्स एल0एण्ड0टी0 लि0, बौदा को इस निर्देश के साथ कि अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराये।

अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

गेट न0-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड-210001

पत्रांक :- 649 / W-08 / 30

दिनांक :- 20 / 07 / 2026

सेवा में,


अपर जिला सूचना अधिकारी,
बाँदा।

विषय :- दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा/चित्रकूट संस्करण के दिनांक 19.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "कालिंजर में जल जीवन मिशन का बुरा हाल" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' बाँदा/चित्रकूट संस्करण के दिनांक 19.07.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "कालिंजर में जल जीवन मिशन का बुरा हाल" के सम्बन्ध में के क्रम में आपके पत्र संख्या-153/उ0नि0सू0/समा0क0/ दिनांक 20.07.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद बाँदा में जल जीवन मिशन (फेज-I) में खदान ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड कमासिन, विसण्डा, महुआ एवं नरैनी में संचालित खदान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 342 राजस्व ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराने हेतु 01 नग इन्टेकवेल क्षमता 158 एम0एल0डी0, 01 नग डब्ल्यू0टी0पी0 क्षमता 158 एम0एल0डी0, 116 नग उर्ध्व जलाशय, 39 नग सी0डब्ल्यू0आर0, 4215 कि0मी0 पाइप लाइन व 127889 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने का कार्य पूर्ण कराते हुए पेयजलापूर्ति संचालित की जा रही है एवं वर्तमान तक 324 नग ग्रामों को हर घर नल प्रमाणीकरण की कार्यवाही भी पूर्ण करायी जा चुकी है, अवशेष कार्यों को अगस्त, 2026 तक पूर्ण कर पेयजलापूर्ति कराया जाना लक्षित है।

1- **ग्राम तरहटी कालिंजर** :- विकासखण्ड नरैनी ने खदान ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम बहादुरपुर कालिंजर में निर्मित शिरोपरि जलाशय (450 कि0ली0/25 मीटर) से ग्राम तरहटी कालिंजर में 16783.00 मीटर पाइप लाइन बिछाने एवं ग्राम में 1336 नग गृह जल संयोजन क के सापेक्ष 948 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 5500 मीटर सी0सी0 रोड ट्रेंच के सापेक्ष 5050.00 मीटर सी0सी0 रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ग्राम के समस्त अवशेष कार्यों को 15 दिवस में कराते हुए शत-प्रतिशत पेयजलापूर्ति सुचारु किया जाना लक्षित है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, जिसकी फोटोग्राफ निम्नवत् है :-

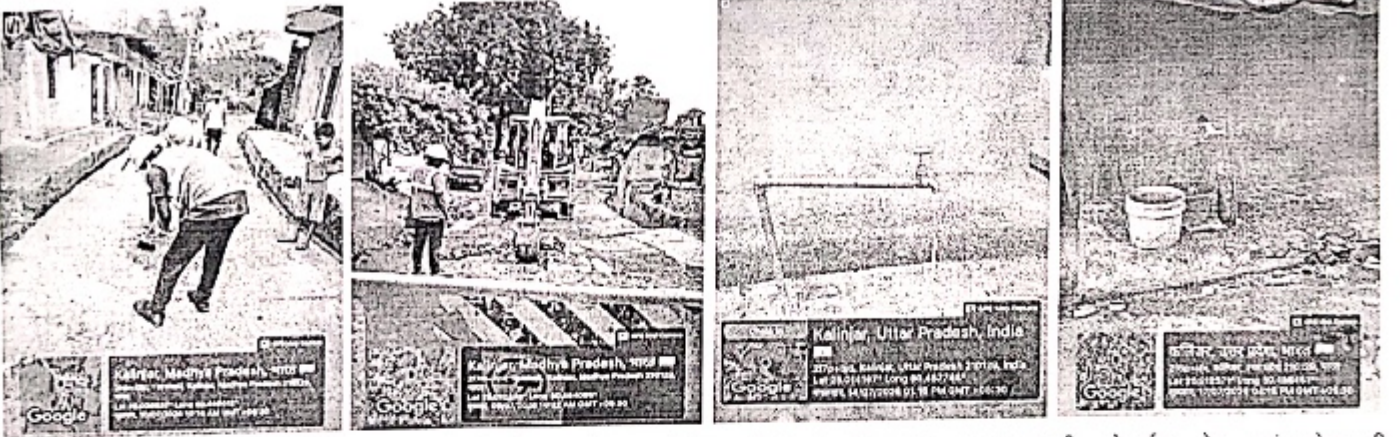

यहाँ यह भी अवगत कराना है कियोजना से सम्बन्धित कोई भी शिकायत जल सारथी मोबाईल ऐप एवं टोल-फ्री नम्बर-1800-1212-164 पर की जा सकती है। विभाग समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पु0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार । *

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
- 3- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, बाँदा।
- 5- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
- 6- मैसर्स एल0एण्ड0टी0 लि0, बाँदा को इस निर्देश के साथ कि अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण करीकर शत-प्रतिशत पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करायें।

अधिशासी अभियन्ता
