

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक

सेवा में,

4617 /

मार्च-25 /

106 दिनांक 02-6-2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय- मीडिया पर प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मीडिया पर प्रकाशित खबर 'बाराबंकी में जल जीवन मिशन योजना बंदहाल : करोड़ों खर्च के बावजूद कई गांवों में पेयजल परियोजनाएं अधूरी' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि -

- 1- मंझियावां पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पाइप लाइन-92 प्रति०, पम्प हाउस-90 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-5 प्रति० एवं हाउस कनेक्शन-80 प्रति० पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में मा० न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी है।
- 2- रसूलाबाद बिहारीलाल एवं बीबीपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पाइप लाइन-87 प्रति०, पम्प हाउस-90 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-60 प्रति० एवं हाउस कनेक्शन-70 प्रति० पूर्ण कराकर आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। वितरण प्रणाली विछाये जाने हेतु तोड़ी गयी 5.38 किमी० रोड के सापेक्ष 3.38 किमी० रोड की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 2.00 किमी० रोड को आवागमन हेतु बना दिया गया है। वर्तमान में धनाभाव के कारण समस्त कार्य बाधित हैं।
- 3- सैदनपुर सराय बेलहरी पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पाइप लाइन-97 प्रति०, पम्प हाउस-80 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-80 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-75 प्रति० एवं हाउस कनेक्शन-75 प्रति० पूर्ण कराकर आंशिक जलापूर्ति की जा रही है।
- 4- चस्मानपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, नलकूप का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पाइप लाइन-76 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-40 प्रति० एवं 60 प्रति० हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। वर्तमान में योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है।
- 5- भुनईरुद्र पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पाइप लाइन-80 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-20 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, नलकूप का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत 80 प्रति० हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। विद्युत संयोजन का कार्य अपूर्ण होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। वर्तमान में धनाभाव के कारण समस्त कार्य बन्द हैं।
- 6- जियनपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पाइप लाइन-95 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-40, पम्प हाउस-20 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति० पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत 70 प्रति० हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। वर्तमान में धनाभाव के कारण समस्त कार्य बन्द हैं।
- 7- भटिया पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पाइप लाइन-95 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-20, पम्प हाउस-60 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-70 प्रति० पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत 75 प्रति० हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। योजना से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में धनाभाव के कारण समस्त कार्य बन्द हैं।
- 8- लाखपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत पाइप लाइन-88 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-95, पम्प हाउस-95 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-95 प्रति० पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत 90 प्रति० हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। योजना सम्मिलित 05 मजदूरों में से 04 मजदूरों में जलापूर्ति की जा रही है। डी०आई० ज्वाइंटिंग का कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही समस्त ग्राम पंचायत में सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। साथ ही अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं को दिसम्बर, 2028 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अन्दर समस्त योजनाओं के कार्य पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आस्था सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।


प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री पियूष शुक्ला, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 8- सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता

बाराबंकी में जल जीवन मिशन योजना बदहाल: करोड़ों खर्च के बावजूद कई गांवों में पेयजल परियोजनाएं अधूरी

नीरज शुक्ला | हैदरगढ़, बाराबंकी 2 घंटे पहले

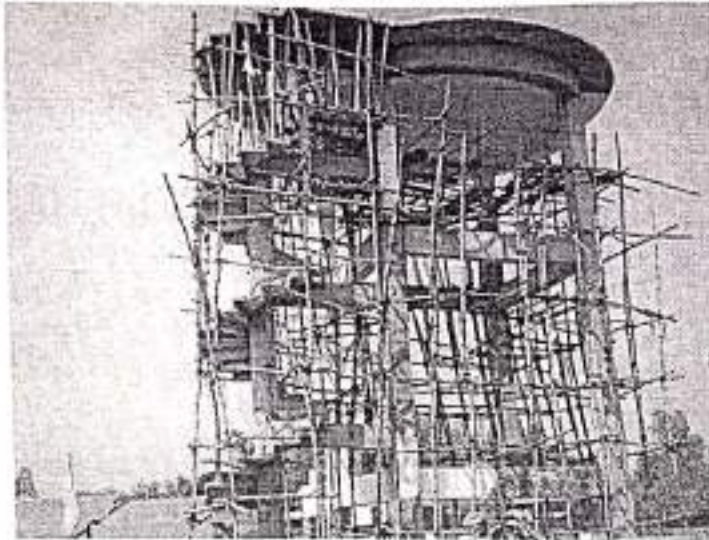

जियनपुर → Pipeline → 98%
PH → 30%, ~~PH → 80%~~, FHTL → 50%
BW → 80%
OHT → 35%

Bhatiya → Pipeline → 95%
PH → 60%, FHTL →
BW → 70%
OHT → 20%

Water supply continuous

जल जीवन मिशन योजना बदहाल।

बाराबंकी जिले के सिद्धौर ब्लॉक में सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना बदहाल स्थिति में है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद, क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जिससे ग्रामीण शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं।

जियनपुर गांव में पिछले डेढ़ साल से पानी की टंकी का ढांचा तैयार है और सोलर पैनल भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन परियोजना अधूरी है। इसी तरह, भाठिया गांव में भी टंकी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि लाखपुर गांव में निर्माणाधीन टंकी में केवल ढांचा ही लगा है।

माझियावां गांव में जल जीवन मिशन का काम पिछले दो साल से रुका हुआ है। यहां अब तक केवल बाउंड्री वॉल बनाई गई है और एक जनरेटर रखा है। न तो पानी की टंकी बनी है और न ही समुचित पाइपलाइन बिछाई गई है। बताया गया है कि विवादित जमीन पर टंकी का काम होने के कारण यह मामला बाधित है।

रसूलाबाद बिहारी लाल गांव में भी पानी की टंकी का काम अधूरा है और पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, कौराहापुरवा से जैदपुर रोड के पास बिछाई गई पाइपलाइन लंबे समय से लीक कर रही है, जिससे पानी बर्बाद हो रहा है।

कौराहापुरवा, पत्थरपुरवा, निबहरा और रसूलाबाद गांवों में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सीसी रोड और इंटरलॉकिंग सड़कों की मरम्मत आज तक नहीं की गई है। इससे आए दिन बाइक और साइकिल सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

प्रशासक प्रधान अनिल कुमार के अनुसार, इन समस्याओं की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस्मानपुर, भुनई, रुद्र, सैदनपुर और अतरौली सहित कई अन्य गांवों में भी जल जीवन मिशन की स्थिति समान रूप से बदहाल है।

7318370495

सैदनपुर में तीन साल बाद भी पानी की टंकी अधूरी है। खोजेनगर और सैदनपुर मजरे में पाइपलाइन नहीं बिछी है और टंकी का ढांचा भी अधूरा पड़ा है। पंप से सीधे पानी छोड़ने पर डफरापुर में डाली गई पाइपलाइन जगह-जगह लीक हो रही है।

इस संबंध में अवर अभियंता विमल गिरी ने बताया कि माझियावां का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण काम रुका हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रसूलाबाद और अन्य गांवों की समस्याओं को जल्द दूर कराया जाएगा। सैदनपुर में बजट की कमी के कारण काम रुका है, और लीकेज की समस्या को भी जल्द ठीक कराया जाएगा।
