



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

कुशीनगर

05564 297311

eeeralkushinagar@gmail.com

पत्रांक 1724 / कार्य-21 / 1102

दिनांक: 03/06/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

कुशीनगर।

विषय- ई- पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर अमर उजाला कुशीनगर के प्रकाशन दिनांक 16.04.2026 के शीर्षक "टंकिया बनकर तैयार, पर घरों तक नहीं पहुँचा पानी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं तथा उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिनकी अनुमानित लागत (रु० लाख में) 183866.40 है, जिनसे जनपद के कुल 667 अदद ग्राम पंचायतों के 904 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 333353 अदद गृह जल संयोजन किया जाना है। उक्त 453 अदद योजनाओं में कुल 454 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 454 अदद पम्प हाउस, 454 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6389 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष कुल 453 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 442 अदद पम्प हाउस, 233 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6232 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। लगभग 550 अदद राजस्व ग्रामों में पूर्ण/आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है (फोटोग्राफ संलग्न)।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त कार्यों के मद में विगत 14 माह से समुचित भुगतान न हो पाने के कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है तथा उक्त कार्यों को पूर्ण करने की लक्षित तिथि को भारत सरकार के स्तर से वर्ष 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त कार्यों के मद में धन उपलब्धता हो गयी है जिन्हें लक्षित समयावधि में पूर्ण करते हुये सूचारु रूप से जलापूर्ति की जानी है।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पूर्व निर्मित समस्त 195 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय द्वारा मे० बिन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को नामित किया गया है, जिसमें से 21 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाएं पूर्ण क्षमता पर तथा 109 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है (फोटोग्राफ संलग्न) तथा 65 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाएं विभिन्न कारणों यथा वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होना, गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त होना, पम्पिंग प्लान्ट/ट्रान्सफार्मर में खराबी होना आदि से जलापूर्ति बंद है। उक्त एजेंसी द्वारा जनपद की समस्त पूर्व निर्मित योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु सर्वेक्षण तथा प्राक्कलन विवरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी रसीद ति के उपरान्त उक्त कार्यों को कराते हुये सूचारु रूप से जलापूर्ति की जानी है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

कुशीनगर

☎ 05564 297311

✉ eauralkushinagar@gmail.com

पत्रांक 1/24 /

फाइ-21 / 1162

दिनांक: 03/06/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
कुशीनगर।

विषय- ई- पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में
महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर अमर उजाला कुशीनगर के प्रकाशन दिनांक 16.04.2026 के शीर्षक "टंकिया बनकर तैयार, पर धरौ तक नहीं पहुँचा पानी" के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं तथा उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिनकी अनुमानित लागत (रु० लाख में) 183866.40 है, जिनसे जनपद के कुल 667 अदद ग्राम पंचायतों के 904 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 333353 अदद गृह जल संयोजन किया जाना है। उक्त 453 अदद योजनाओं में कुल 454 अदद द्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 454 अदद पम्प हाउस, 454 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6389 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष कुल 453 अदद द्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 442 अदद पम्प हाउस, 233 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6232 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। लगभग 550 अदद राजस्व ग्रामों में पूर्ण/आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है (फोटोग्राफ संलग्न)।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त कार्य के मद में विगत 14 माह से समुचित भुगतान न हो पाने के कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है तथा उक्त कार्यों को पूर्ण करने की लक्षित तिथि को भारत सरकार के स्तर से वर्ष 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त कार्यों के मद में धन उपलब्धता हो गयी है जिन्हें लक्षित समयवधि में पूर्ण करते हुये सूचारु रूप से जलापूर्ति की जानी है।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पूर्व निर्मित समस्त 195 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मुख्यालय द्वारा मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को नामित किया गया है, जिसमें से 21 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाएँ पूर्ण क्षमता पर तथा 109 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है (फोटोग्राफ संलग्न) तथा 65 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाएँ विभिन्न कारणों यथा वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होना, गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त होना, पम्पिंग प्लान्ट/ट्रान्सफार्मर में खराबी होना आदि से जलापूर्ति बंद है। उक्त एजेंसी द्वारा जनपद की समस्त पूर्व निर्मित योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु सर्वेक्षण तथा प्राक्कलन विवरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी स्वीकृति के उपरान्त उक्त कार्यों को कराते हुये सूचारु रूप से जलापूर्ति की जानी है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव।


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



GPS Map Camera

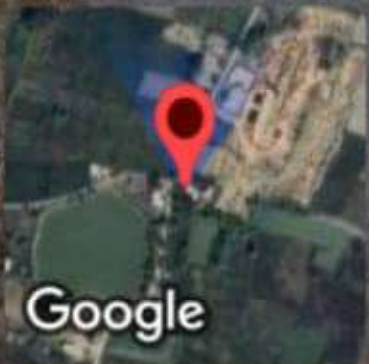

Google

सेमरा हड्डो पत्ती, उत्तर प्रदेश, भारत 🇮🇳

P4q9+g66, सेमरा हड्डो पत्ती, उत्तर प्रदेश 274401, भारत

Lat 26.739833° Long 84.118987°

बुधवार, 03/06/2026 06:14 AM GMT +05:30



Scanned with OKEN Scanner





GPS Map Camera

सेमरा हड्डो पत्ती, उत्तर प्रदेश, भारत 🇮🇳

P4q9+g66, सेमरा हड्डो पत्ती, उत्तर प्रदेश 274401, भारत

Lat 26.739833° Long 84.118987°

बुधवार, 03/06/2026 06:14 AM GMT +05:30

Google
