



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
कुशीनगर

05564 297311

eeruralkushinagar@gmail.com

पत्रांक 1723 / कार्य-21 / 1101

दिनांक: 03/06/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

कुशीनगर।

विषय- ई- पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर हिन्दुस्तान के शीर्षक "1.32 अरब की जल जीवन मिशन योजना अधर में, 02 साल बाद भी प्यासे 44 गांव" दिनांक 02.06.2026 के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।


उक्त के कम में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण विकास खण्ड नेबुआ नौरगिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 व फेज-3 में विकास खण्ड नेबुआ नौरगिया में कुल 45 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कार्यदायी एजेंसी मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है जिससे विकास खण्ड नेबुआ नौरगिया की कुल 96 अदद राजस्व ग्रामों के 32528 घरों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त 45 अदद योजनाओं में कुल 45 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 45 अदद पम्प हाउस, 45 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 680.89 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित) का कार्य पूर्ण है, 44 अदद पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है, 08 अदद शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है, एवं 646.40 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है, तथा शेष कार्य प्रगति पर है। 22 अदद पेयजल योजनाओं से पूर्ण क्षमता पर एवं 13 अदद पेयजल योजनाओं से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है (फोटोग्राफ संलग्न) तथा शेष योजनाओं के विभिन्न अवशेष निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें दिसम्बर 2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि विगत लगभग डेढ़ वर्ष तक उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश का धनावंटन न होने के कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है। वर्तमान में उक्त कार्यों के मद में धन उपलब्धता हो गयी है जिन्हें लक्षित समयावधि में पूर्ण करते हुये सूचारु रूप से जलापूर्ति की जानी है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

पृ०स० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
कुशीनगर

05564 297311

eeruralkushinagar@gmail.com

पत्रांक 1/23 / कार्य-21 / 1101

दिनांक: 03/06/2028

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

कुशीनगर।

विषय— ई- पेपर के माध्यम से प्रकाशित प्रकरण की आख्या के सम्बन्ध में महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर हिन्दुस्तान के शीर्षक "1.32 अरब की जल जीवन मिशन योजना अधर में, 02 साल बाद भी प्यासे 44 गांव" दिनांक 02.06.2026 के सम्बन्ध में आप द्वारा आख्या चाही गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण विकास खण्ड नेबुआ नौरगिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 व फेज-3 में विकास खण्ड नेबुआ नौरगिया में कुल 45 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कार्यदायी एजेंसी मे० एन०सी०सी० लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है जिससे विकास खण्ड नेबुआ नौरगिया की कुल 96 अदद राजस्व ग्रामों के 32528 घरों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त 45 अदद योजनाओं में कुल 45 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 45 अदद पम्प हाउस, 45 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 680.89 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित) का कार्य पूर्ण है, 44 अदद पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है, 08 अदद शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है, एवं 646.40 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है, तथा शेष कार्य प्रगति पर है। 22 अदद पेयजल योजनाओं से पूर्ण क्षमता पर एवं 13 अदद पेयजल योजनाओं से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है (फोटोग्राफ संलग्न) तथा शेष योजनाओं के विभिन्न अवशेष निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें दिसम्बर 2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि विगत लगभग डेढ़ वर्ष तक उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश का धनावंटन न होने के कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है। वर्तमान में उक्त कार्यों के मद में धन उपलब्धता हो गयी है जिन्हें लक्षित समयावधि में पूर्ण करते हुये सूचारु रूप से जलापूर्ति की जानी है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता


पृ०स० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- 2— अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 3— मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- 4— मुख्य अभियन्ता (गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
- 5— अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
- 6— जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर।

अधिशासी अभियन्ता



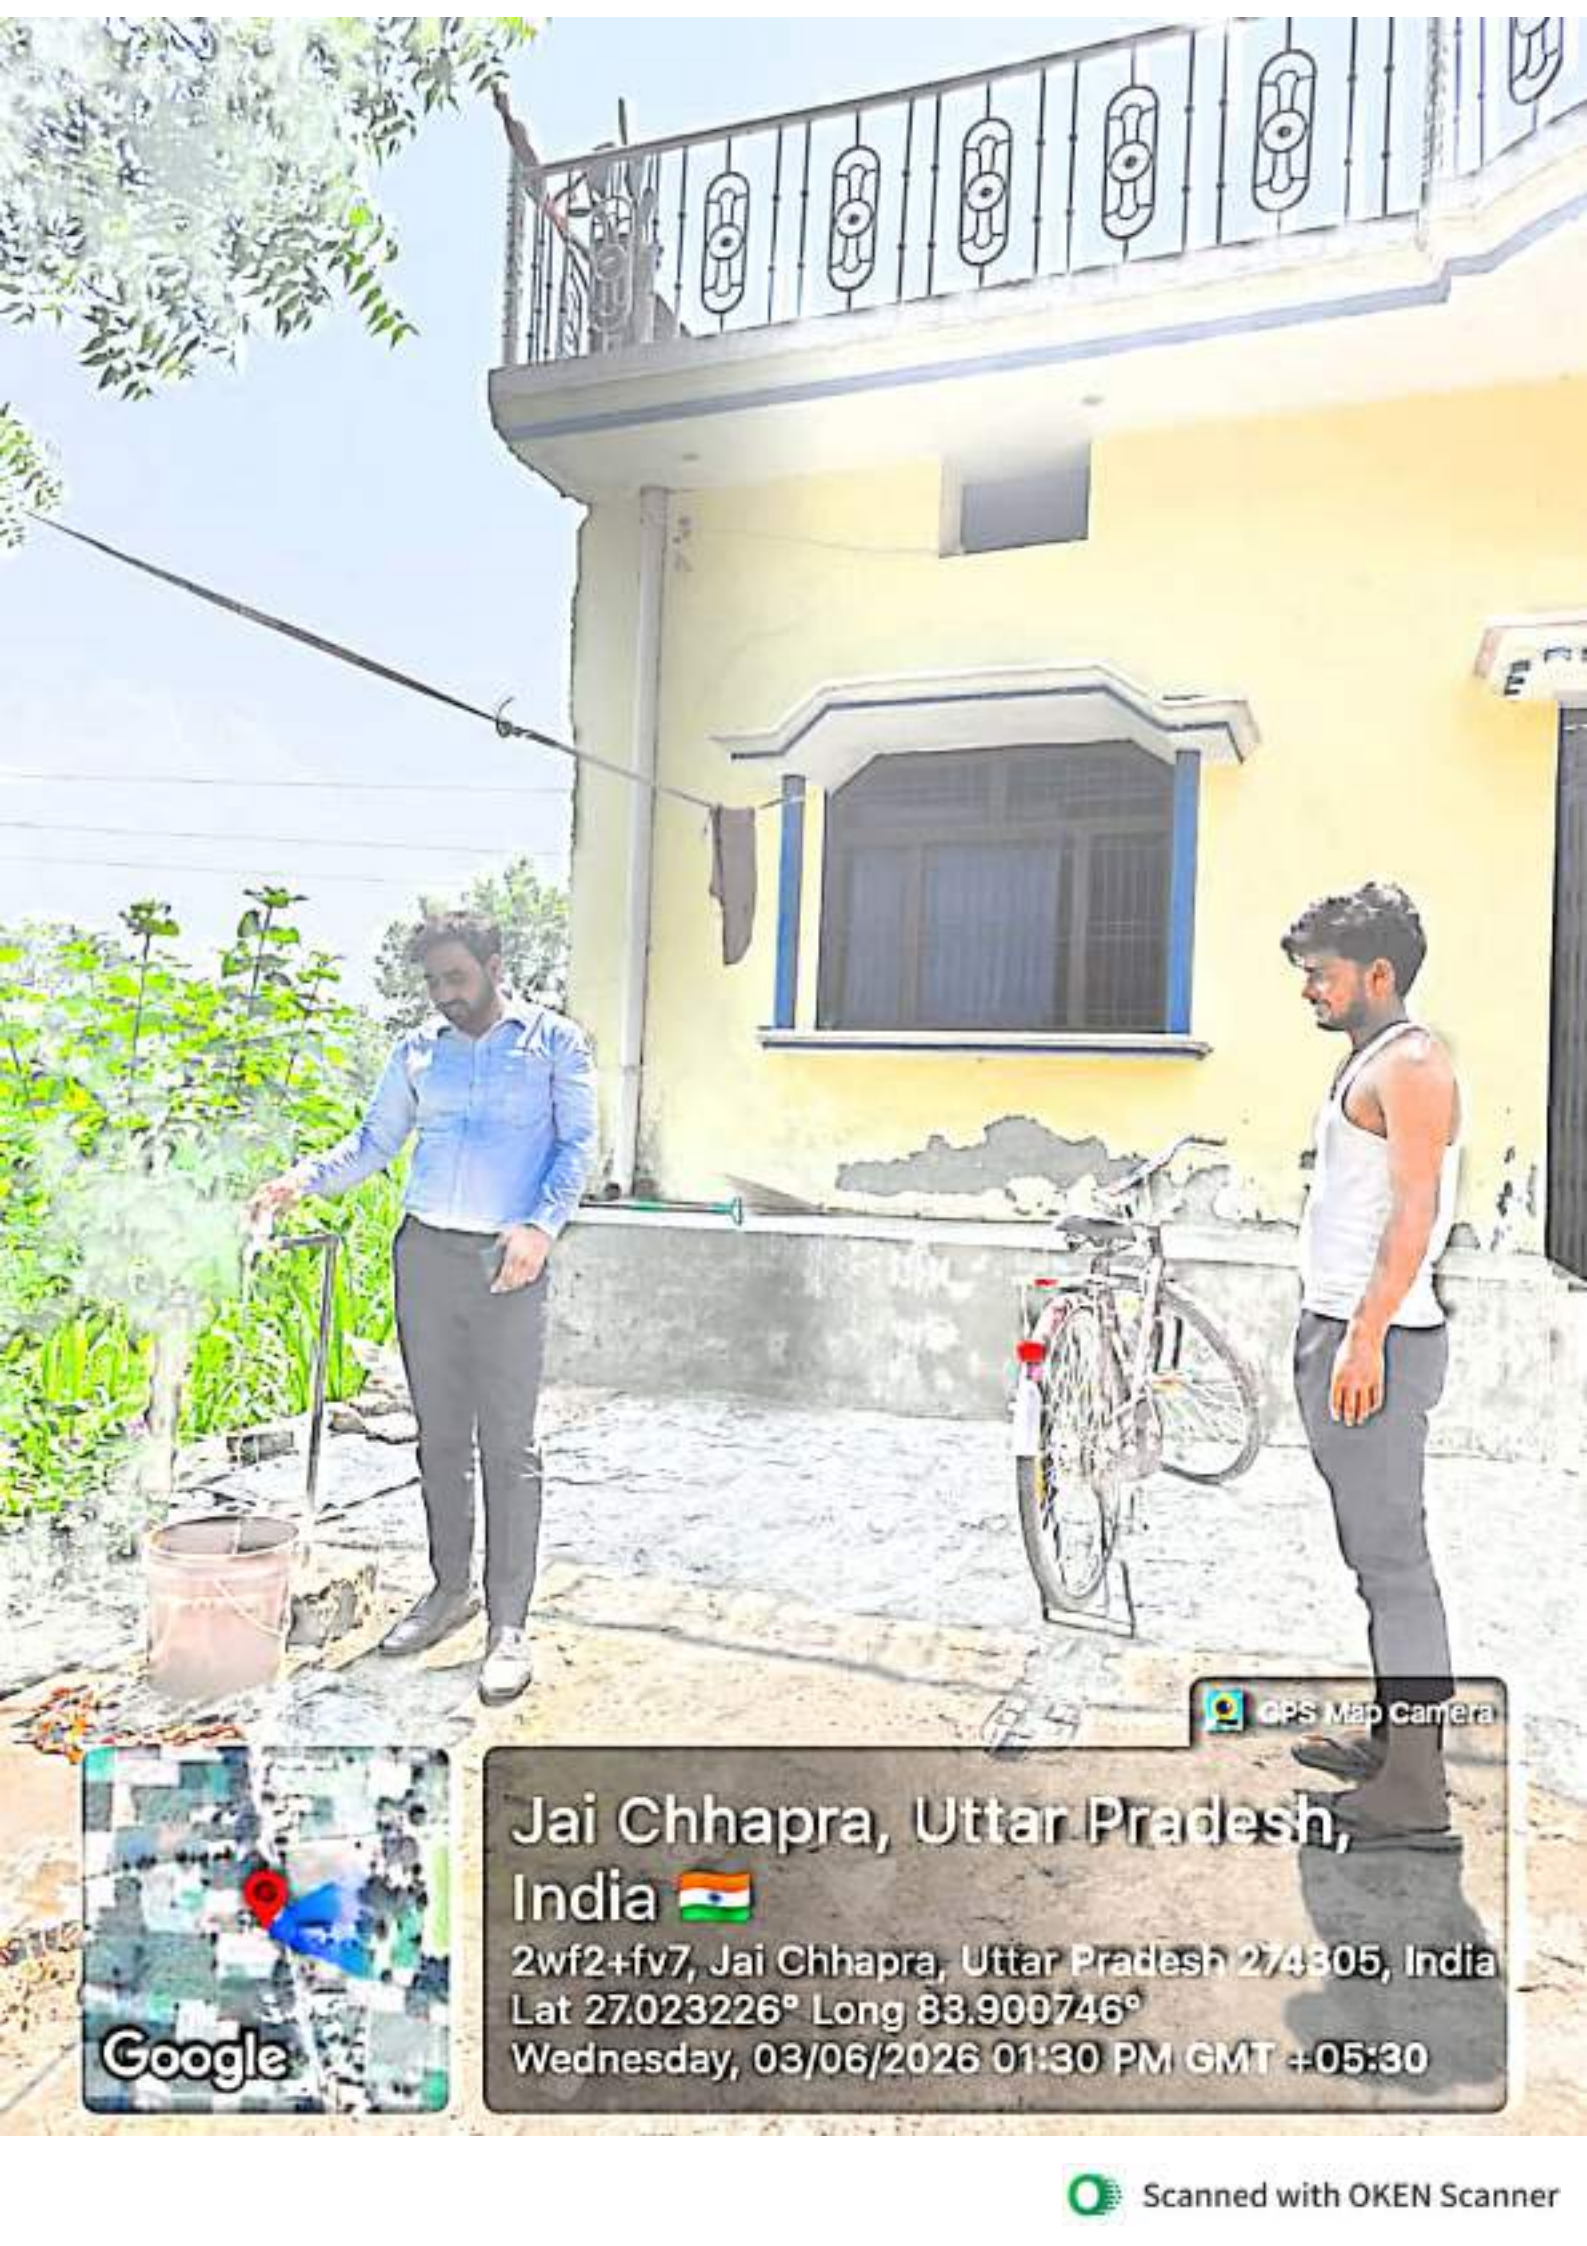

GPS Map Camera

Jai Chhapra, Uttar Pradesh,
India 🇮🇳

2wf2+fv7, Jai Chhapra, Uttar Pradesh 274305, India
Lat 27.023226° Long 83.900746°
Wednesday, 03/06/2026 01:30 PM GMT +05:30





GPS Map Camera



Jai Chhapra, Uttar Pradesh,
India 🇮🇳

2wf2+fv7, Jai Chhapra, Uttar Pradesh 274305, India

Lat 27.023206° Long 83.900729°

Wednesday, 03/06/2026 01:29 PM GMT +05:30



Scanned with OKEN Scanner



GPS Map Camera




Jai Chhapra, Uttar Pradesh,
India 🇮🇳

2wf2+fv7, Jai Chhapra, Uttar Pradesh 274305, India
Lat 27.023206° Long 83.900729°
Wednesday, 03/06/2026 01:29 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera

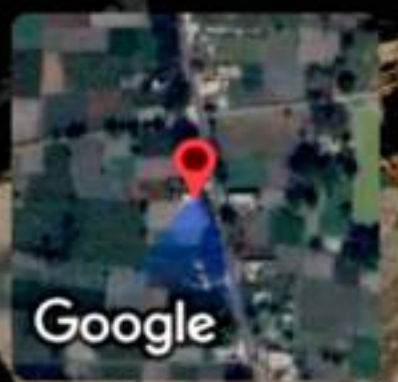

Jai Chhapra, Uttar Pradesh,
India 

2wf2+fv7, Jai Chhapra, Uttar Pradesh 274305, India
Lat 27.023223° Long 83.900744°
Wednesday, 03/06/2026 01:30 PM GMT +05:30



Latitude: 26.972735
Longitude: 83.832769
Elevation: 94.1±13.7 m
Accuracy: 8.563 m
Time: 22-05-2026 09:30
Note: block - nebua naurangiya
scheme - pipra khurd

Powered by NoteCam



Scanned with OKEN Scanner



Latitude: 26.972724
Longitude: 83.832767
Altitude: 27.46±11.3 m
Accuracy: 7.215 m
Time: 22-05-2026 09:29
Note: block - nebua naurangiya
scheme - pipra khurd

Powered by NoteCam



Scanned with OKEN Scanner
