



**खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
पावर हाउस रोड, मैनपुरी**

Email ID- upjnrmmainpuri@upjn.co.in

पत्र सं०- 1847 /

29

दि० 03/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियंता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:-

हिन्दुस्तान समाचार पत्र संस्करण में दिनांक 02.06.2026 को प्रकाशित "जल जीवन मिशन के सोलर पैनल से 10 प्लेटें चोरी" शीर्षक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन 'हर घर जल' के फेज-2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन नवीगंज ग्राम पेयजल योजना के निर्माण कार्यों की प्रगति आख्या निम्नवत है-

योजनान्तर्गत नवीगंज ग्राम पेयजल योजना (स्वीकृत लागत 387.75 लाख) में 01 ग्राम पंचायत- नवीगंज सम्मिलित है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु 01 नग अवर जलाशय, 02 नग नलकूप, 02 नग पम्प हाउस, 01 नग बाउण्ड्री वाल एवं वितरण प्रणाली 10.81 किमी० एवं 976 नग एफ०एच०टी०सी० प्रस्तावित है।

जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 02 नग नलकूप, 01 नग बाउण्ड्री वाल, एवं 02 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं 01 नग अवर जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है वितरण प्रणाली 10.00 किमी० बिछाई जा चुकी है एवं 340 घरों को पेयजल गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। योजना पर भौतिक प्रगति 68.4 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान तक वित्तीय प्रगति 61.41 प्रतिशत है।

योजना पर 37 सोलर अधिष्ठान का कार्य मै० एन०सी०सी० लि० के द्वारा कराया गया। 10 नग सोलर पैनल दिनांक 02.06.2026 को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसकी FIR मै०एन०सी०सी० लि० द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। मुख्य उपकरणों के गायब एवं प्लेट चोरी होने से पेयजल योजना पर जलापूर्ति वर्तमान में बाधित है। साथ ही एन०सी०सी० लि० को भी निर्देशित किया गया है कि उक्त योजना पर तत्काल प्रभाव से चोरी किये गये सोलर पैनल की जगह पर नई सोलर पैनल लगाते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ करायें। जिससे ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जना सम्भव हो सकें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

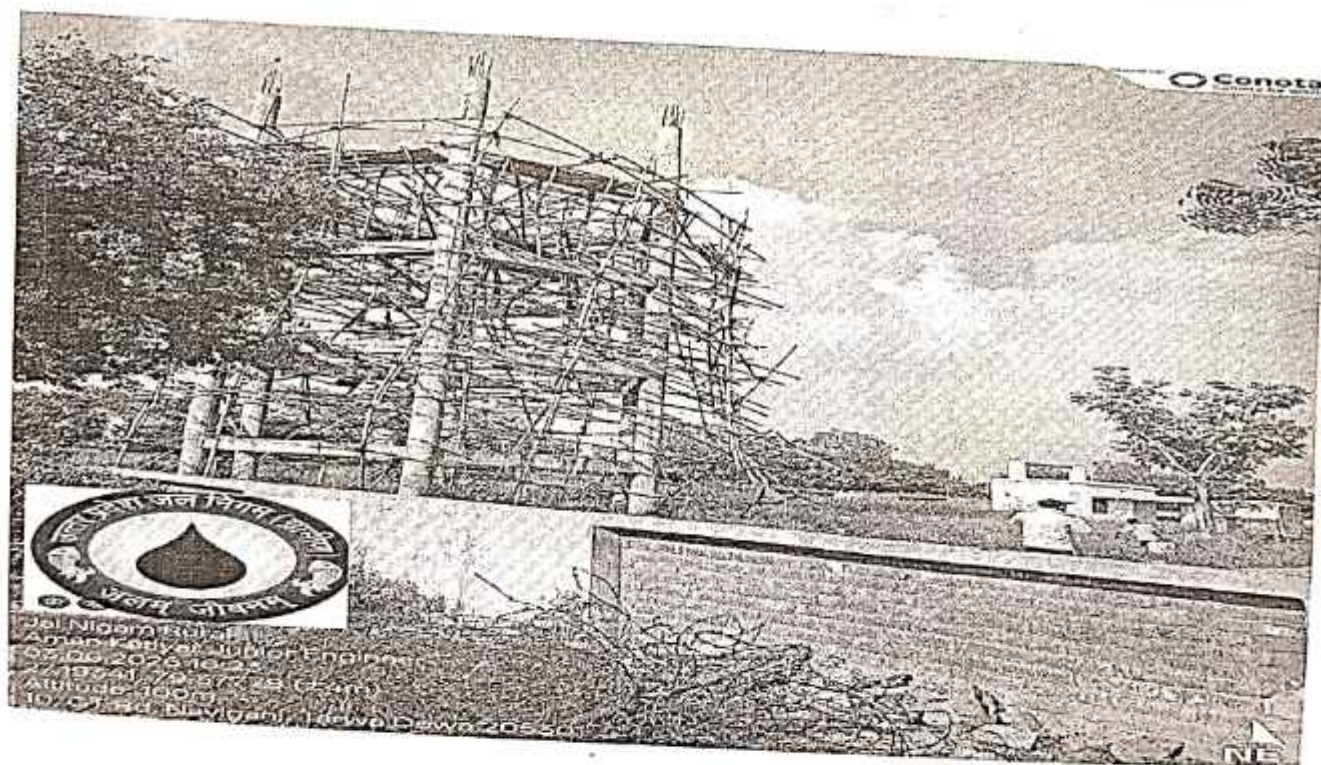
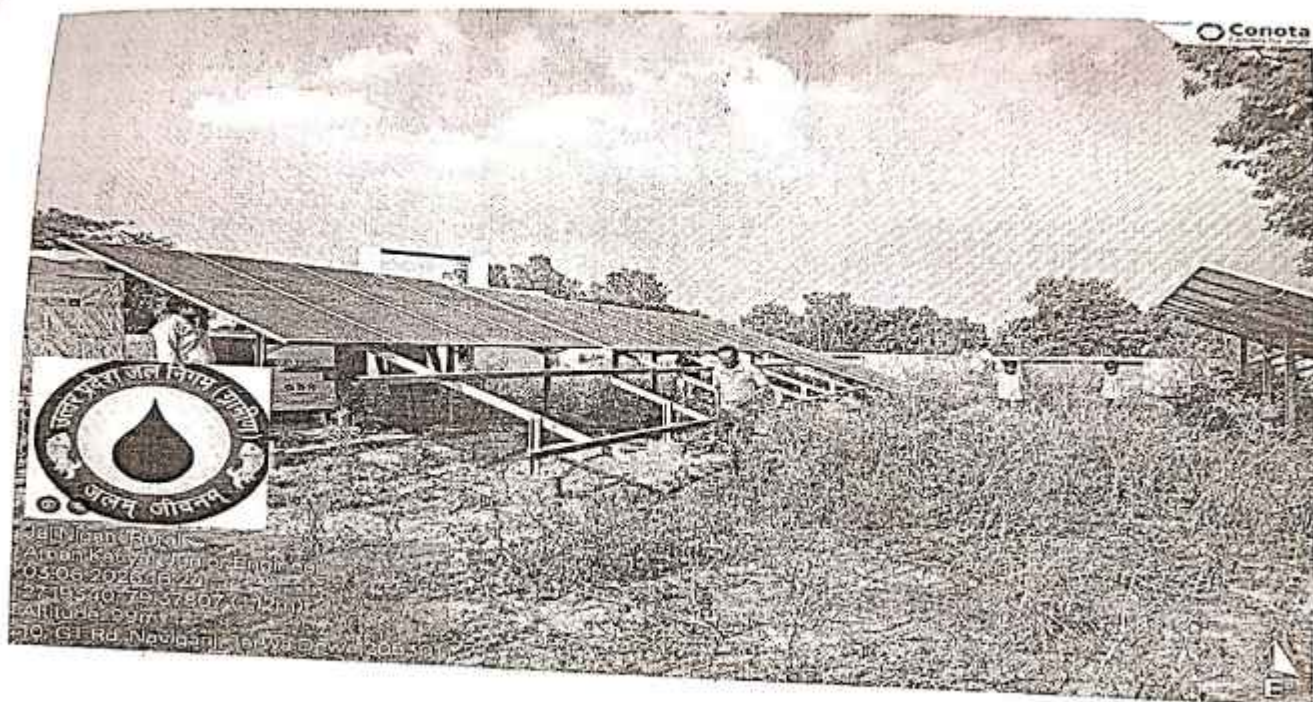
भवदीय



अधिसासी अभियंता

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिसासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
3. अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. जिलाधिकारी महोदय, मैनपुरी।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
6. श्री सूरजभान सिंह, सहायक अभियंता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संयुक्त महाप्रबन्धक मै० एन०सी०सी० लि० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिसासी अभियंता



[illegible]

योजना पर 37 सोलर अधिष्ठान का कार्य मै० एन०सी०सी० लि० के द्वारा कराया गया। 10 नग सोलर पैनल दिनांक 02.06.2026 को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसकी FIR मै०एन०सी०सी० लि० द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। मुख्य उपकरणों के गायब एवं प्लेट चोरी होने से पेयजल योजना पर जलापूर्ति वर्तमान में बाधित है। साथ ही एन०सी०सी० लि० को भी निर्देशित किया गया है कि उक्त योजना पर तत्काल प्रभाव से चोरी किये गये सोलर पैनल की जगह पर नई सोलर पैनल लगाते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ करावें। जिससे ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकें।

A
अधिसासी अभियंता

सेवा में,

चौकी प्रभारी महोदय
चौकी नबीगंज थाना बेवर
जनपद मैनपुरी उ०प्र०।

विषय:- पानी टंकी से सौर्य ऊर्जा प्लेट चोरी हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि संजीव कुमार पुत्र श्रीकृष्ण ग्राम व पोस्ट नबीगंज थाना बेवर जिला मैनपुरी का निवासी हूँ। प्रार्थी पानी की टंकी पर ऑपरेटर पद पर कार्य करता है। दिनांक 01.06.2026 को रात्रि में पानी टंकी पर लगी सौर्य ऊर्जा की 10 प्लेटें अज्ञात लोग चोरी कर ले गये।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अज्ञात लोगों का पता लगाकर पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

दिनांक 02.06.2026

प्रार्थी

ग्राम नबीगंज पोस्ट नबीगंज
थाना बेवर जिला मैनपुरी उ०प्र०।
मो०न० 7889504831
