

मुख्य अभियन्ता, (ग्रामीण)

उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण)

लखनऊ।

विषय: दिनांक 13.06.2026 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित नकारात्मक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 13.06.2026 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर टंकी का कार्य अधूरा, पानी को तरस रहे ग्रामीण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खबर का संज्ञान लेते हुए जू०इ० संजय चौरसिया एवं फर्म वी०एस०ए० के इंजीनियर द्वारा योजना का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूरतगंज पेयजल योजना, विकास खण्ड सूरतगंज में पाइप लाइन-70 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-70 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-100 प्रति०, पम्प हाउस-100 प्रति० एवं 230 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी 4290 मी० रोड के सापेक्ष 3900 मी० रोड की स्थाई पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अवशेष 390 मी० रोड को आवागमन हेतु बना दिया गया है। शीघ्र ही अवशेष रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। योजनान्तर्गत सम्मिलित बीकेपुर ग्राम में पाइप लाइन की टेस्टिंग कराते हुए डी०जी० के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गयी थी। योजनान्तर्गत विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण न होने के कारण वर्तमान में जलापूर्ति बाधित है। शीघ्र ही विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कराते हुए बीकेपुर ग्राम में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(अमित कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1-अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2-मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
- 4-जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5-मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6-जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7-श्री अजय रंजन, सहा० अभियन्ता।
- 8-श्री चिरंजीव पात्रा प्रोजेक्ट मैनेजर वी०एस०ए० को इस निर्देश के साथ कि विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण कराते हुए योजना में शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ कराये।

अधिशासी अभियन्ता

सूरतगंज में जल जीवन मिशन अधूरा, ग्रामीण पानी को तरसे: एक साल में पूरा होना था काम, तीन साल से टंकी का निर्माण रुका

सापवान फात | सूरतगंज
(कतहपुरा, बाराबंकी)
3 दिन पहले

f X e

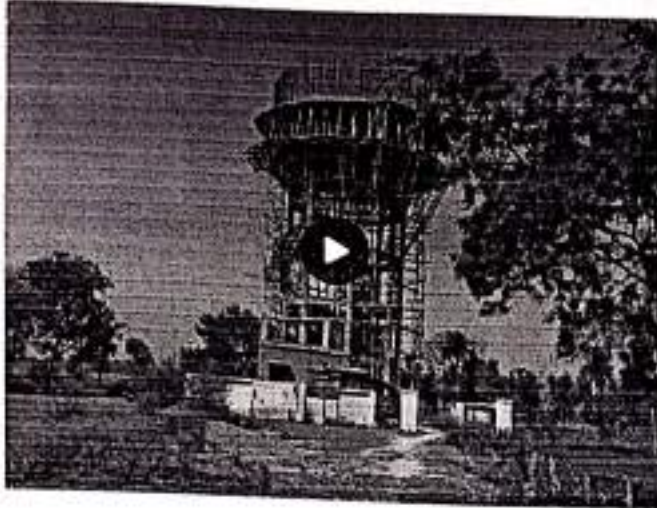

जल जीवन मिशन के तहत बन रही टंकी।




बाराबंकी जनपद के सूरतगंज ब्लॉक क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना अधूरी पड़ी है। भीषण गर्मी के बीच कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, सूरतगंज पंचायत के बीकेपुर गांव में वर्ष 2023 में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस योजना का लक्ष्य गांवों में पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था। शुरुआती चरण में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चला, जिससे ग्रामीणों में जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी थी।

हालांकि, योजना को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से पानी की टंकी का निर्माण अधूरा पड़ा है और कार्यस्थल पर कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। परिणामस्वरूप, गांव के लोगों को आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए कई गांवों की सड़कों और गलियों की खुदाई की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। टूटी सड़कों के कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

भोजन गर्मी के इस मौसम में अधूरी पड़ी यह योजना ग्रामीणों की चिंता का मुख्य कारण बनी हुई है। अधिकांश लोग आज भी हैंडपंप और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यदि योजना समय पर पूरी हो जाती तो उन्हें स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलती और गर्मी में पानी की समस्या से काफी राहत मिलती।

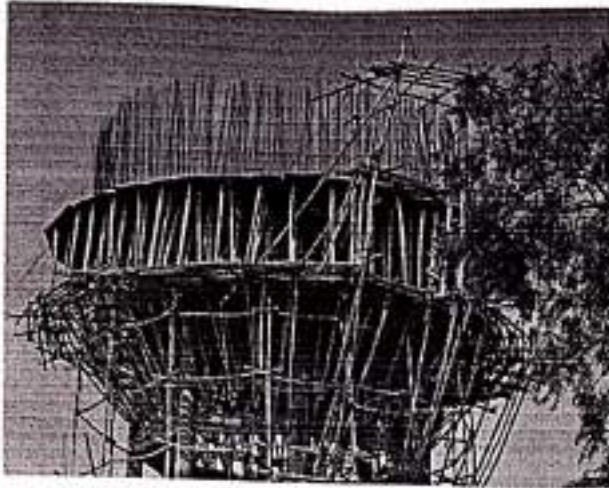

इस संबंध में जल निगम के जूनियर इंजीनियर (जेई) संजय चौरसिया ने बताया कि बजट की कमी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अधूरी पड़ी पानी की टंकी के मामले में संबंधित ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाकर कार्रवाई की गई है। अब दूसरे ठेकेदार के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया चल रही है। जेई के अनुसार, अगले महीने से पानी की टंकी सहित अन्य अधूरे कार्यों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हर घर तक नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की योजना को जल्द धरातल पर उतारा जा सके।

ग्रामीणों ने जल्द कार्य पूरा कराने की उठाई मांग

ग्रामीण मनीष, जगेश, सुरेंद्र, रामू, सुनील, कमलेश ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। साथ ही पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत भी कराई जाए, ताकि लोगों को पेयजल और बेहतर आवागमन दोनों सुविधाएं मिल सकें।

