



Mob- 9473942685

E-mail- cc3rdmdivjnp@gmail.com

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर

पत्रांक:

644 / समाचार पत्र / 10

दिनांक: 15/04/2026

सेवा मे,


मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय:-

समाचार पत्र लाईव हिन्दुस्तान में दिनांक: 15.04.2026 को प्रकाशित "सड़क मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन" की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र लाईव हिन्दुस्तान में दिनांक: 15.04.2026 को प्रकाशित

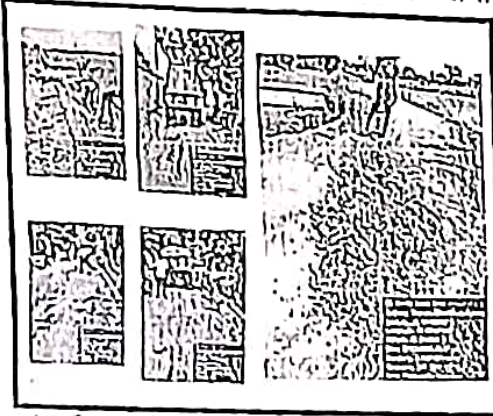

"सड़क मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण मलेधू ग्राम पेयजल योजना विकास खण्ड-रामपुर से सम्बन्धित है। योजनान्तर्गत पम्प हाउस, वाउण्ट्रीवाल एवं शिरोपरि जलाशय का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है, पाइप लाइन 27800.00 मीटर के सापेक्ष 25100.00 मीटर विछायी गयी है। गृह संयोजन 747 नग के सापेक्ष 480 नग पूर्ण है। योजनान्तर्गत सोलर अधिष्ठापन का कार्य अवशेष है। पाइप लाइन विछाये जाने के बाद ट्रेन्च में मिट्टी भराई कर मोटरवेल कर दिया गया था, वाहनों के आवागमन एवं जल जमाव के कारण पुनः सड़क पर गद्दा हो गया है जिसे ठीक कराने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया है। जुलाई 2024 से जल जीवन मिशन अन्तर्गत केन्द्रांश का धनावंटन/भुगतान न होने के कारण कार्य अत्यन्त धीमी गति से प्रगति पर है। वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया जाना लक्षित है।

अतः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अधिकेश कुमार)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०

644 / समाचार पत्र / 10

दिनांक: 15/04/2026

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर।

अधिशाली अभियन्ता
