



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम-भन्सरिया, पो०-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक 2123

/ M-48

/ 80DA

दिनांक 22/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

लखनऊ।


विषय:—दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 21.06.2026 को प्रकाशित खबर "बाबरपुर चौरिया गांव में महीनों से पानी की समस्या:ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित खबर विकास खण्ड-बांकेगंज "बाबरपुर चौरिया गांव में महीनों से पानी की समस्या:ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन०सी०सी० एवं वी०टी०एल० को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतुष्ट किया जाना लक्षित है। नलकूप-942 नग, पम्प हाउस -942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 14468 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-535515 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1097 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की खबर विकास खण्ड-बांकेगंज की ग्राम पंचायत बाबरपुर चौरिया पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित है। बाबरपुर चौरिया पेयजल योजना का कार्य एजेंसी मेसर्स वी०टी०एल-गाजा लि० नोएडा द्वारा कराया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर अभिषेक कुमार द्वारा उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि बाबरपुर चौरिया योजना निर्माणाधीन है, योजना में सोलर के माध्यम से डायरेक्ट जलापूर्ति की जा रही है बाबरपुर चौरिया ग्राम में कुल 04 मजरें हैं जिनमें से 02 मजरों में लीकेज के होने कारण आंशिक जलापूर्ति हो रही है शेष 02 मजरों में वाटर प्रेशर की समस्या होने के कारण सप्लाई बाधित है लीकेज मरम्मत हेतु सम्बन्धित फर्म मै० वी०टी०एल० लि० को निर्देशित कर दिया गया है कि 02 दिवस में उक्त कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति सुचारु रूप प्रारम्भ करा दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

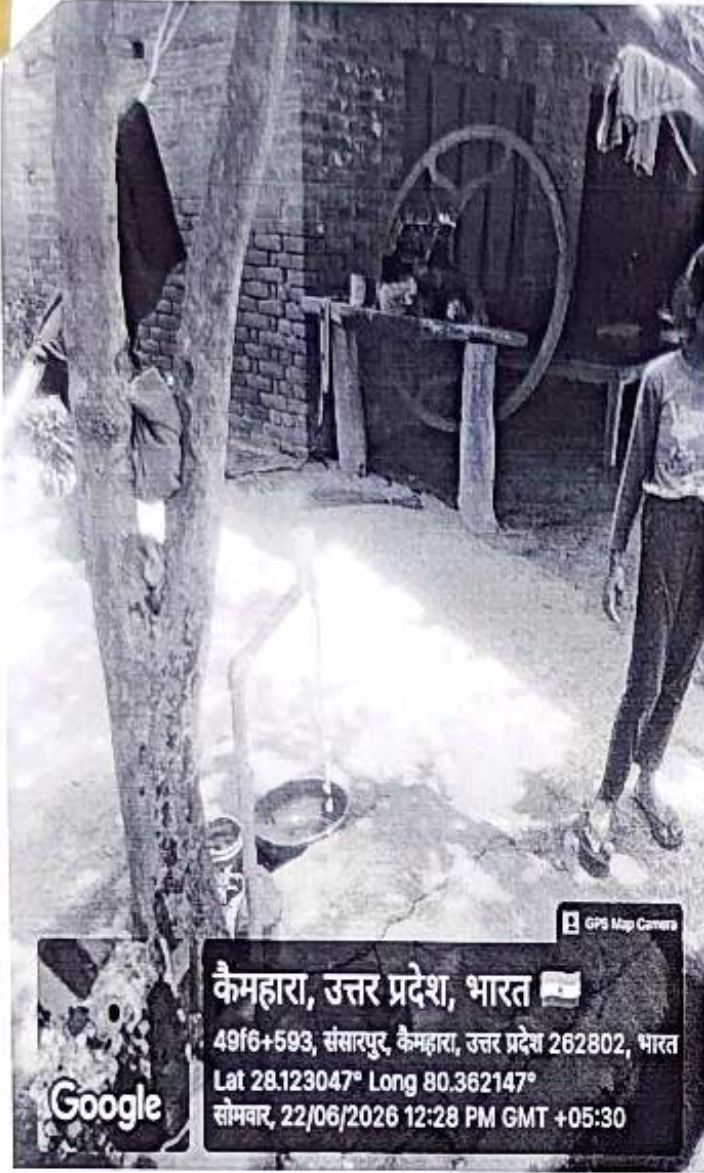

भवदीय

(मनोज कुमार मौर्य)
अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

अधिशायी अभियन्ता
