



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) भदोही-221304

E-Mail Id: ecupjnsn@gmail.com CUG Mobile No.: +91 9473942678

पत्रांक
सेवा में,

1854 / का-65

/ 15

दिनांक- 30-04-2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम ग्रामीण,
6 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय :-

दैनिक भास्कर के न्यूज ई-पेपर में दिनांक 29.04.2026 में प्रकाशित जनपद भदोही के जंगीगंज में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त रगईपुर के ग्रामीण शुद्ध जल के लिए बेहाल होने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर के न्यूज ई-पेपर में दिनांक 29.04.2026 में प्रकाशित जनपद भदोही के जंगीगंज में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त रगईपुर के ग्रामीण शुद्ध जल के लिए बेहाल समस्याओं के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि रागाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड ज्ञानपुर की ग्राम पंचायत रगईपुर पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित नकारात्मक न्यूज प्रकाशित किया गया है।

प्रश्नगत योजना में 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सौलर पैनल, 01 नग वाउण्ड्रीवाल, 26.039 किमी० वितरण प्रणाली एवं 926 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग वाउण्ड्रीवाल, 01 नग सौलर पैनल, 26.039 किमी० वितरण प्रणाली एवं 630 नग गृह जल संयोजन के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं एवं शिरोपरि जलाशय का कार्य फुल हाइट तक पूर्ण करा लिया गया है। योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। तदनुसार कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2026 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय


अधिशारी अभियन्ता

पृ०स० व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मीरजापुर।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजज भदोही को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशारी अभियन्ता



🏠 होम

▶ वीडियो

🔍 सर्च

📺 वब
स्टोरीज


📰 ई-
पेपर

Hindli News / Local / Uttar Pradesh / Bhadohi / Jangiganj / Ramaypur
Villagers Struggle For Clean Water | Jal Jeevan Mission Slow

जंगीगंज में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त: रमईपुर के ग्रामीण शुद्ध जल के लिए बेहाल

सत्यप्रकाश | जंगीगंज,
भदोही (संत रविदास
नगर)

1 दिन पहले

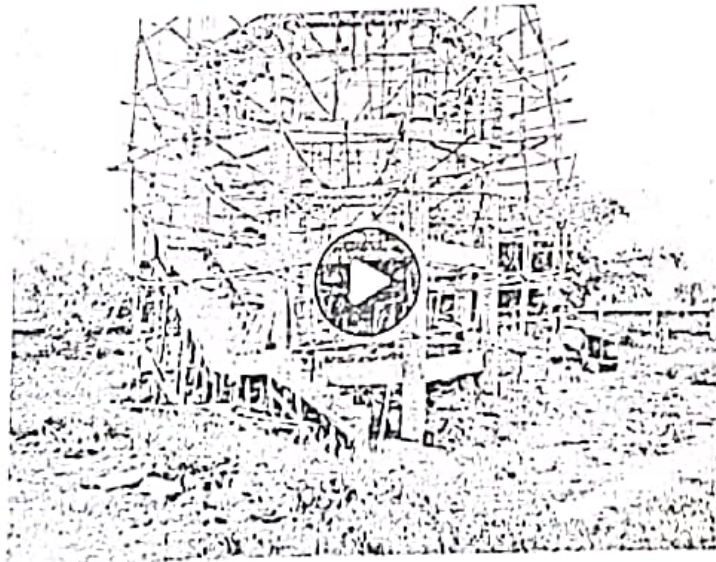

योजना अधूरी रहकर केवल कागजों तक सीमित प्रतीत हो रही है।



ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गांव की महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सुबह-शाम लंबी दूरी तय कर पानी लाना पड़ता है, जिससे उनका समय और श्रम दोनों बर्बाद हो रहे हैं।

बच्चों और बुजुर्गों को भी पानी की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

आज का राशिफल मेष



मेष | Aries

पॉजिटिव- आज जो भी फैसला लेंगे, उसमें सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खरीद-फरोख्त की योजना बना रहे हैं, तो आज इसके लिए समय अनुकूल है। घर के

और पढ़ें

