



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मौहल्ला सिरसागढ़ पण्डकी, बम्बूगढ चौराहा/न्यू रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे कांकर सराय
वाई पास रोड, अमरोहा- 244221

पत्रांक 2284 / न्यूज कटिंग / 91 दिनांक 19-05-2026

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

विषय:-

E-Paper Amarujala 19-05-2026 में प्रसारित न्यूज शीर्षक "रिकॉर्ड में टंकी चालू फौदापुर, मझौला के लोगो को नहीं मिल रहा पानी" के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (19.05.2026) में प्रसारित न्यूज कटिंग अधोहस्ताक्षरी को व्हाटस ऐप के माध्यम से प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-

हैड लाइन



“रिकॉर्ड में टंकी चालू फौदापुर, मझौला के लोगो को नहीं मिल रहा पानी”

आख्या

- वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 495 नग पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं, जिनमें 884 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। 884 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 676 राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है।
- 493 नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष 200 नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं।
- जनपद में औसतन 95.56 प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं।
- पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप बिछाने के उपरान्त सड़क को मोटरबल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटेस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुर्नस्थापित कर दिया जाता है। अवशेष सड़को की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।
- ग्राम फौदापुर (मजरा मझौला) पेयजल योजना विकास खण्ड गजरौला में फर्म मै PNC-SPML (JV) Moradabad द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। योजना पर विद्युत बिल अवशेष होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा पेयजल योजना का विद्युत संयोजन काट दिया गया है, जिस कारण योजना पर पेयजलापूर्ति बाधित है। जिस हेतु खण्ड के पत्रांक 1781/SPML-Amroha/27, दिनांक 27.04.2026 द्वारा सम्बन्धित फर्म को निर्देशित एवं विद्युत यांत्रिक खण्ड उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मुरादाबाद को उक्त योजना पर विद्युत बिल जमा कराकर पेयजलापूर्ति सुचारु करने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना पर विद्युत संयोजन पुर्नस्थापित होने के उपरान्त योजना पर पेयजलापूर्ति सुचारु कर दी जायेगी। वर्तमान में योजना की प्रगति निम्नानुसार है—

GP- Faundapur, BLOCK- Gajraula

SL NO.	COMPONENET	Scope	Status
1	Tube well	1	Done
2	Pump House	1	Done
3	Over Head Tank	75 kl /12 M	Done
4	Pipe Laying	10074 m	9938 m
5	FHTC	493	481

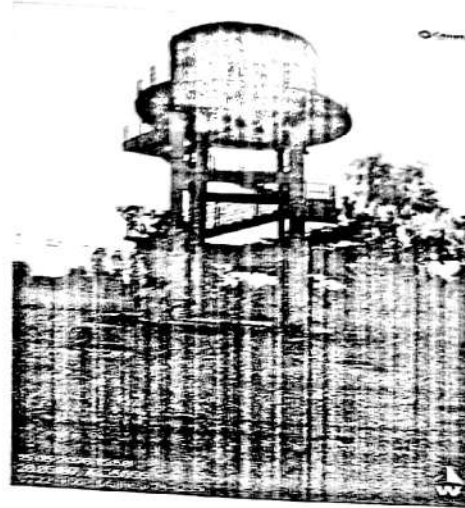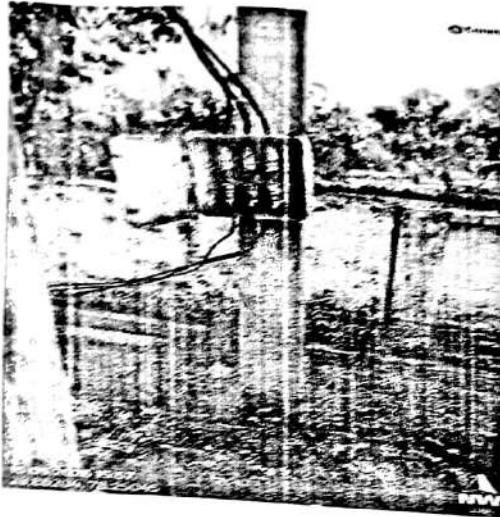

भवदीय

May
(चन्द्रहास)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता(मु०क्ष०) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमरोहा।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 6- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि प्रभावी अनुश्रवण कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 7- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ० को प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु।
- 8- डी०पी०एम०, टी०पी०आई० अमरोहा को समस्त योजनाओं के निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराने हेतु।
- 9- फर्म मै० पी.एन.सी.-एस.पी.एम.एल. (जेवी) मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना पर विद्युत बिल का भुगतान करते हुए विद्युत संयोजन पुनर्स्थापित करा कर ग्राम में नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।


May
अधिशाली अभियन्ता

Hindi News > Video > Uttar Pradesh > Amroha News > Records Show Water Tank Operational In Phaundapur

रिकॉर्ड में टंकी चालू फौंदापुर, मझौला के लोगों को नहीं मिल रहा पानी

Vinai Sharma Updated Tue, 19 May 2020 08:27 PM IST

Add as a preferred source on Google



जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाने के लिए दो करोड़ 74 लाख रुपये से बनाए गए ओवरहेड टैंक से न तो मझौला के लोगों को पानी मिल रहा है और न ही फौंदापुर के ग्रामीणों की प्यास बुझ रही है, जबकि जल जीवन मिशन के रिकॉर्ड में ओवरहेड टैंक से पानी मिल रहा है। दोनों गांवों के ग्रामीण अपने संसाधनों से प्यास बुझा रहे हैं।

Latest
