



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम- भन्सरिया, पो०-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक 1773 / m-48 / 62 दिनांक 21/5/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 20.05.2026 को प्रकाशित खबर "दरियाबाद में टंकी तैयार, पर पानी नहीं मिला : हर घर जल योजना में ग्रामीण शुद्ध जल को तरसे" के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 20.05.2026 को प्रकाशित खबर विकास खण्ड-बिजुआ "दरियाबाद में टंकी तैयार, पर पानी नहीं मिला: हर घर जल योजना में ग्रामीण शुद्ध जल को तरसे" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन०सी०सी० एवं वी०टी०एल० को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जाना लक्षित है। नलकूप-942 नग, पम्प हाउस -942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी०, शिरोपरि जलाशय-922 नग, गृह जल संयोजन-564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप-939 नग, पम्पहाउस-869 नग, वितरण प्रणाली 14468 किमी०, शिरोपरि जलाशय-484 नग, गृह जल संयोजन-535515 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1097 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।


समाचार पत्र की खबर विकास खण्ड-बिजुआ की दरियाबाद पाइप पेयजल योजना से संबंधित है जिसका निर्माण कार्य एजेंसी मेसर्स एन०सी०सी० लि० द्वारा कराया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर धनंजय सिंह द्वारा उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए पाइप पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण

के दौरान पाया गया कि योजना में पूर्व में आंशिक जलापूर्ति हो रही थी परन्तु वर्तमान में VFD खराब होने के कारण जलापूर्ति बाधित है जिसका मरम्मत कार्य अधिकतम एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा व अवशेष कार्य पूर्ण कराते हुए शीघ्र ही समस्त ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ की जाएगी। यह भी अवगत कराना है कि योजना को पूर्ण करने की लक्षित तिथि मार्च 2027 है। जिसके फोटोग्राफ संलग्न हैं।

सादर सूचनार्थ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

फोटोग्राफ संलग्न

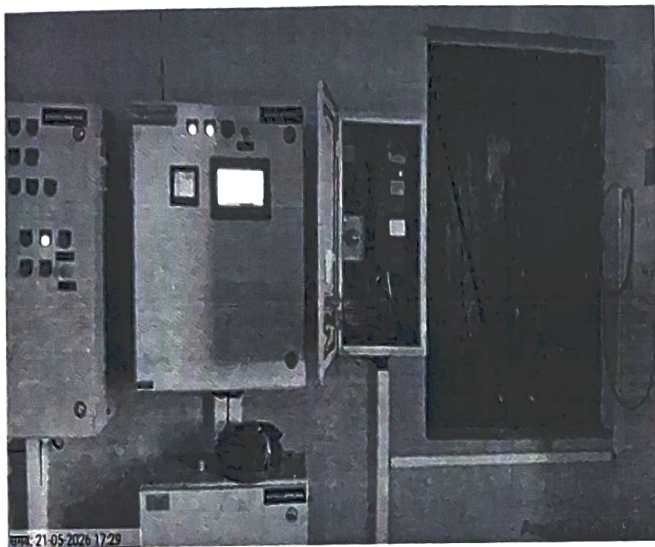

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता।

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 2- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
- 3- मो० जमाल, डी०पी०एम०, मै० एन०सी०सी०लि० लखीमपुर खीरी को इस आशय के साथ प्रेषित कि खराब VFD को तत्काल बदलते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- 4- गार्ड फाइल।

अधिशायी अभियन्ता।
